



# 【再評価】大規模特定河川事業（水貫川排水機場）



位置図

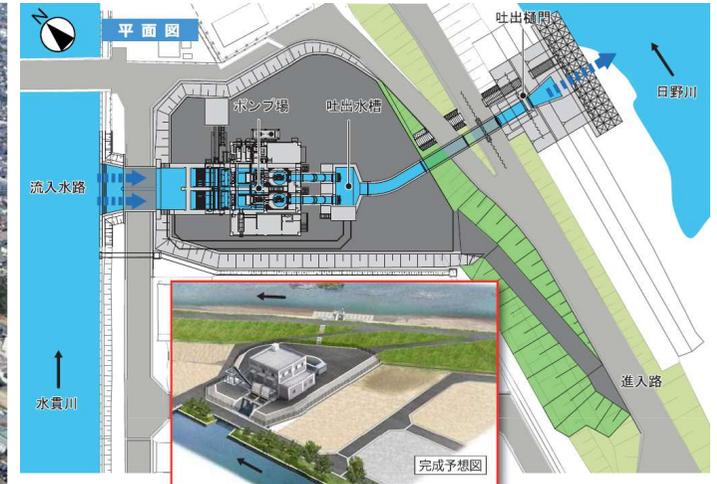

水貫川河川改修事業  
(水貫川排水機場の整備)  
事業期間：H28～R8(予定)  
排水量：10m<sup>3</sup>/s(暫定5m<sup>3</sup>/s)

過去の被害写真や水防活動状況



## 大規模特定河川事業（水貫川排水機場）

事業内容 排水機場整備一式  
全体事業費 25.3億円⇒29.2億円  
事業期間 H28～R8

## 全体事業費増の理由

- ①ポンプ設備等原材料価格の高騰
- ②工事に伴う周辺の井戸水等への影響調査

