

令和 6 年度

現 場 説 明 書

工事名 県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備）

令和 6 年 4 月 2 4 日
鳥 取 県

[1] 一般事項

1 事務手続

鳥取県建設工事執行規則並びに鳥取県総務部営繕工事執行要領による。

2 数量公開

数量入り内訳明細書は、設計図面に明示している数量を除き参考であり発注者及び入札参加者を拘束するものではない。

3 入札時積算数量書活用方式

本工事は、鳥取県営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領を適用する工事である。入札時積算数量書活用方式については（別記）によること。

4 質問書

本工事に関し、質問が有る場合、令和6年5月9日までに電子入札システムの所定の画面に入力すること。なお、質問の無い場合、入力は不要である。

各質問への回答については、令和6年5月13日までに電子入札システムの所定の画面においてまとめて閲覧に供する。

5 契約事務

落札者は、鳥取県〔鳥取県土整備事務所建設総務課〕に出向き、請負契約事務及び施工関係の打合せをして、工事の促進を図ること。

6 その他

- (1) 工事の一部を下請けさせる場合は、「施工体制台帳」（再下請負通知書を含む。）及び「施工体系図」を2部、下請契約締結後20日以内に提出すること。

(2) この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

(3) この工事の施工にあたっては別紙－1に示す事項に従うこと。

(4) 元請負人、下請注文者及び下請負人は、建設業法第20条第1項及び鳥取県の建設工事における下請契約等適正化指針の趣旨に鑑み、適正な価格による下請契約が締結されるよう努めること。

その際、契約図書に添付された書面に留意し、特に法定福利費（事業主負担分）を内訳明示した標準見積書の提示を下請負人に求め、これを尊重すること。

[2] 特記事項

1 [施工条件明示事項]

(別紙－2) ・ 有 ・ 無

2 [工事成績評定]

本工事は、工事評定要領に基づく工事成績評定の対象とする。
~~工事成績評定の対象外とするのは以下の〔ア・イ・ウ・エ〕に該当するため。~~

- ~~ア 請負対象設計金額（請負契約の対象となる部分の設計金額をいい、請負契約締結後に請負対象設計金額を変更した場合にあっては、当初請負対象設計金額とする。以下同じ。）が、250万円未満の建築・設備工事~~
- ~~イ 災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事~~
- ~~ウ 機器の納品、部品取替等の工事~~
- ~~エ 工事目的物を伴わない工事~~

[3] 設計等留意事項

- ・ 学校関係者（先生、生徒）、第三者に迷惑の掛からないよう環境及び安全上、特に注意すること。
- ・ 工事の施工にあたっては、現場代理人など下請け作業員も含め工事関係者とわかるように腕章等を付けること。
- ・ 学校の夏休み期間は令和6年7月20日から8月24日を予定しており、原則としてこの期間中に施工を行うこと。なお、夏休み期間については受注後に監督員または学校職員に再度確認を行うこと。
- ・ 現地調査は施設職員と適切に協議し了解を得た上で実施すること。施設の特性をよく理解し、利用者等に十分配慮しながら実施のこと。

- ・ 建物を使用しながらの工事であるため、生徒、教師及び来客者等の学校関係者の動線と工事動線が重なる部分においては、特に安全管理を行い必要な措置をとること。
- ・ 作業時間の開始時及び終了時には、学校関係者へ連絡を行うこと。また、休校日、早朝夜間作業時は、学校側（施設管理者）と協議して了承を得て施工すること。
- ・ 実施工程表は、監督員、施設職員、関連業者と事前協議を行った上で作成するものとし、監督員の確認を得た後に現地施工に着手すること。
- ・ 校内作業においては、施設利用者の安全確保に十分配慮すること。既設をよく調査し計画的に作業を進めること。これらを念頭に、施設職員と十分協議し必要最低限の作業スペースを確保しながら作業を進めること。
- ・ 国内外の情勢等により各種機器材料の納期遅延が発生しているため、使用する機器材料について速やかに監督員の承諾を受け、早期確保に努めること。また、この影響により工期延伸が必要な場合は監督員と協議すること。
- ・ 上記の留意事項のほか、工事に先立ち監督職員及び施設管理者等と十分に協議し、仮設計画・作業工程について監督職員の承諾を得た後に工事に着手すること。
- ・ 施設コード（２２４０４〔教育〕）

(別記)

1. 入札時積算数量書活用方式の適用

(1) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。

よって、入札手続き時に、入札時積算数量書の細目別内訳を提出していない場合には、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じても、協議の対象にならない。

また、入札時積算数量書の参考資料である入札時積算数量書別紙明細に記載された積算数量に疑義が生じた場合については、入札時に質問書が提出された場合に限り、発注者側で質問内容を確認の上、必要に応じて発注者及び受注者は、入札時積算数量書別紙明細に基づき、工事請負契約の締結後において、積算数量に関する協議を行うことができる。

なお、入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。

(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。

(3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。

(4) (1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。

(5) (1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

2. 入札閲覧設計書に対する質問

(1) この入札閲覧設計書(入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細を含む。)に対する質問がある場合においては、電子入札システムにより提出するものとする。

3. 工事費内訳書の提出

(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書及び封印した入札書を同封して郵送するものとする。

(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応する数量、単位、単価及び金額を表示したもの(ただし、商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。)でなければならない。

(3) 工事費内訳書は、1.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。

1 下請関係の合理化について

- (1) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（平成27年3月19日付第201400194303号県土整備部長通知。以下「適正化指針」という。）を遵守し、抵触する行為は行わないこと。
- (2) この契約に係る工事的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は適正化指針及び「鳥取県総務部が発注する建設工事における適正な価格による下請契約に関する取扱いについて」（平成26年12月24日付第201400108286号総務部長通知）の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、適正な価格による下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立及び下請における雇用管理等の指導等に努めること。
- (3) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (4) 鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領（平成19年8月15日付第200700071998号県土整備部長通知）第5条に規定する低入基準価格を下回る金額でその工事を落札した受注者（共同企業体として落札した場合にあつては、その全ての構成員とする。）は、工事の一部を第三者に請け負わせたときは、その下請契約一件ごとに別に定めるところにより建設工事執行状況報告書を作成し、当該工事の完成検査結果の通知日から20日以内に発注者へ提出しなければならない。
- (5) 工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、県内業者（県内に本店を有する者をいう。以下同じ。）と契約すること。ただし、技術的に対応できる県内業者がない業務委託する場合、又は県内業者で対応できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、監督員に事前協議して県外業者と契約することができる。
- (6) この契約に係る工事の適正な施工体制を確保するため、受注者は、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領（平成16年3月11日付管第2311号鳥取県県土整備部長通知）に基づく調査その他県の行う調査に協力すること。また、受注者は下請業者を使用する場合に当っては、当該下請業者に対し当該調査に協力するよう指導すること。

2 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に要する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「県内販売業者」という。）から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この限りでない。
- (5) 工事に使用する資材については、極力有害性VOC（揮発性有機化学物質）発生量の少ないものとするよう努めること。

3 工事の安全確保について

- (1) この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。
- (2) 労働安全衛生法第59条、第60条の2に定める安全衛生教育を実施するほか、工事着手後、作業員全員の参加により、月当り半日以上以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施するものとし、施工計画書に実施項目について記載するものとする。
- (3) この契約に係る工事の施工中に事故が発生した場合は、事故報告書を提出すると共に、建設工事事務データベースの「事故報告書」についても速やかに提出するものとする。

4 建設機械の使用について

- (1) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場の快適性を高めるため、排出ガス対策型建設機械を使用するよう努めること。

5 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

6 ダンプトラック等、運搬機械による過積載の防止について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし枠装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。

7 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等（以下「不正軽油」という）を使用しないこと。
また、県が使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会いなど協力をを行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除するなどの是正措置を講ずること。

8 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 受注者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

9 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者、または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

10 労働基準法等の遵守

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

11 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 鳥取県暴力団排除条例（平成23年3月鳥取県条例第3号）に基づき、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行わないこと。
- (2) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (3) この場合において工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

12 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用関係とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が組織として有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働安全衛生の確保について

労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメント等について」（平成23年9月30日付第201100099979号県土整備部長通知）に基づくリスクアセスメント等に積極的に取り組むこと。

15 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

16 契約方式について

本工事は総価契約方式を採用しており、設計図書に示された条件などに変更がある場合は契約を変更することができる。契約変更を行う場合には、変更設計額に直前の契約の請負比率を乗じ、変更請負代金額を算出する。

17 その他

- (1) 本来一体とすべき同一敷地内又は同一敷地内（隣接した敷地を含む）の工事を分割して発注し、新規に発注する工事（以下、「後工事」という。）を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費は、契約済みの全ての工事（以下「前工事」という。）と後工事を一括して発注したとして算出した共通仮設費の額から、前工事の共通仮設費の額を控除した額とする。なお、後工事が複数ある場合は、その合算工事費を対象とする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 特定フロンの使用の削減に努めること。
- (5) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものである。
- (6) 本工事が、発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様とする。
調査票を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者はその実施に協力しなければならない。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等

に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

特記事項 [施工条件明示事項]

令和6年3月改正

※ 番号、・に□印のあるものについて適用する。 [県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備）]

項目	明 示 事 項	条 件
工 程	①. 他工事との調整	<p>工事名 <u>県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（建築）</u> <u>県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（機械設備）</u></p> <p>上記工事との連絡及び工程の調整を図ること。 本工事の請負者は、上記関連業者と共に建設協議会を組織し、（当該協議会の代表者となって）全社協力のもとで安全管理に留意すること。</p>
	②. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	<p>制限される工事 ・ 施工時間 _____</p> <p>制限の内容 <u>8時30分～17時15分</u></p>
	③. 関係機関等との協議	<p>本工事において、関係法令上必要あれば、関係機関と協議を行うこと。</p>
	4. 工事の指定部分	<p>_____ については、 平成 _____ 年 月 _____ 日までに完成させること。</p>
	5. 地下埋設物等の調査 地下埋設物の移設が予定されている場合	<p>工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・（水道・下水道・電気通信・ガス・その他 _____）について調査済み〕である。 事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道・下水道・電気・通信・ガス・その他 _____）であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。 その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。</p> <p>・ 移設機関 _____</p>
	⑥. 週休2日促進工事	<p>本工事は、営繕工事における週休2日促進工事实施要領（試行）の対象工事である。https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の規定に従い週休2日工事を実施すること。</p>
用 地	①. 工事用車両の駐車場	<p>・ 駐車場がないため確保する必要がある。 ・ 敷地内に一部確保できる。 □ 原則として敷地内で確保するものとするが、不足を生じる場合には、別途確保すること。</p>
	③. 機械施設等の制限	<p>内 容 <u>関係法令を遵守すること。</u></p> <p>_____</p> <p>・ 近隣家屋等の ・ 事前事後の状況を写真を付して記録し ・ 事後（ _____ ）の調査を行い万全を期して施工すること。 ・ 工事概要について住民説明を行うこと。 ・ 近隣住民からテレビ受信障害及び工事に伴う損害が報告された場合、直ちに監督員等に連絡すると共に、県が行う対応等に協力すること。</p>
公 害 対 策	2. 工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合	<p>・ 近隣家屋等の ・ 事前事後の状況を写真を付して記録し ・ 事後（ _____ ）の調査を行い万全を期して施工すること。 ・ 工事概要について住民説明を行うこと。 ・ 近隣住民からテレビ受信障害及び工事に伴う損害が報告された場合、直ちに監督員等に連絡すると共に、県が行う対応等に協力すること。</p>
	①. 交通安全施設等の指定	<p>□ 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 ・ 交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員A _____人 交替要員 _____人 1日あたり合計 _____人 配置日数 _____日 工事全体合計 _____人・日 交通誘導員B _____人 交替要員 _____人 1日あたり合計 _____人 配置日数 _____日 工事全体合計 _____人・日 警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者を言う。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合場交通誘導員Bを配置していることとみなす。</p>
安 全 対 策	①. 交通安全施設等の指定	<p>□ 一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 ・ 交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員A _____人 交替要員 _____人 1日あたり合計 _____人 配置日数 _____日 工事全体合計 _____人・日 交通誘導員B _____人 交替要員 _____人 1日あたり合計 _____人 配置日数 _____日 工事全体合計 _____人・日 警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者を言う。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合場交通誘導員Bを配置していることとみなす。</p>
	①. 一般道路を搬入路として使用する場合	<p>□ 運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対し損傷を与えないよう予防措置を講じ、また損傷を与えた場合は、速やかに原形に復すこと。</p> <p>・ 制限の内容 _____</p> <p>・ 処置の内容 _____</p>
工 事 用 道 路	・ (ア) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合	<p>・ 制限の内容 _____</p>
	・ (イ) 搬入路の使用後及び使用後の処置が必要である場合	<p>・ 処置の内容 _____</p>
	2. 仮道路を設置する場合	<p>・ 幅員 _____ m ・ 延長 _____ m ・ 切込碎石 厚 _____ cm ・ その他 _____</p> <p>・ 工事終了後の処置 _____</p>

項目	明 示 事 項	条 件
6 仮 設 備	1. 仮囲い等の範囲、構造	<input type="checkbox"/> 工事範囲をバリケード等により明確にすること。 ・敷地周囲に仮囲いを設置し、その施工範囲、仕様等は図示による。 ・山留めは _____ 工法とし、その施工条件は図示による。 ・各工事共通の揚重機械として _____ を設置しその施工条件は図示による。 ・敷地周辺の _____ 部分を鉄板敷きにより養生し、その施工範囲、仕様等は図示による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他労働安全衛生法に基づく仮設備
7 建 設 副 産 物 の 処 理	1. 建設発生土の処理 ・(ア)他工事等流用 ・(イ)建設技術センター ・(ウ)民間残土受入地 2. 分別解体等 3. 再資源化施設への搬出 (施設の名称・受入れ費用) (受入れ時間帯) (受入れ条件) 4. 最終処理等 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 産業廃棄物処理 6. 産業廃棄物の処理に係る税	・建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書 (https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm) により適切に対応すること。 建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ 工事現場に運搬(片道運搬距離 _____ km)するものとする。 建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離 _____ km)するものとする。 なお、処理費として1m ³ 当たり _____ 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ に運搬(片道運搬距離 _____ km)するものとする。なお、処理費として1m ³ 当たり _____ 円を _____ に支払うこと。 民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。(土質性状(記載例)砂質土、コーン指数 300kN/m ² 以上) コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。なお、その費用を見込んでいる。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円 アスファルト塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円 建設発生木材 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円 その他() _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1t当たり _____ 円 8時～17時(平日) ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm以下、長さ _____ m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れのある物質(廃油等)を含まないこと。 _____ については、 _____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離 _____ km)を想定し、その費用として1t当たり _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 _____ 円見込んでいる。
8 建 設 副 産 物 の 使 用	1. 建設発生土の使用 2. 再生資源の使用	_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所： _____ に使用する。 なお、建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書 (https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm) により適切に対応すること。 ア Co 雑割材は、 _____ 工事から運搬し、使用箇所： _____ に使用する。 イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、 _____ 工事から運搬し、使用箇所： _____ に使用する。 ウ ・再生クラッシュラン〔規格： _____ 〕は、使用箇所： _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：RS- _____ 〕は、使用箇所： _____ に使用する。 エ 再生加熱アスファルト混合物〔規格： _____ 〕は、使用箇所： _____ に使用する。 オ その他再生資材〔資材名： _____ 〕〔規格： _____ 〕は、使用箇所： _____ に使用する。

項目	明 示 事 項	条 件						
9 支物 障件	1. 地上、地下等に占有物件等の工事支障物件が存在する場合	移設・撤去 防護等の方法 _____ _____						
10 濁処 水理	1. 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合	工法 処理の方法 放流先						
11 そ の 他	<p>1. 工事实績情報の登録</p> <p>2. 支給材料及び貸与品がある場合</p> <p>3. 工事事業電力等を指定する場合</p> <p>4. 自社施工 (塗装、畳、防水、造園、屋根、板金工事)</p> <p>5. 景観評価</p> <p>6. 提出書類</p> <p>7. 石綿含有建材の事前調査結果の掲示について</p> <p>8. 石綿含有建材の事前調査結果の報告について</p> <p>9. 労災補償に必要な保険の付保</p> <p>10. 墜落制止用器具の着用について</p> <p>11. 工事における情報共有システムの利用について</p> <p>12. 鳥取県建設キャリアアップシステムの活用について</p> <p>13. 遠隔臨場</p> <p>14. そ の 他</p>	<p>工事實績情報登録 500 万円以上の工事について、受注時は工事契約後 10 日以内に、登録内容の変更（技術者の配置変更、工期の変更）時は変更があった日から 10 日以内に、完成時は完成後 10 日以内に工事实績情報として「工事实績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合センターにインターネット等により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>品 名</td> <td>数 量</td> </tr> <tr> <td>品質、規格又は性能</td> <td></td> </tr> <tr> <td>引渡場所</td> <td>引渡時期</td> </tr> </table> <p>内 容</p> <p>本工事においては、工（ 工を除く）のうち、〔 千円まで・全て〕の部分は鳥取県総務部自社施工対象工事適正実施要領に定めるところにより、自社施工しなければならない。</p> <p>ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔である・ではない〕。</p> <p>イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と協議すること。</p> <p>・工事履行報告書（毎月提出）</p> <p>・</p> <p>・</p> <p>大気汚染防止法（第 18 条の 15）及び石綿障害予防規則（第 3 条及び第 4 条の 2）（次号において、「大気汚染防止法等」という。）による調査結果の掲示を行うこと。（公共建築改修工事標準仕様書（第 9 章））</p> <p>大気汚染防止法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、工事場所を所管する鳥取市生活環境課又は県中部・西部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。</p> <p>本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。</p> <p>労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格（平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。</p> <p>発注時の請負対象設計金額が建築工事にあつては 20,000 千円以上、それ以外の工事にあつては 5,000 千円以上の工事については、電子納品及び情報共有システム利用の対象工事とする。 なお、情報共有システム利用にあたり、6,000 円/月を経費に見込んでいる。 また、上記金額未満で請負対象設計金額が 2, 5 0 0 千円以上の工事にあつても、受注者が利用を希望する場合は利用することができる。この場合の利用に係る経費は、監督員と協議すること。</p> <p>当工事は、鳥取県建設キャリアアップシステム活用推奨工事である。活用した場合、発生する経費の一部を設計変更対象とするため、監督員と協議すること。</p> <p>本工事において、遠隔臨場の活用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htmに掲載された最新の「鳥取県営繕工事・建築関係コンサルタント等業務の遠隔臨場に関する実施要領【試行】」によること。</p> <p>・工事の施工に際し、住民説明会を開催する予定であるので協力すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 近隣住民等に対し安全及び騒音振動対策を十分に講ずること。 <input type="checkbox"/> 契約図書の作成は、落札者において行うこと。</p>	品 名	数 量	品質、規格又は性能		引渡場所	引渡時期
品 名	数 量							
品質、規格又は性能								
引渡場所	引渡時期							

事前調査結果の掲示

解体等工事の名称	〇〇〇〇〇〇改修工事			
解体等工事施工者氏名	〇〇会社〇〇建設			
解体等工事の場所	〇〇市〇〇町			
工事発注者氏名	〇〇県知事 〇〇 〇〇			
事前調査を行った部分	1階 〇〇室、〇〇室 2階 〇〇室、〇〇室			
材料の種類（作業対象）	石綿使用の有無			石綿使用なしと判断した根拠 ①目視 ②設計図書（④を除く） ③分析 ④材料製造業者による証明 ⑤材料の製造年月日
	有	みなし	無	
吹付け材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
保温材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
煙突断熱材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
屋根用折版断熱材	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
耐火被覆材（吹付けを除く、けい酸カルシウム板第2種を含む）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
スレート波板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
スレートボード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
屋根用化粧スレート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
けい酸カルシウム板1種	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
押出成形セメント板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
パルプセメント板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
ビニル床タイル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
窯業系サイディング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
石膏ボード／ロックウール吸音天井板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>
その他材料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/>

〇〇会社〇〇建設

現場代理人 〇〇 〇〇

※ 石綿障害予防規則第3条第6項及び大気汚染防止法第18条の15第5項の規定により、解体等作業に従事する労働者が見やすい箇所、かつ工事の現場において公衆に見やすいように掲示すること。（A3版）

鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針

(目的)

第1条 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針(以下「指針」という。)は、鳥取県が発注する建設工事(以下「県発注工事」という。)において、元請負人及び下請負人が遵守すべき事項を定めることにより、県発注工事の生産性向上、元請下請関係の適正化及び建設労働者の就労環境の改善を図るとともに、担い手の育成及び確保を促進し、もって地域の安全・安心を担う建設産業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この指針(別表2及び3を除く。)において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 元請負人 県発注工事を県から直接請け負った者をいう。
- (2) 下請注文者 県発注工事に係る全ての下請契約の注文者をいい、一の工事が数次の下請により行われる場合は、元請負人及びこれに続く全ての下請契約の注文者をいう。
- (3) 下請負人 県発注工事に係る全ての下請契約の請負人をいい、一の工事が数次の下請により行われる場合は、元請負人からその工事の一部を請け負った者及びこれに続く全ての下請契約の請負人をいう。

(県の責務)

第3条 県は、第1条に定める目的の実現に向けて、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)をはじめとする関係法令等に基づく措置を適切に講じなければならない。

(下請注文者及び下請負人並びに元請負人の責務)

第4条 下請注文者及び下請負人並びに元請負人は、品確法第8条及び建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の27の規定等を考慮して、建設産業における生産システム合理化指針(平成3年2月5日付建設省経構発第2号)に示された就労環境・雇用条件等の改善及び適正な施工体制の確立を図るのに必要な措置等のほか、次の各号に掲げる事項について真摯な対応に努めなければならない。

- (1) 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならないという建設業法第19条の3の規定の趣旨に沿って、各々の対等な立場における合意に基づき、担い手育成及び確保の観点から、少なくとも当該下請契約に該当する部分の県の設計に計上された直接工事費相当額及びこれに必要な法定福利費を確保するとともに、労働安全衛生の確保に必要な費用を含む間接工事費及び企業の経営上必要となる費用を加えた金額が確保された請負契約を締結すること。
- (2) 使用する建設労働者の賃金について、公共工事設計労務単価を考慮した適切な水準を確保すること。
- (3) 事業所として雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険等」という。)等の適切な保険に加入し、保険料を適正に納付するだけでなく、施工現場に従事する全ての建設労働者についても適切な保険に加入させること。
- (4) 長時間労働の縮減及び計画的な休暇取得の推進、育児又は介護のための休業制度の整備等、使用する建設労働者の仕事と家庭との両立が可能な環境及び制度を整えること。
- (5) 技術及び技能の向上により仕事に対する意欲及び充実感を高めるため、公的助成制度を活用する等により研修又は訓練を実施し、若しくは表彰制度を整えること。

- (6) 元請負人は、請け負った県発注工事における全ての下請負人に対して、本文及び第1号から前号までについて指導及び助言その他の援助を行うこと。

(下請次数の制限)

- 第5条 元請負人は、請け負った県発注工事の一部について下請契約を締結して施工しようとするときは、その下請の次数を、建築一式工事（鳥取県の工事発注区分における建築一般に限る。以下同じ。）にあっては3次まで、建築一式工事以外の建設工事にあっては2次までとしなければならない。ただし、特段の理由があり、あらかじめ当該県発注工事を監督する県の監督員（以下「監督員」という。）の承認を受けた場合は、この限りでない。
- 2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、別表1に留意して協議書を作成し、これを監督員に提出しなければならない。

(下請負人の選定)

- 第6条 下請注文者は、下請負人を選定するに当たっては、次の各号に規定する全てを満たす者の中から選定しなければならない。
- (1) 県発注工事の施工に関し、建設業法に違反する者ではないこと。
 - (2) 鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱（平成20年5月1日付第200700191955号鳥取県県土整備部長通知。以下「資格停止要綱」という。）に基づく入札参加制限を受けている有資格者でないこと。
 - (3) 下請注文者の直接契約締結する相手方は、社会保険等又は国民健康保険等の適切な保険に加入している者（以下「保険加入者」という。）であること。ただし、元請負人を除く下請注文者がやむを得ず保険加入者以外の者を直接契約する相手方に選定する場合は、元請負人は、契約に先立って早期に適切な保険への加入手続を進めるよう指導するとともに、当該下請注文者から事情を確認した上で「保険未加入者選定報告書」を次条第5号に定める期限内に県へ提出しなければならない（この場合、社会保険等適用除外者に対する社会保険等への加入の指導又は現場からの排除といった過誤がないよう、十分に注意すること。）。
 - (4) 下請注文者（下請の次数が2次までの下請注文者に限る。）が契約締結する相手方は、県内に本店を有する者（以下「県内業者」という。）であること。ただし、施工能力を有する県内業者が1社以下であると元請人が判断する場合等、特段の理由があり、元請負人があらかじめ監督員の承認を受けた場合は、県外に本店を有する者とする事ができる。
 - (5) 前号ただし書の規定による場合であっても、県内に営業所を有し、当該営業所の存する地域の経済振興又は雇用の確保に当たって貢献している者（以下「県外貢献業者」という。）であること（前号の承認の際に、特段の理由があり県外貢献業者に限定しないことの承認を受けた場合を除く。）。
- 2 前条第2項の規定は、前項第4号ただし書の規定による承認に準用する。

(下請契約の締結に当たっての遵守事項)

- 第7条 下請注文者は、下請契約（変更契約を含む。以下同じ。）の締結に当たって、次の各号の規定を遵守しなければならない。
- (1) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっては、県が公表する鉄筋工、型枠工等専門工種の標準単価又は労務価格を明示した工種別労務費一覧表を含む設計書（金入り）等を参照し、第4条第1号に規定する金額が確保された請負契約の締結に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十分に協議すること。
 - (2) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっての見積は、建設業法第20条第1項の規定の趣旨を尊重す

るとともに、下請注文者は下請負人に対して法定福利費を内訳明示した標準見積書の提出を書面により求め、提示された場合はこれを尊重するよう努めること。

- (3) 県発注工事に着手する前に、建設工事標準下請契約約款（平成 22 年 7 月 26 日中央建設業審議会決定）又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、元請負人にとっては別表 2 の条項を、元請負人以外の下請注文者にとっては別表 3 の条項を追加して記載した書面により下請契約を締結すること。
- (4) 下請注文者は、下請契約締結前に「下請契約遵守事項報告書」により、その契約手続等の適否を確認すること。
- (5) 元請負人は、県に対して、下請契約締結の日（元請負人を除く下請注文者の行った下請契約締結を含む。）の翌日から起算して 20 日以内に建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体系図の写し並びに同法施行規則第 14 条の 2 及び同規則第 14 条の 4 に規定する添付書類並びに別に県が添付を求める書類及び前項に定める「下請契約遵守事項報告書」（元請負人を除く下請注文者分は写し）を提出すること。

（帳簿書類等の備付け）

第 8 条 元請負人は県発注工事ごとに前条第 5 号で提出した書類等を現場に備え付け、次条第 1 項及び第 4 項、その他必要に応じて実施する県の調査等に協力しなければならない。

（確認、指示等）

- 第 9 条 県は、この指針の適正な施行を確保するため、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領（平成 16 年 3 月 11 日付管第 2313 号鳥取県県土整備部長通知）に基づく現場実態調査により、県発注工事の現場に立入り、指針の施行状況を調査するものとする。
- 2 県は、元請負人に対してこの指針の遵守を求めるとともに、下請負人においてもこの指針の遵守が確保されるよう、元請負人に対して、下請負人に対する指導、是正の要求その他の必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
 - 3 下請負人は、元請負人から前項に規定する指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められたときは、これに誠実に対応しなければならない。
 - 4 県は、元請負人又は下請負人がこの指針に定める事項に違反し又は違反しているおそれがあり、県発注工事の適正な施工の確保が困難となるおそれが生じた場合において、必要があると認められるときは、元請負人又は下請負人の本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所に立入り、帳簿その他の物件の調査を求めるものとする。

附 則

この指針は、平成 27 年 4 月 1 日以降に調達公告（調達公告を行わない工事については、入札日の通知）を行う建設工事から適用する。ただし、第 6 条第 1 項第 3 号の規定は、同年 7 月 1 日以降に調達公告（調達公告を行わない工事については、入札日の通知）を行う建設工事から適用する。

附 則

（施行期日）

- 1 この改正は、平成 27 年 11 月 20 日から施行する。

（経過措置）

- 2 第6条第1項第3号の改正規定並びに様式第1号（第7条関係）中のNo.3の改正項目及び記入要領4の改正規定は、平成27年12月31日までに調達公告（調達公告を行わない工事にあつては、入札日の通知）を行う建設工事にあつては、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

- 1 この改正は、平成29年3月23日から施行する。

（経過措置）

- 2 第5条第1項及び第6条第1項第3号の改正規定（ただし書を除く。）並びに様式第2号（第7条関係）中のNo.3の改正項目は、平成29年9月30日までに調達公告（調達公告を行わない工事にあつては、入札日の通知）を行う建設工事にあつては、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

- 1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表 1（第 5 条関係） 下請制限除外に係る協議書作成要領

下請制限除外について協議するに当たっては、下記に留意すること。

当該協議書様式は、工事に関する協議書等取扱要領（平成 11 年 10 月 5 日付管第 435 号鳥取県土木部長通知）に定める受注者発議用「工事に関する承諾・協議書」を活用して差し支えない。この場合は、「承諾協議事項」欄に下記 2 の記載事項を記載すること。

1 監督員との協議者

監督員に対する協議者は、元請負人に限る。例えば、2 次下請業者を選定するに当たって県外業者を選定しなければならない特段の理由がある場合は、1 次下請業者は元請負人に協議し、これを受けた元請負人が監督員に協議するものとする。

2 協議書記載事項

(1) 協議事由

記載例：鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（第 5 条第 1 項・第 6 条第 1 項第 4 号・第 6 条第 1 項第 5 号）に基づき、下請制限の除外（回数制限・県内業者優先選定・県外貢献業者優先選定）を協議します。

(2) 協議理由

注意：下記 3 に留意して、客観的かつ具体的に協議理由を記載すること。

(3) 下請工事の内容

(4) 下請負人予定者

3 協議理由記載に当たっての留意事項

該当条項	協議理由記載に当たっての留意事項
<p>第 5 条第 1 項 (回数制限)</p>	<p>1 当該下請施工しようとする工事が、回数制限を超える重層下請による方法でしか施工できない客観的かつ具体的な理由（施工能力を有する県内業者が 1 社以下であると判断した理由を含む。）を記載すること。</p> <p>2 制限回数内で並列的に下請を出す方法では施工できず、直列的な重層下請による方法でしか施工できない等の理由を示すこと。</p> <p>* 回数制限の解除がやむを得ないと認められる場合の例としては、トンネル工事のような大規模なもので、県内業者では技術的に施工できない内容の専門工事を 1 次下請として出す必要があり、当該下請工事の内容中に当該工事を請け負った業者が技術的に施工できず、かつ、1 次下請発注時においては分離し難い内容の専門工事が含まれる場合で、2 次下請においても同様の事情が生じるもの等が考えられる。</p> <p>* なお、次の例のように、適正に施工管理を行っていれば回避することができるようなものを理由とすることは認められない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自社の手持ち工事量が多い。 ・契約中の下請負人の中に、当該工事について施工能力を有する者がいない。
<p>第 6 条第 1 項第 4 号 (県内業者優先) 第 6 条第 1 項第 5 号 (県外貢献業者優先)</p>	<p>1 下請施工しようとする当該工事に関して、県内業者・県外貢献業者に施工させることができない客観的かつ具体的な理由を記載すること。</p> <p>2 県内業者・県外貢献業者では技術的に施工できない特殊で専門的な工事又は県内業者で施工できても工程的に間に合わない等の特段の理由を示すこと。</p>

【1次下請用】


（県発注工事を県から直接請け負った元請負人が下請契約を締結する場合用）

（鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守）

第 条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（以下「指針」という。）に規定する事項を互いに遵守しなければならない。

- 2 元請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥取県からは是正の指示があった場合は、速やかに是正するものとする。
- 3 下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、元請負人から指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やかに是正等に応じるものとする。
- 4 元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第9条第1項及び第4項の規定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県に協力するものとする。
- 5 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表3の条項の規定を下請契約書に明記させる等の必要な措置を講じるものとする。

【参考：別表2における元請負人及び下請負人の契約関係図】

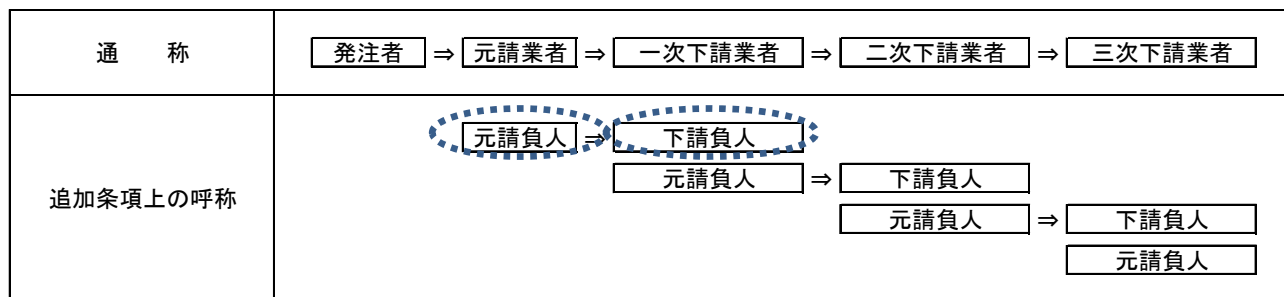

注：点線で囲まれた元請負人と下請負人との間での下請契約においてのみ、本書条項を追加してください。これ以外の下請契約においては、別表3の追加条項を追加してください。

【2次下請以下用】

（下請負人が元請負人として下請契約を締結する場合用）

（鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守）


第 条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（以下「指針」という。）に規定する事項を互いに遵守しなければならない。

2 元請負人及び下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥取県からこの契約の基となった県発注工事を直接請け負った元請負人（以下「直接請負人」という。）から指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やかに是正等に応じるものとする。

3 元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第9条第1項及び第4項の規定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県及び直接請負人に協力するものとする。

4 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表3の条項の規定を下請契約書に明記させる等の必要な措置を講じるものとする。

【参考：別表3における元請負人及び下請負人の契約関係図】

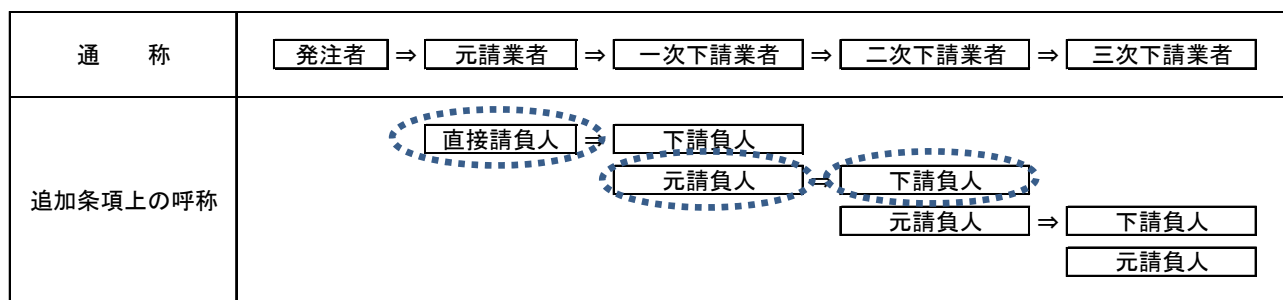

注：上記表の通称欄の一次下請業者と二次下請業者間の下請契約（この場合、追加条項上の呼称欄では、一次下請業者が元請負人に、二次下請業者が下請負人になる。）、又は二次下請業者と三次下請業者間の下請契約など、元請業者と一次下請業者間の下請契約以外の下請契約において、本書条項を追加してください。

なお、追加条項上の直接請負人とは、通称欄の元請業者に該当します。

報告書提出年月日 平成 年 月 日
報告書作成年月日 平成 年 月 日

保険未加入者選定報告書

（報告書作成者：県と直接契約関係にある元請負人）

商号又は名称

代表者氏名

印

保険未加入者の商号又は名称：	
1 保険未加入者を選定した具体的な理由	
2 当該保険未加入者に対する保険加入指導状況	<ul style="list-style-type: none">・保険加入指導を行った日（ 年 月 日）・保険未加入者に行った加入指導の内容 ・保険未加入者の保険加入手続完了時期（見込み） （ 年 月 日）
3 当該保険未加入業者が <u>加入指導後も保険加入できない場合</u> の理由	具体の理由を詳細に記載すること

下請契約遵守事項報告書

（報告書作成者：当該下請工事における下請注文者）

商号又は名称

代表者氏名

印

下請負人の商号又は名称：				
No.	項 目	はい	いいえ	「いいえ」 の理由
1	下請契約の締結に当たり、指針第4条第1号に規定する金額が確保されるよう努めた。			—
2	指針第5条第1項（次数制限）に違反する下請契約ではない。			—
3	指針第6条第1項第3号（保険未加入者との下請契約締結制限）に違反する下請契約ではない。			
4	指針第6条第1項第4号（県内業者優先）及び第5号（貢献県外業者優先）に違反する下請契約ではない。			—
5	指針第7条第1号の規定に基づき、県が公表する鉄筋工、型枠工等専門工種の標準単価又は労務価格を明示した工種別労務費一覧表を含む設計書（金入り）等を参照し、適正な価格での契約に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十分に協議した。			—
6	指針第7条第2号の規定に基づき、下請予定者に対して、法定福利費の内訳を明示した標準見積書の提出を書面により依頼し、標準見積書が提示された場合はこれを尊重した。			
7	指針第7条第3号の規定に基づき、建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、指針別表2又は3に掲げる条項を追加して記載することとしている。			—

〔記入要領〕

- 1 下請注文者は、当該県発注工事に係る全ての下請契約締結前に、その手続等の適否について、上記項目により確認すること。
- 2 確認項目中、「いいえ」の項目があった場合は、契約の締結前に改善すること。
- 3 確認項目No.2及び4について、元請負人が監督員から特段の理由がある場合の承認を受けている場合は「はい」とすること。
- 4 確認項目No.3及び6について、「いいえ」となることが認められるためには、No.3においては2次以下の下請契約をやむを得ず保険加入者以外の者と締結する場合、No.6においては標準見積書の作成を依頼しているにも関わらず下請負人が作成しない場合など、合理的な理由が必要である。
- 5 元請負人が下請契約を締結したときは、下請契約締結の日の翌日から起算して20日以内に施工体制台帳等の写し及びこれの添付書類とともに本書を県に提出すること。
また、元請負人以外の下請注文者が下請負契約を締結したときは、元請負人に対して遅滞なく再下請負通知書及びこれの添付書類とともに本書を提出し、それを受けた元請負人は、その写し等を当該下請契約締結の日の翌日から起算して20日以内に県に提出すること。
- 6 1から5の要領は、変更契約時も同様とする。

みんなで、適切な賃金水準を確保！ 社会保険等への加入を徹底！

まじめに働く職人が報われるために



【現状と課題】

- ◆ 近年、建設投資の大幅な減少に伴う競争激化のしわ寄せが、労働者の賃金低下をもたらし、若年入職者が大きく減少
- ◆ 今、適切な対策を講じなければ、将来の建設産業の存続が危惧される状況

適切な賃金水準の確保や社会保険等への加入徹底により、就労環境を改善し、若年者の入職が進むような職場とする必要があります。

- ◆ 適切な賃金水準の確保、社会保険等への加入徹底の観点から、本県では公共工事設計労務単価を平成25年4月に11.5%、平成26年2月には6.6%、平成27年2月には4.1%、平成28年2月には3.6%、平成29年3月には3.2%、平成30年3月には3.1%、平成31年3月には1.4%、令和2年3月には2.5%、令和3年3月には0.8%、令和4年3月には2.8%、令和5年3月には4.4%、令和6年3月には6.4%引き上げ、平成24年度に比べ約63.2%の上昇となりました。

技能労働者への適切な水準の賃金支払

- 適切な価格での下請契約を締結しましょう
- 技能労働者への適切な水準の賃金支払を元請から下請に要請しましょう
- 雇用する技能労働者の賃金水準を引き上げましょう

社会保険等への加入徹底

- 法定福利費相当額(労働者負担分及び事業主負担分)を適切に含んだ下請契約を締結しましょう
- 労働者に法定福利費相当額を適切に含んだ賃金を支払い、社会保険に加入させましょう

元請による下請への指導（社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン）

- 周知啓発や加入状況の定期把握、加入指導(2次以下を含む。)
- 未加入企業を下請企業に選定しない取扱いとすべき
- 新規入場者の受け入れに際し、適切な保険に加入させるよう下請企業を指導。加入が確認できない作業員の現場入場を認めない取扱いとすべき

☺ 社会保険適用除外者(従業員が4人以下の個人事業主や一人親方)や適切な保険に加入している作業員に対して、誤って社会保険等の加入を強制することのないように注意が必要

請負契約における法定福利費の確保（標準見積書の活用）

- 元請 ➢ 発注者に対し法定福利費を含む金額による契約締結を求めましょう
- 元請 ➢ 専門工事業者に法定福利費が内訳明示された見積書の提示を求めるとともに、提示された場合、これを尊重しましょう

- 下請 ➢ 法定福利費が内訳明示された見積書を活用等して、元請に見積提出しましょう



公共工事設計労務単価（主要 10 職種）変動率

鳥取県の公共工事設計労務単価は、全職種平均で平成 25 年に 11.5%、平成 26 年 2 月に 6.6%、平成 27 年 2 月に 4.1%、平成 28 年 2 月に 3.6%、平成 29 年 3 月に 3.2%、平成 30 年 3 月に 3.1%、平成 31 年 3 月に 1.4%、令和 2 年 3 月に 2.5%、令和 3 年 3 月に 0.8%、令和 4 年 3 月に 2.8%、令和 5 年 3 月に 4.4%、令和 6 年 3 月に 6.4% 引き上げられ、平成 24 年度に比べ約 63.2% の上昇となりました。主要 10 職種の引き上げ率は下表のとおりです。

職 種	単 価 (円)														上昇率
	H24.4	対H24.4比 H25.4	対H25.4比 H26.2	対H26.2比 H27.2	対H27.2比 H28.2	対H28.2比 H29.3	対H29.3比 H30.3	対H30.3比 H31.3	対H31.3比 R2.3	対R2.3比 R3.3	対R3.3比 R4.3	対R4.3比 R5.3	対R5.3比 R6.3	対H24.4比	
特殊 作業員	13,800	10.9%	3.9%	1.3%	5.6%	0.0%	2.9%	4.0%	1.6%	0.5%	5.4%	2.0%	8.0%	56.5%	
普通 作業員	10,800	11.1%	4.2%	1.6%	8.7%	0.0%	2.9%	4.2%	1.4%	0.0%	3.3%	3.2%	5.0%	55.6%	
軽 作業員	9,500	14.7%	3.7%	0.9%	6.1%	0.0%	3.3%	4.0%	1.5%	0.0%	0.0%	6.1%	8.6%	60.0%	
とび工	15,000	12.0%	7.1%	5.0%	5.3%	3.0%	3.4%	0.5%	2.3%	0.0%	5.0%	1.7%	3.4%	60.7%	
鉄筋工	14,900	12.1%	7.2%	5.0%	5.3%	2.5%	3.0%	0.5%	2.4%	0.0%	0.0%	0.9%	17.1%	70.5%	
運転手 (特殊)	12,900	10.9%	3.5%	1.4%	5.3%	0.0%	3.2%	4.3%	1.8%	0.0%	4.0%	2.2%	7.6%	53.5%	
運転手 (一般)	11,100	10.8%	4.9%	1.6%	6.1%	0.0%	2.9%	4.2%	1.3%	2.6%	5.2%	2.5%	8.4%	63.1%	
型わく 工	14,600	12.3%	7.3%	5.1%	5.4%	2.6%	3.0%	0.5%	2.4%	2.8%	0.0%	6.4%	5.2%	67.1%	
大工	14,900	12.1%	7.2%	5.0%	5.3%	2.5%	3.0%	0.5%	2.4%	0.0%	0.0%	5.6%	3.5%	57.7%	
左官	14,200	12.0%	7.5%	5.3%	5.6%	2.6%	3.1%	0.5%	2.0%	0.0%	0.0%	4.9%	3.7%	57.7%	

【公共工事設計労務単価とは？】

- ・公共工事の予定価格の算出に用いる積算用の単価で、作業員やとび工など技能労働者 51 職種について定めています。
- ・各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働（所定時間内）に対する単価で、時間外等の割増賃金や作業内容を超えた特殊な労働に対する賃金は含まれていません。
- ・労務単価の内訳は次のとおりです。

労務単価 = 1. 基本給相当額 + 2. 基準内手当 + 3. 臨時の給与 + 4. 実物給与
 1. 基本給相当額 基本給（法定福利費本人負担分相当額を含む。）及び出来高給
 2. 基準内手当 家族手当、通勤手当、住宅手当、技能手当など
 3. 臨時の給与 賞与（ボーナス）など
 4. 実物給与 通勤定期や食事の支給など

注：法定福利費事業主負担分は、現場管理費に計上されています（労務単価には、法定福利費事業主負担分は含まれていません。）。

- ・新しい労務単価は、労務費調査により賃金の支払い実態を把握し、その結果を基に決定します。よって、**労務単価が適切な水準に維持されるためには、末端の下請企業の技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる水準の賃金が適切に支払われることが重要となります。**

【例】普通作業員（16,800 円/日、20 日/月勤務）の場合

月当たり 16,800(円/日)×20(日)=336,000 円となり、これは上記枠内の 1. ～ 4. により算定した年収（4,032 千円）を 12 ヶ月で除したものに相当し、法定福利費（雇用保険、医療保険及び年金保険）の本人負担相当額（約 15%）が含まれています。

鳥取県県土整備部県土総務課

公共工事設計労務単価と法定福利費

－ 適正な金額での下請契約のために －

公共工事設計に計上されている各工種の労務費及び諸経費（現場管理費）には、法定福利費が含まれています。下請契約にあたっては、法定福利費相当額（労働者負担分及び事業主負担分）を適切に含んだ金額で締結してください。

また、労働者に法定福利費相当額を含んだ賃金を支払い、社会保険等への加入を徹底しましょう。

なお、法定福利費相当額（労働者負担分及び事業主負担分）の算出にあたっては、下記を参考にしてください。

代表的な専門工種の労務に係る法定福利費相当額の算定例（R6.3月以降）

■標準単価（公共工事設計標準歩掛及び労務単価による）

各工種の標準的な積算条件による単価は以下のとおり（直接工事費原価ベース）ですが、詳細な積算条件等は、公表設計書をご覧ください。

工種名	規格	単位	標準単価		
				労務費	器具及び諸雑費
鉄筋工 ※1	D10～D51	t	57,000 円 (100.0%)	55,518 円 (97.4%)	1,482 円 (2.6%)
足場工	手摺先行型 足場	掛㎡	4,143 円 (100.0%)	2,294 円 (55.4%)	1,849 円 (44.6%)
型枠工 ※2	鉄筋・無筋 構造物	㎡	7,705 円 (100.0%)	6,265 円 (81.3%)	1,440 円 (18.7%)

※1 鉄筋工の値は、鉄筋材料費を含まず、また市場単価のため、H4歩掛の構成比率から算定。

※2 型枠工の値は、施工パッケージのため、構成比から法定福利費の対象となる労務費を算定。

詳細な内訳は、下記ホームページを参照してください。

<http://www.pref.tottori.lg.jp/tekiseishitauke/>

注）下請金額には、上記の標準単価の他に、運搬費、会社経費等の諸経費の計上が必要です。

■法定福利経費の算出

	①標準単価 (直接工事費原価)	②うち労務費		③事業主負担分 法定福利費 (現場管理費分に計上)
			うち労働者負担分 法定福利費	
鉄筋工	57,000 円/t	55,518 円/t	8,600 円/t	9,049 円/t
足場工	4,143 円/掛㎡	2,294 円/掛㎡	355 円/掛㎡	374 円/掛㎡
型枠工	7,705 円/㎡	6,265 円/㎡	970 円/㎡	1,021 円/㎡

◎労働者負担分の算定式 労務費×154.90÷1,000

◎事業主負担分の算定式 労務費×163.00÷1,000

※R6.3月以降の率

●元請から下請事業主に支払われる部分 ⇒①(単価) + ③(事業主負担分法定福利費)

●下請事業主から下請労働者に支払われる部分 ⇒②(労務費)

※労務費に労働者負担分法定福利費を含む

鳥取県県土整備部技術企画課

県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備）

図面番号	図面名	縮尺	備考	図面番号	図面名	縮尺	備考
E-01	タイトル、図面リスト	—		E-16	弱電設備2階配管配線図(2) (教室棟)(改修図)	S=1/50	
E-02	電気設備工事特記仕様書(1)	—		E-17	弱電設備2階配管配線図 (高等部棟)(改修図)	S=1/50	
E-03	電気設備工事特記仕様書(2)	—		E-18	弱電設備3階配管配線図 (高等部棟)(改修図)	S=1/50	
E-04	付近見取図、敷地全体配置図、工事概要	S=1/700		E-19	電灯・コンセント設備2階配管配線図 (教室棟)(撤去図)	S=1/50	
E-05	1階平面図	S=1/300		E-20	電灯・コンセント設備2階配管配線図(1) (高等部棟)(撤去図)	S=1/100	
E-06	2階平面図	S=1/300		E-21	電灯・コンセント設備2階配管配線図(2) (高等部棟)(撤去図)	S=1/100	
E-07	3階平面図	S=1/300		E-22	電灯・コンセント設備3階配管配線図 (高等部棟)(撤去図)	S=1/100	
E-08	受変電設備単線結線図_空調動力幹線系統図_電灯盤増設改修表	—		E-23	弱電設備2階配管配線図 (教室棟)(撤去図)	S=1/100	
E-09	照明器具・弱電機器参考姿図・主要間仕切貫通部参考図	—		E-24	弱電設備2階配管配線図(1) (高等部棟)(撤去図)	S=1/100	
E-10	空調電源2階配管配線図 (教室棟)(改修図)	S=1/100		E-25	弱電設備2階配管配線図(2) (高等部棟)(撤去図)	S=1/100	
E-11	電灯・コンセント設備2階配管配線図(1) (教室棟)(改修図)	S=1/100		E-26	弱電設備3階配管配線図 (高等部棟)(撤去図)	S=1/200	
E-12	電灯・コンセント設備2階配管配線図(2) (教室棟)(改修図)	S=1/100		E-27	第一情報室移転改修配線図 (高等部棟)(改修図)	S=1/100	
E-13	電灯・コンセント設備2階配管配線図 (高等部棟)(改修図)	S=1/100		E-28	一部解体支障先行工事(1) (教室棟)(高等部棟)(改修図)	S=1/200	
E-14	電灯・コンセント設備3階配管配線図 (高等部棟)(改修図)	S=1/50		E-29	一部解体支障先行工事(2) (教室棟)(高等部棟)(改修図)	S=1/200	
E-15	弱電設備2階配管配線図(1) (教室棟)(改修図)	S=1/50		E-30	一部解体支障先行工事(3) (高等部棟)(改修図)	S=1/200	



県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備）

電気設備 タイトル、図面リスト

株式会社 樟設備設計事務所 〒680-0052 鳥取市殿治町14 二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT. NO	DATE	SCALE	DRAWING. NO
		22-15	2023.04		E-01

一般共通事項



16 土工事
17 電線類
18 電線本数・管径等
19 厚鋼電線管の溶融亜鉛メッキ
20 露出配管の塗装
21 波付硬質合成樹脂管 (FEP)
22 フラッシュプレートの材質
23 カバープレートの用途別表示
24 地中箱
25 耐震施工
26 接地極
27 屋上、屋外の支持金物等
28 結露防止
29 アスベスト含有建材の処理

⑩ 補修など
⑪ はつり
⑫ はつり工事における非破壊検査
33 あと施工アンカー
34 室内空気中の化学物質の濃度測定
⑬ 火災保険等
35 鳥取県公共事業環境配慮指針
37 建築物省エネ法
① 照明器具
② 一般照明の照度測定
③ 非常用照明の照度測定
④ 照明制御の照度測定等
⑤ 機器への接続
⑥ 大地抵抗率の測定
⑦ 外部雷保護設備接地システム
⑧ 変圧器移動車輪
⑨ デマンド監視装置
⑩ 3 室内照明
⑪ 1 交流無停電電源装置 (UPS)
⑫ 1 自家発電装置
⑬ 2 太陽光発電装置
⑭ 3 風力発電装置
⑮ 1 交換機
⑯ 2 保安器用接地
⑰ 3 壁付電話機との接続
⑱ 4 回線数
⑲ 5 電話機
⑳ 6 電話機への接続
㉑ 1 マルチサイン装置
㉒ 2 出退表示装置
㉓ ③ 時刻表示装置
㉔ 1 プロジェクタ

11 増幅器
12 音声誘導装置
13 1 自動火災報知設備
2 自動閉鎖設備
3 ガス漏れ火災警報設備
14 1 施工方法
2 地中箱
3 高圧負荷開閉器
4 高圧ケーブルの端部処理
5 高圧ケーブルの屋外端部処理
6 標識シート
7 照明用ポール
15 1 調査仕様
2 テレビ電波受信障害調査時期
3 受信する受信波及び地点数
4 報告書提出部数
16 1 機器取付高
2 工事のため送電線及び配電線の近くで作業するときは、事前に中国電力に連絡し、事故防止に努めるものとする。

平成29年4月改定版



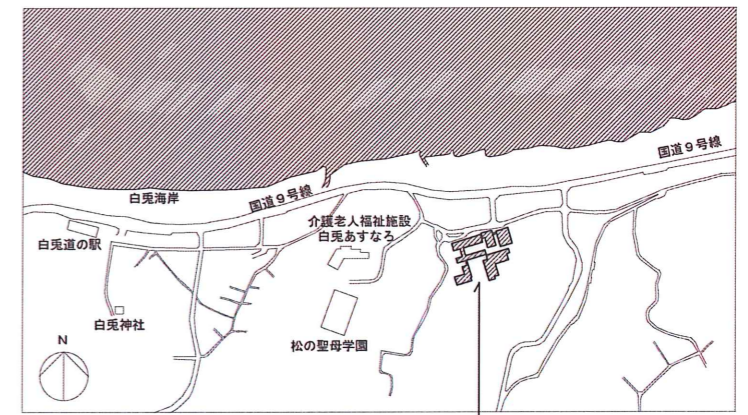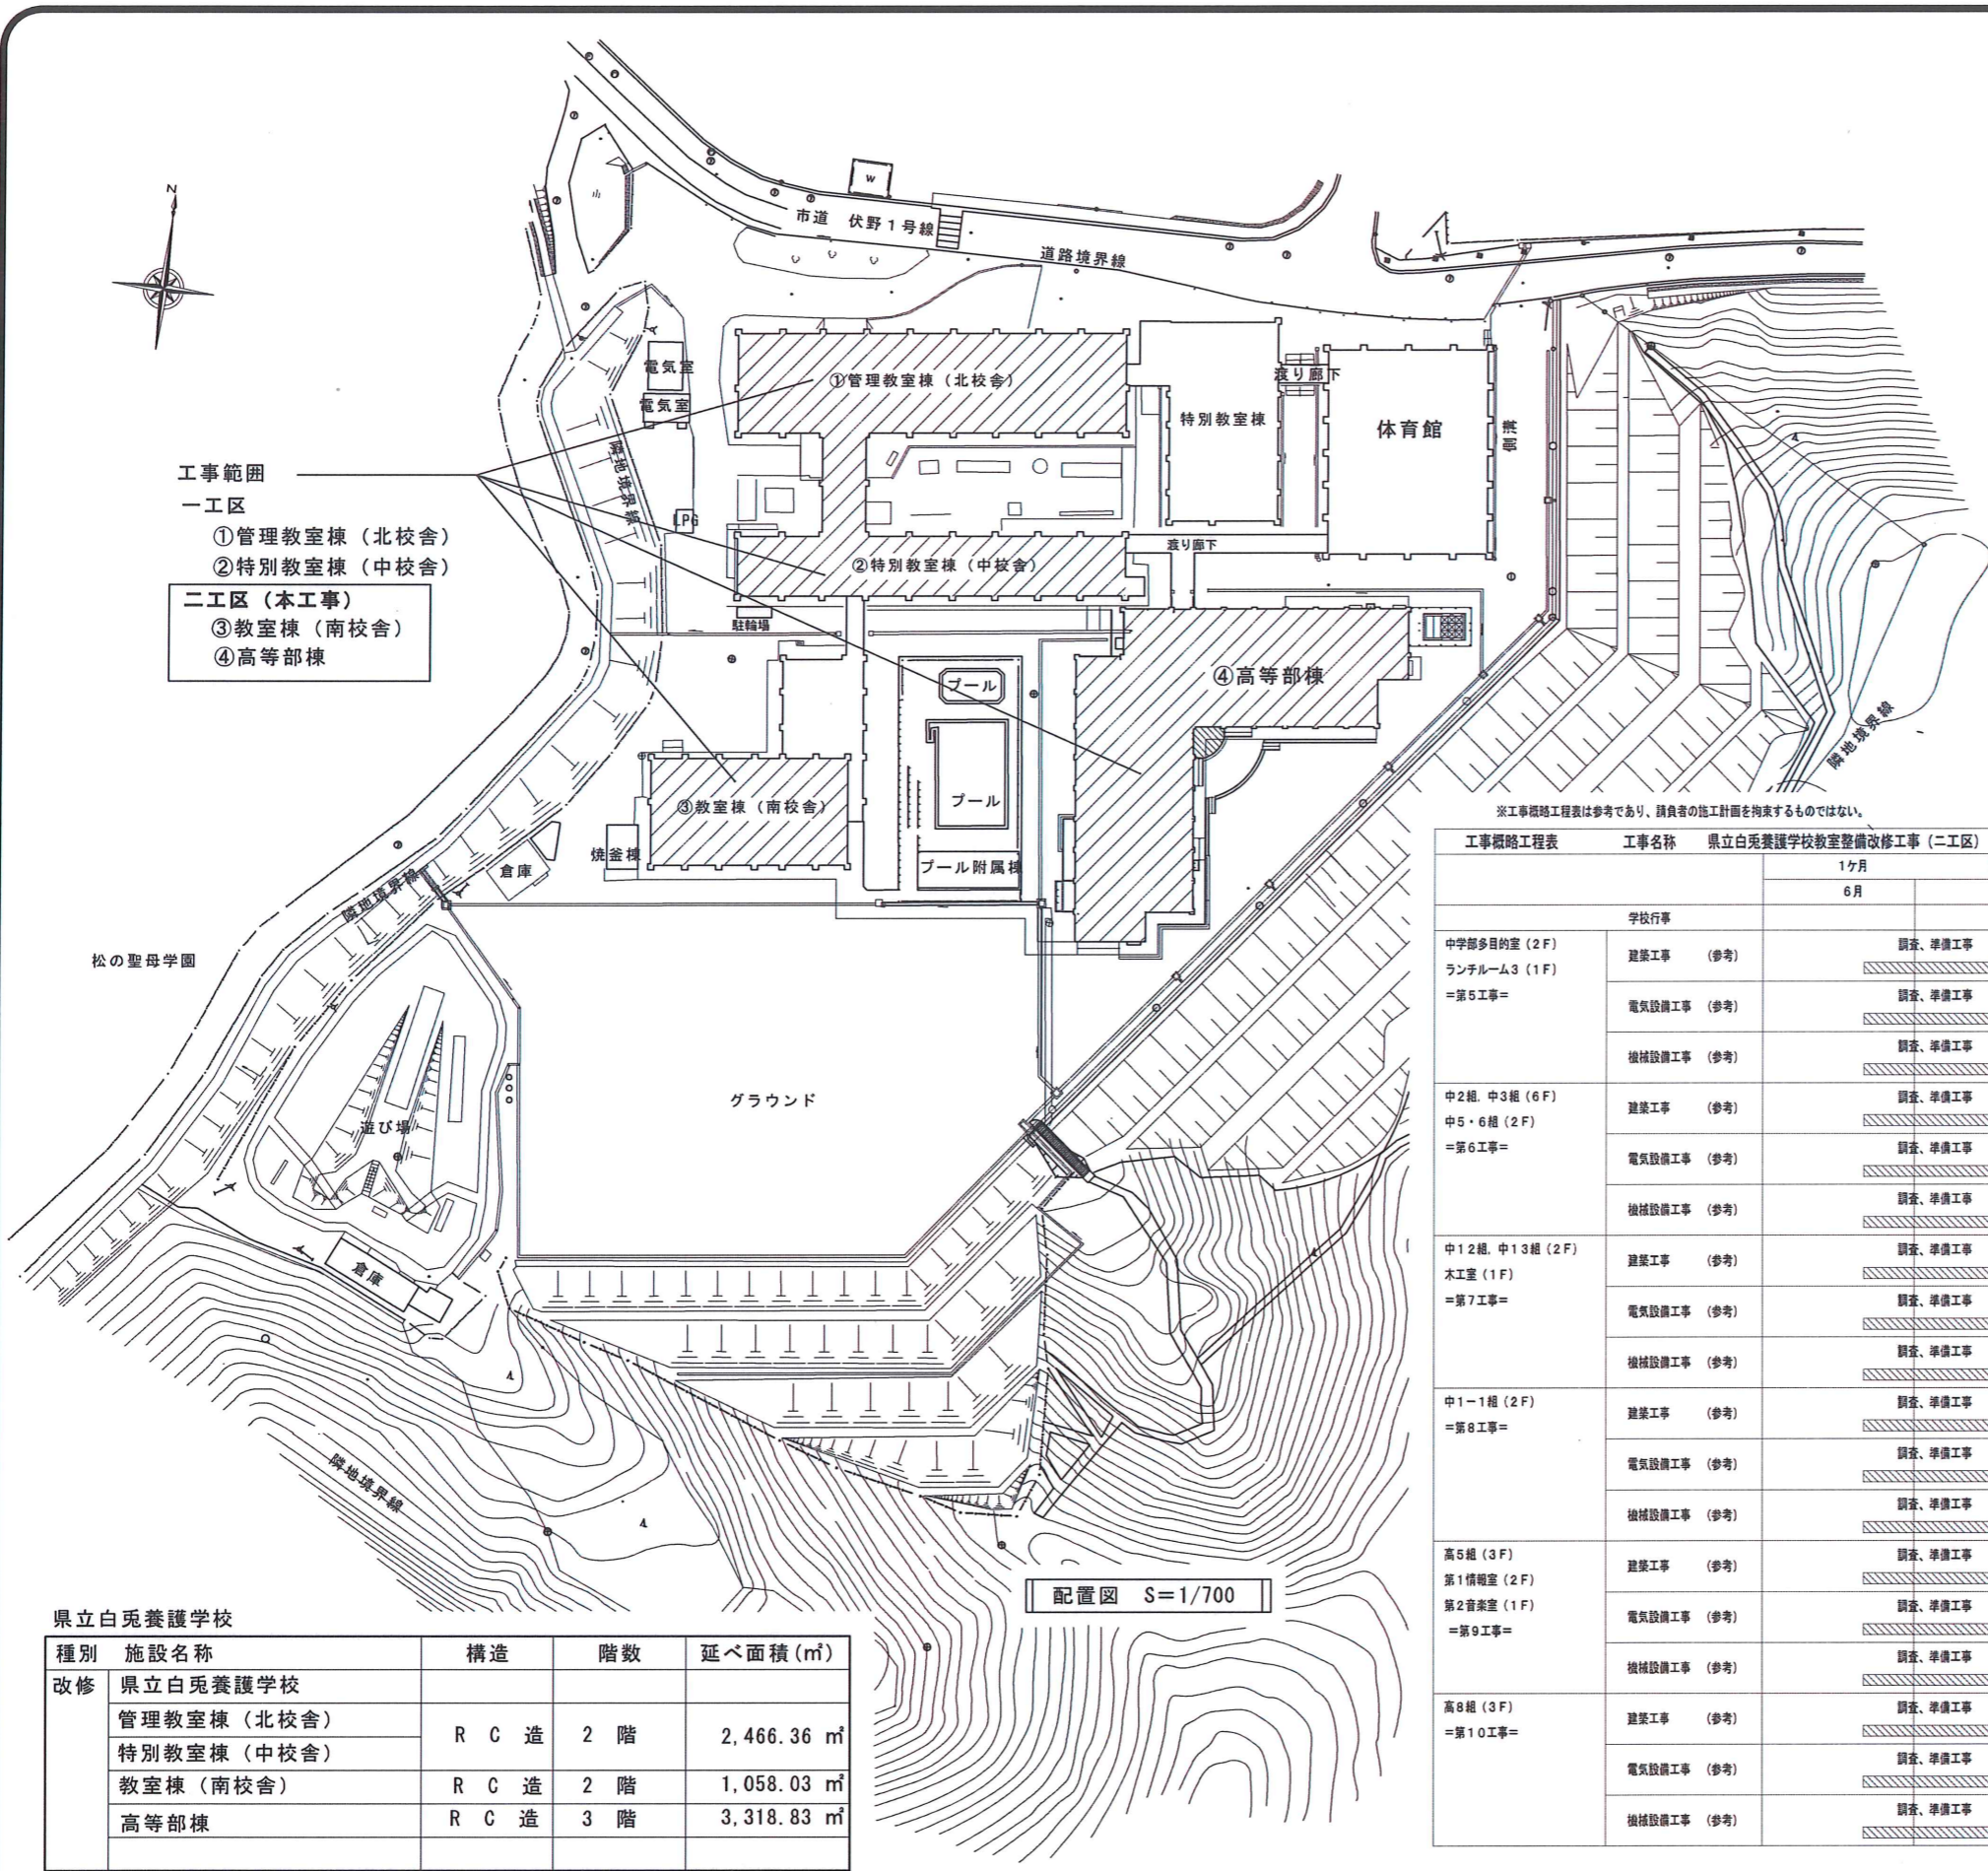

付近見取り図

工事場所：鳥取市伏野
県立白兔養護学校

- 工事範囲
- 一工区
 - ①管理教室棟（北校舎）
 - ②特別教室棟（中校舎）
 - 二工区（本工事）
 - ③教室棟（南校舎）
 - ④高等部棟

工事概要

- ①教室棟（南校舎）2階
〔建築工事〕別途
移動間仕切りを新設する
・移動間仕切り1箇所新設
・間仕切り壁2箇所新設
・上記に伴う、天井、壁、床の補修等
・2階天井撤去後復旧 ライニングスペース取付
・2階7㎡サッシュに7㎡ハッチ取付3カ所
- ②高等部棟 2、3階
〔建築工事〕別途
移動間仕切りを新設する
・移動間仕切り2箇所新設
・間仕切り壁2箇所新設
・上記に伴う、天井、壁、床の補修等
・1階・2階PS・天井撤去後復旧
・2階・3階7㎡サッシュに7㎡ハッチ取付

《電気設備工事》

- ◎本工事は使用中の既存施設の改修であり、関係箇所の事前調査を綿密に行い設備事故防止に努めること。
- ・上記建築改修工事に伴い、既存電気設備の撤去移設を行う。
 - ・間仕切変更により増設される教室には、既存教室に準じた電気設備を増設する。
 - ・電話設備については、撤去・改修とも教室内～廊下までの配管工事とし、機器及び配線工事は別途とする。
 - ・構内情報設備（LAN配線）については、教室側受口～最寄りのHUB収容BOX間の配線とし機器及び接続は別途とする。

工事留意事項

- ・本工事は施設を利用しながらの工事である。
- ・本工事着手前に、施工場所の使用状況・搬入経路及び工程について監督員と協議の上、施工すること。
- ・工事車両の通行に際しては、事故防止に十分注意する事。
- ・本工事に伴い、周辺道路及び周辺建築物、周辺工作物等に損傷を与えた場合は、すみやかに監督員に報告すると共に、請負業者の責任に於いて復旧とする事。
- ・本工事に伴う不燃物、可燃物及び再生可能物等は分別し処分を行うと共に、産業廃棄物処理に関する法律を遵守する事。

※工事概略工程表は参考であり、請負者の施工計画を拘束するものではない。


工事概略工程表	工事名称	県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備）			
		1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月
		6月	7月	8月	9月
学校行事				夏休み	
中学部多目的室（2F） ランチルーム3（1F） =第5工事=	建築工事（参考） 電気設備工事（参考） 機械設備工事（参考）	調査、準備工事	解体、改修工事		
中2組、中3組（6F） 中5・6組（2F） =第6工事=	建築工事（参考） 電気設備工事（参考） 機械設備工事（参考）	調査、準備工事	解体、改修工事		
中12組、中13組（2F） 木工室（1F） =第7工事=	建築工事（参考） 電気設備工事（参考） 機械設備工事（参考）	調査、準備工事	解体、改修工事		
中1-1組（2F） =第8工事=	建築工事（参考） 電気設備工事（参考） 機械設備工事（参考）	調査、準備工事	解体、改修工事		
高5組（3F） 第1情報室（2F） 第2音楽室（1F） =第9工事=	建築工事（参考） 電気設備工事（参考） 機械設備工事（参考）	調査、準備工事	解体、改修工事		
高8組（3F） =第10工事=	建築工事（参考） 電気設備工事（参考） 機械設備工事（参考）	調査、準備工事	解体、改修工事		

県立白兔養護学校

種別	施設名称	構造	階数	延べ面積（㎡）
改修	県立白兔養護学校			
	管理教室棟（北校舎）	R C 造	2 階	2,466.36 ㎡
	特別教室棟（中校舎）			
	教室棟（南校舎）	R C 造	2 階	1,058.03 ㎡
	高等部棟	R C 造	3 階	3,318.83 ㎡

配置図 S=1/700



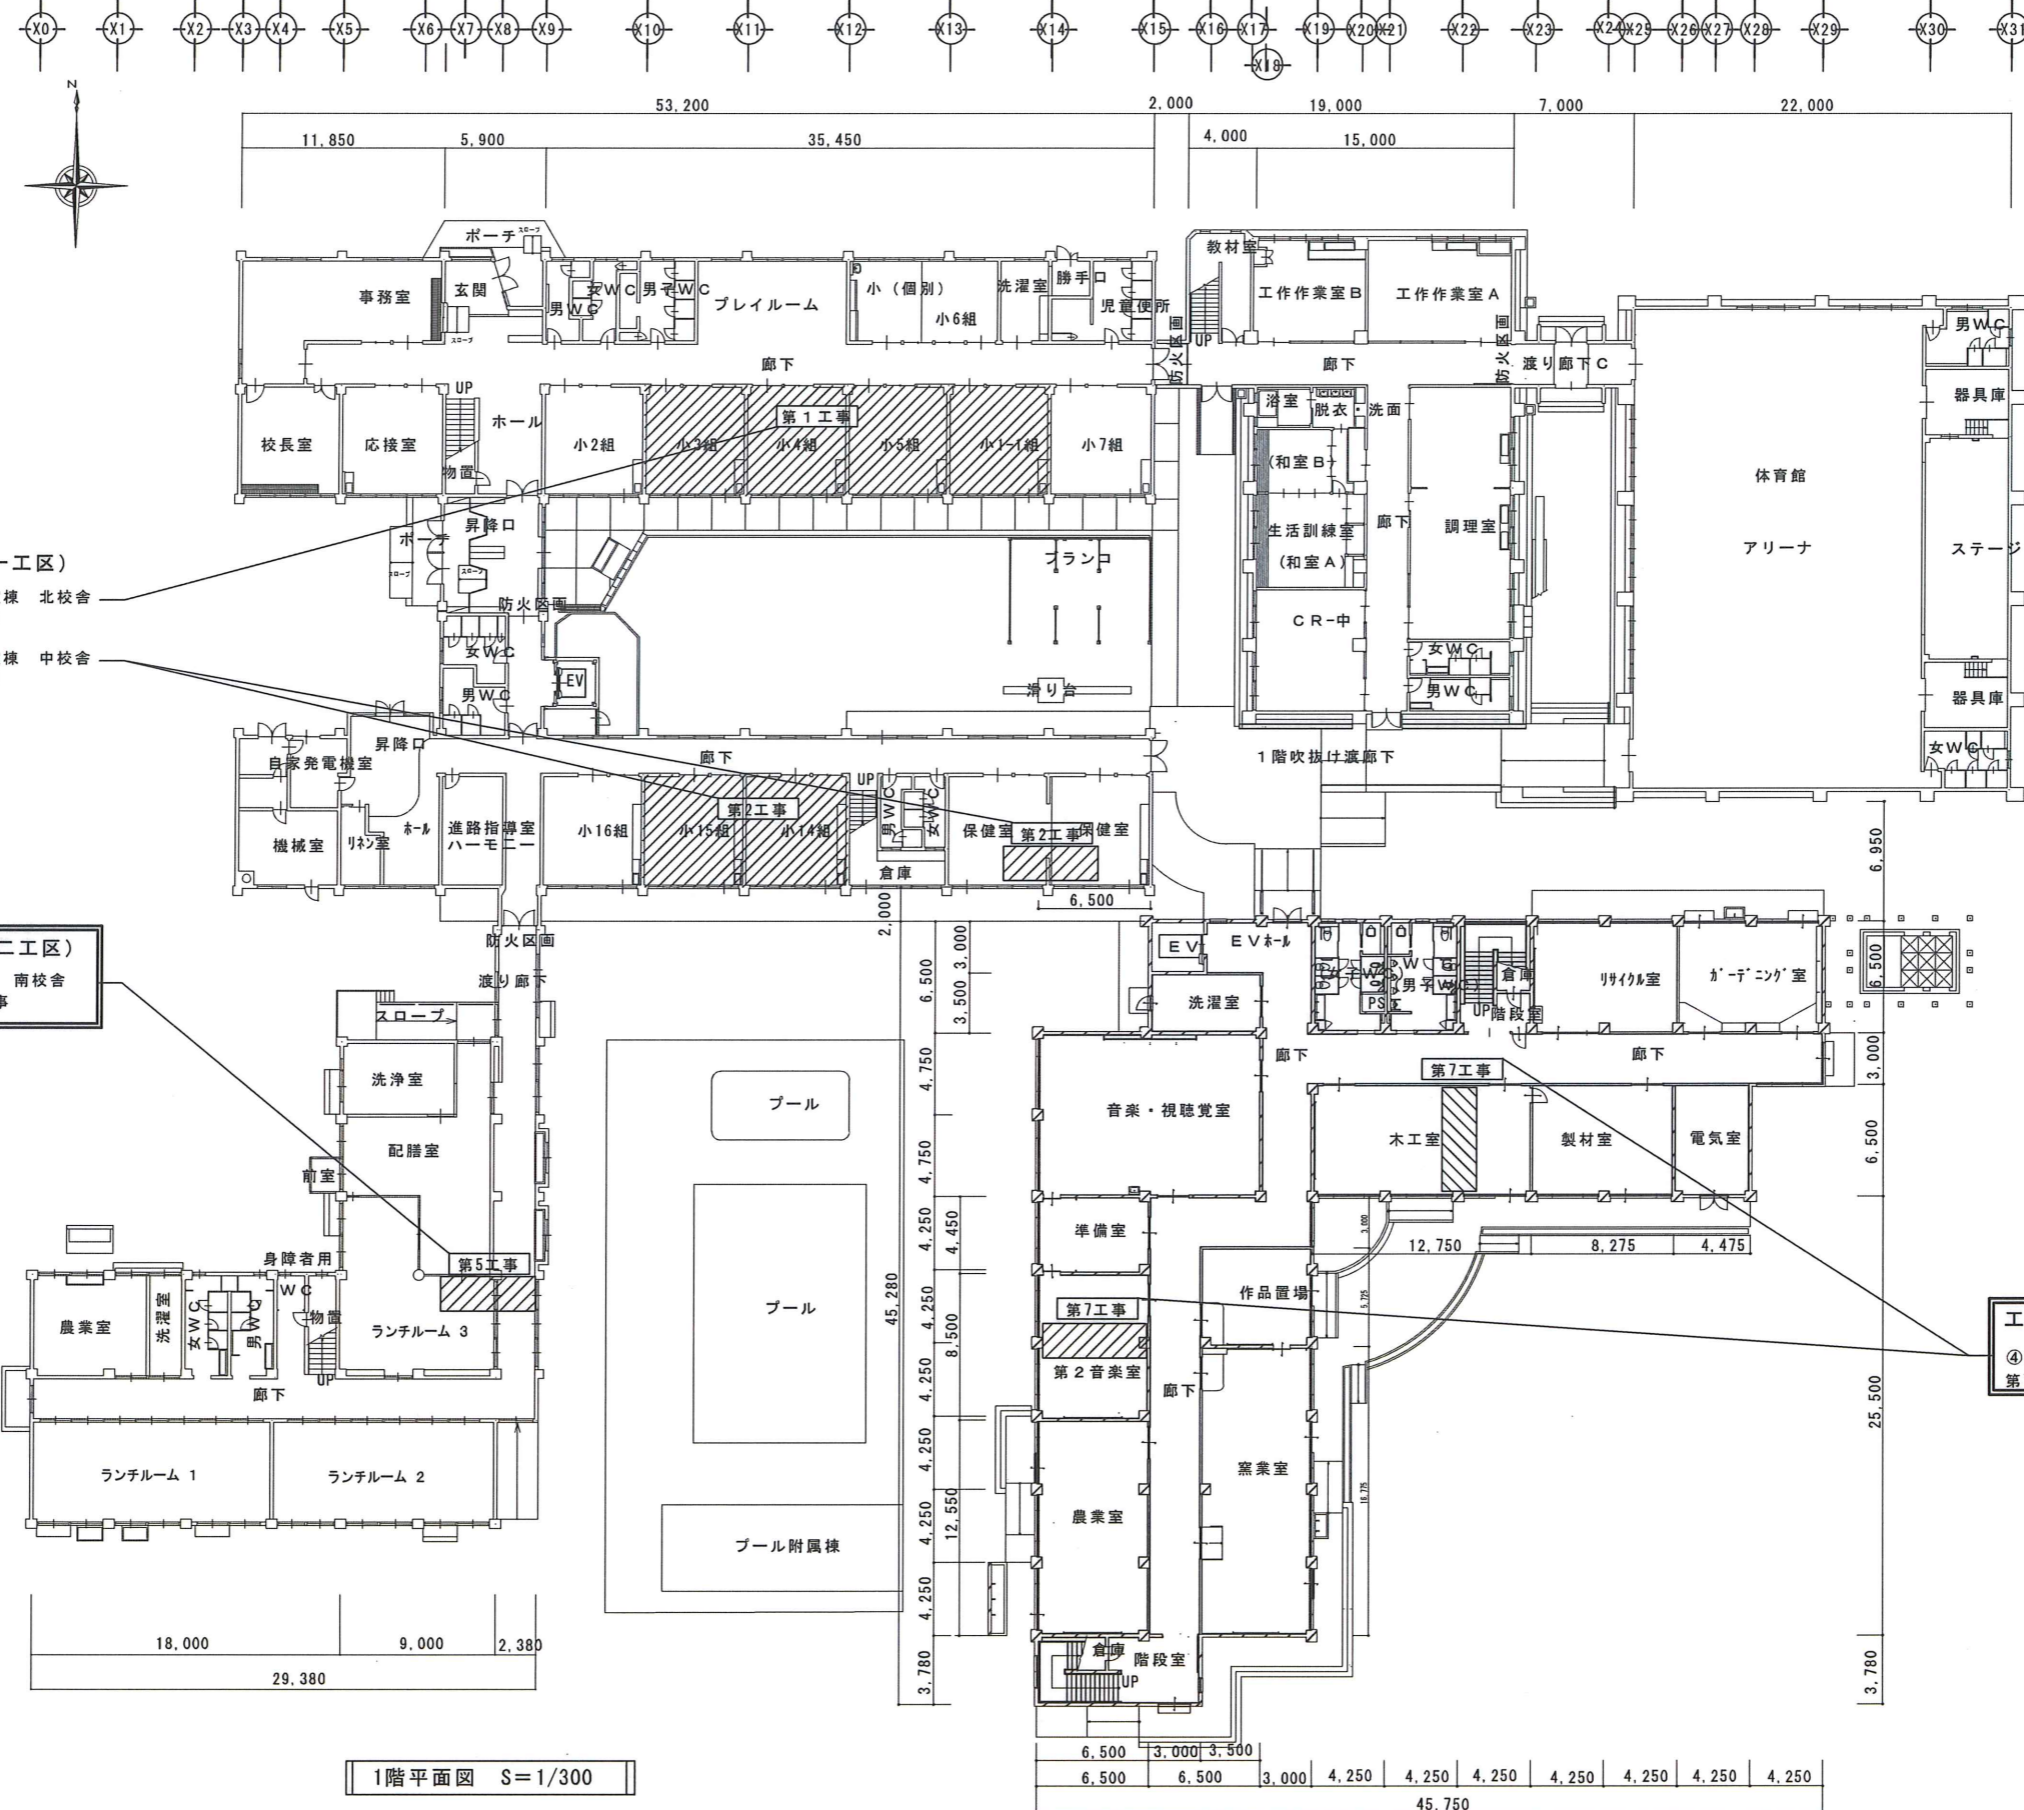

工事範囲（一工区）

- ①管理教室棟 北校舎 第1工事
- ②特別教室棟 中校舎 第2工事

工事範囲（二工区）

- ③教室棟 南校舎 第5工事

工事範囲（二工区）

- ④高等部棟 第7工事

1階平面図 S=1/300

県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備）


電気設備 1階平面図

株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取市緑道町14
二級建築士登録番号 第2810号 鈴木 正樹

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
		22-15	2023.04	S=1/300	E-05



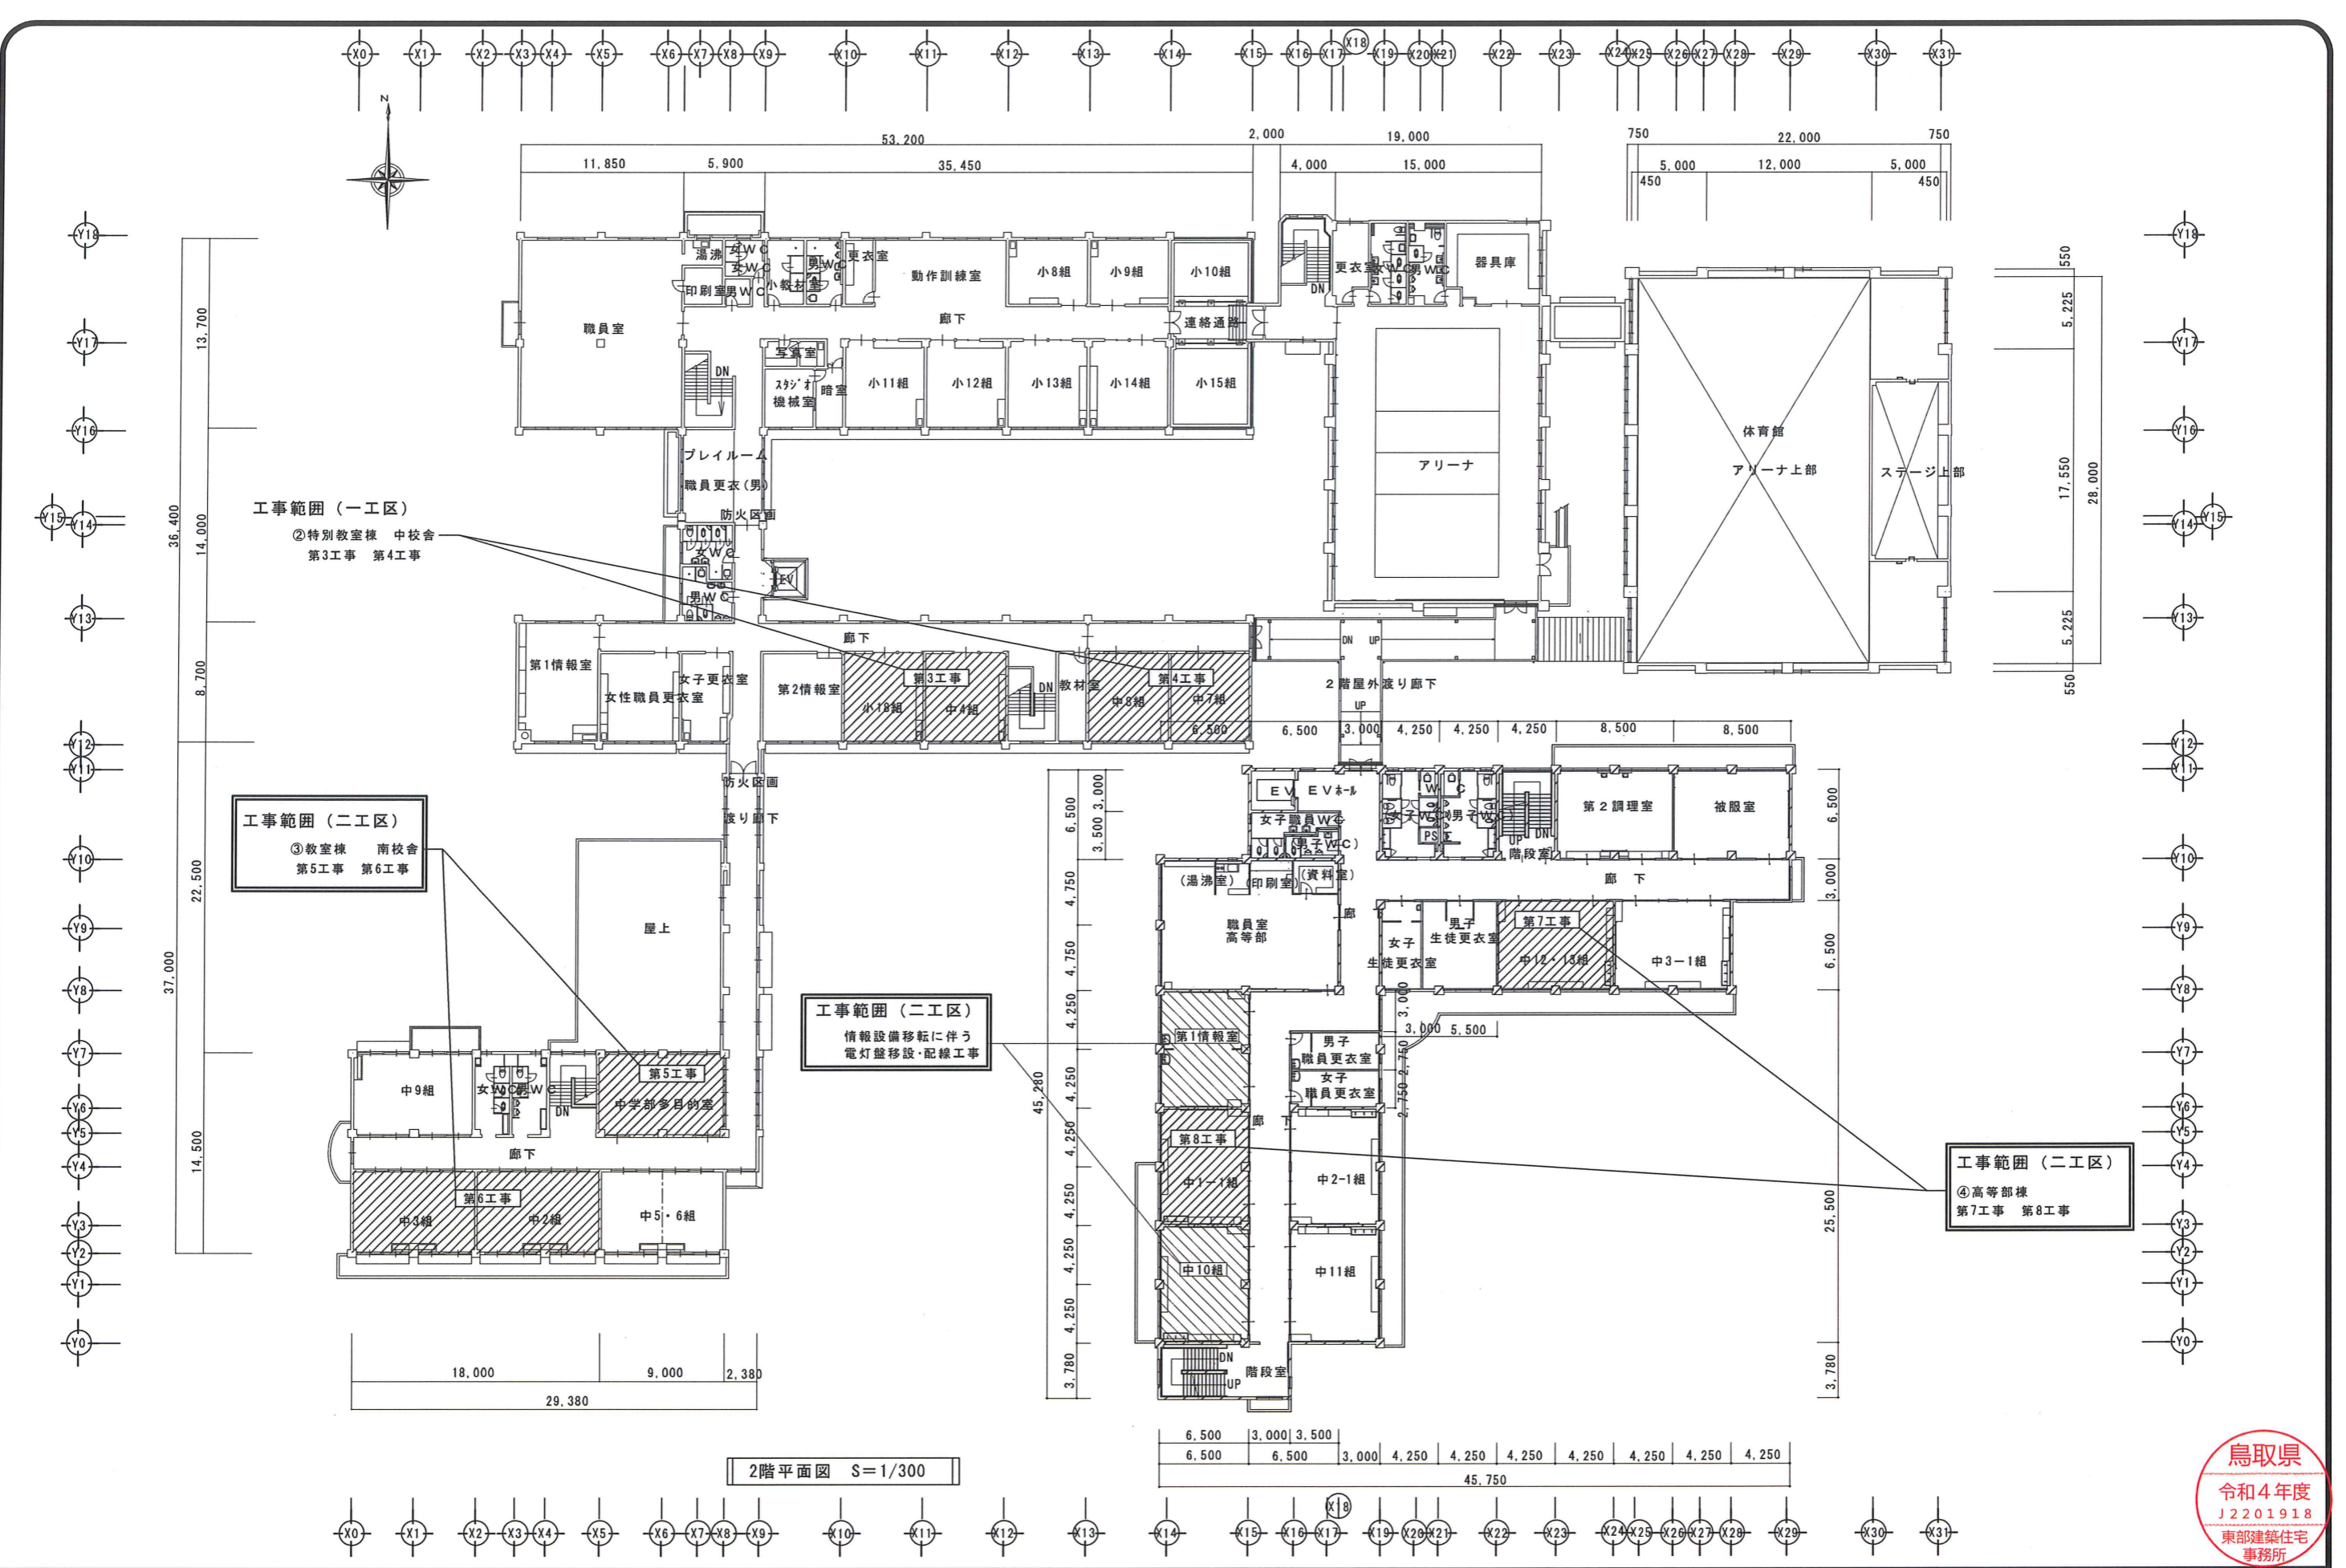

2階平面図 S=1/300

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

県立白兔養護学校教室整備改修工事（二工区）（電気設備） 電気設備 2階平面図		株式会社 樟設備設計事務所 〒680-0052 鳥取市緑浜町14 二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏	CHECKED BY 	DRAWING BY 	PROJECT NO 22-15	DATE 2023.04	SCALE S=1/300	DRAWING NO E-06
---	--	---	----------------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	--------------------




3階平面図 S=1/300

工事範囲(二工区)
④高等部棟
第9工事 第10工事

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

受変電設備単線結線図


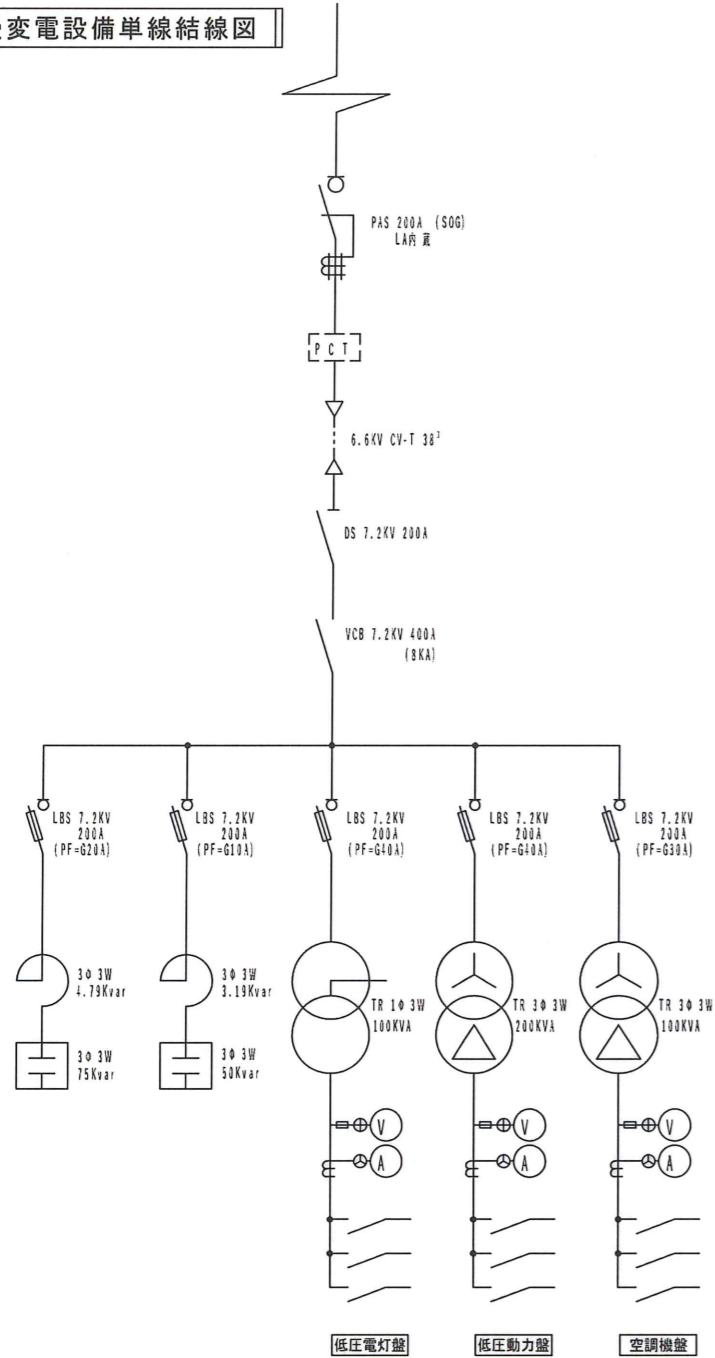


- 低圧電灯盤
- MCCB 3P 225AF/150AT x 4
 - MCCB 3P 100AF/100AT x 3
 - MCCB 3P 50AF/ 50AT x 1
 - MCCB 2P 50AF/ 20AT x 5

- 低圧動力盤
- MCCB 3P 100AF/100AT P 1 LM-1D
 - MCCB 3P 50AF/ 50AT P 2 P-1
 - MCCB 3P 225AF/175AT P 3 MA-11
 - MCCB 3P 225AF/125AT P 4 MB-11
 - MCCB 3P 50AF/ 50AT P 5 LME-11
 - MCCB 3P 100AF/100AT P 6 管理棟(校長室・事務室・応接室)
 - MCCB 3P 225AF/200AT P 7 消火ポンプ
 - MCCB 3P 225AF/125AT P 8 管理棟空調機
 - MCCB 3P 225AF/125AT P 9 管理棟空調機
 - MCCB 3P 225AF/125AT P10 特別教室棟空調機
 - MCCB 3P 225AF/125AT P11 教室棟空調機(南校舎)
 - MCCB 3P 225AF/175AT P12 教室棟空調機(南校舎)
 - MCCB 3P 100AF/100AT 予備


- 空調機盤
- MCCB 3P 225AF/150AT P14 特別教室棟
 - MCCB 3P 225AF/200AT P15 体育館棟

空調動力幹線系統図

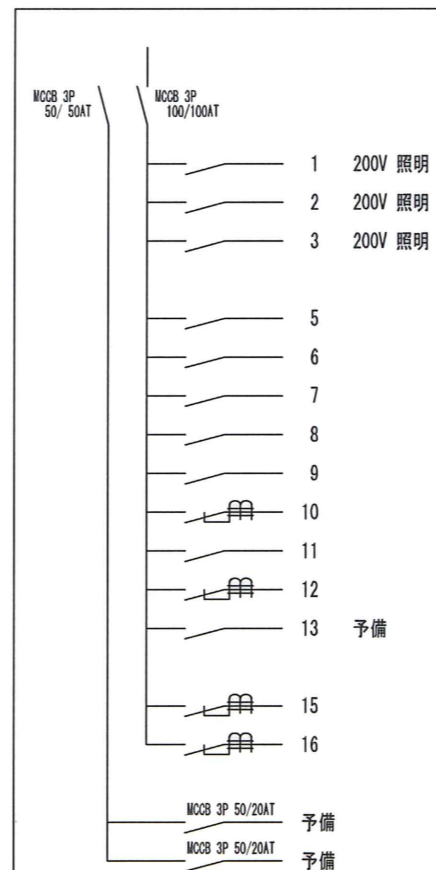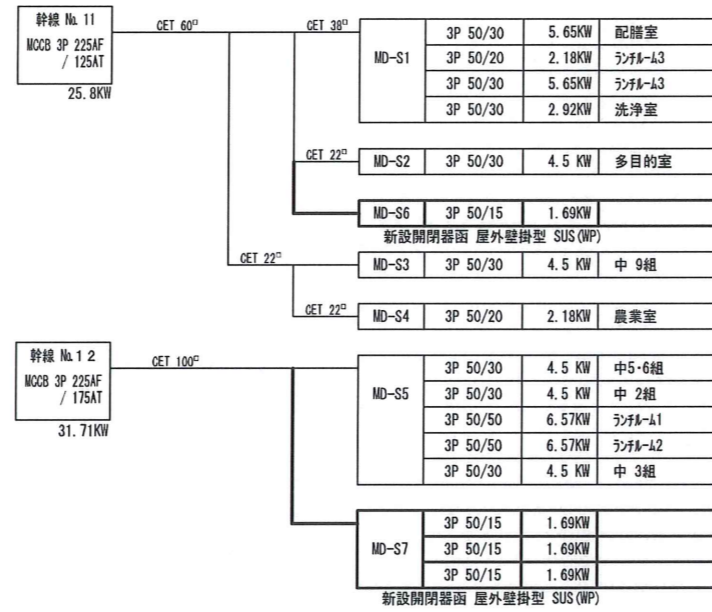


- 電灯分岐
- MCCB 2P (2E) 50/20AT x 3
 - MCCB 1P 50/20AT x 7
 - ELCB 2P (1E) 50/20AT (30mA) x 4
- 現状のまま (予備回路活用)

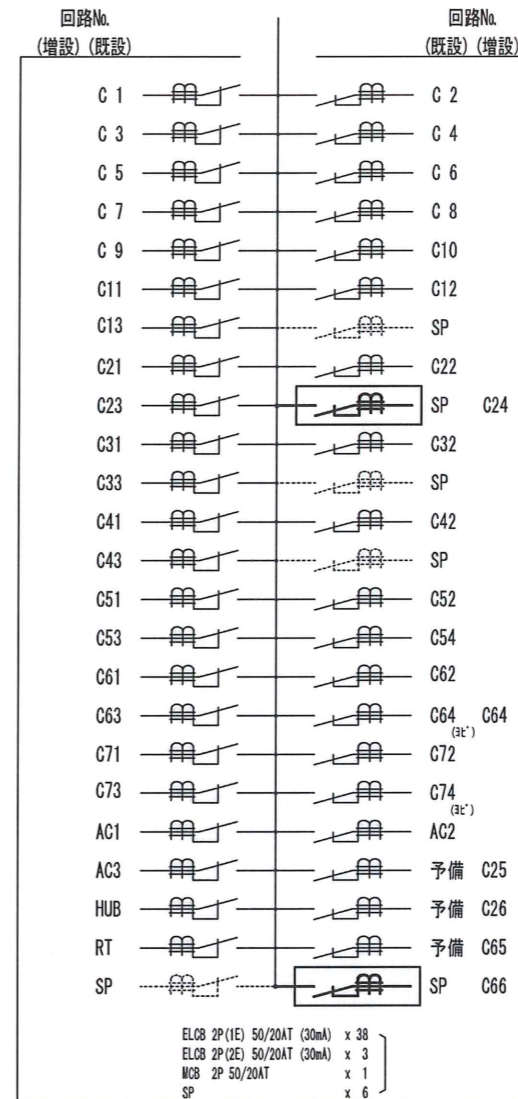






電灯盤増設改修表

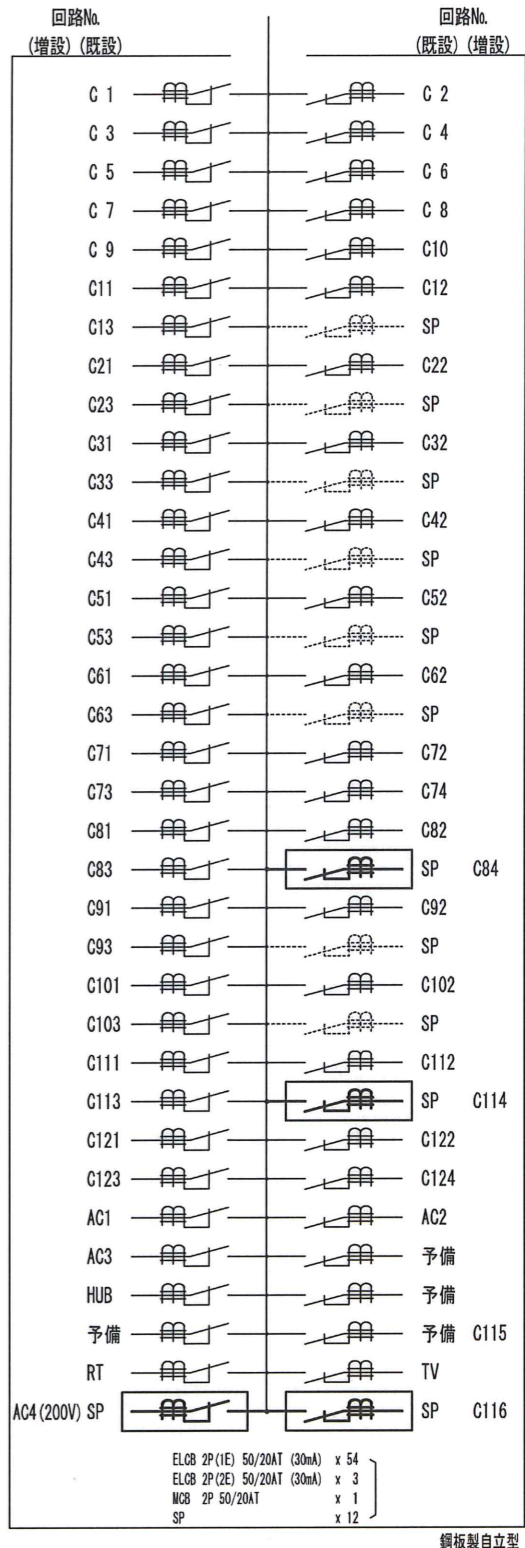



ELCB 2P (1E) 50/20AT (30mA) x 2 増設



ELCB 2P (1E) 50/20AT (30mA) x 3 増設
ELCB 2P (2E) 50/20AT (30mA) x 1


<p>C iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W230 単体 一般タイプ、4000lmタイプ</p>  <p>消費電力25W、定格出力型、電圧100~242V 電源装置はライトバー側に内蔵、約10~100%連続調光型 本体：鋼板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>	<p>F iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 一般タイプ、6900lmタイプ</p>  <p>消費電力43.1W、定格出力型、電圧100~242V 電源装置はライトバー側に内蔵 本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>	<p>J LEDスクエアベースライト 埋込型 下面開放型 □450 スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、4500lmタイプ</p>  <p>消費電力31.9W、電圧100~242V 調光タイプ（約10~100%） 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） 点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>	<p>M iDシリーズ直付型40形 黑板灯 集光プリズムタイプ・一般タイプ、3200lmタイプ</p>  <p>消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 電源装置はライトバー側に内蔵 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>
<p>O iDシリーズ埋込型40形 黑板灯 集光プリズムタイプ・一般タイプ、3200lmタイプ</p>  <p>消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 電源装置はライトバー側に内蔵 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>	<p>P iDシリーズ埋込型40形 黑板灯 集光プリズムタイプ・一般タイプ、2500lmタイプ</p>  <p>消費電力16.3W、定格出力型、電圧100~242V 電源装置はライトバー側に内蔵 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>	<p>R iDシリーズ埋込型40形 黑板灯 集光プリズムタイプ・一般タイプ、3200lmタイプ</p>  <p>消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 電源装置はライトバー側に内蔵 本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83</p>	

壁掛け時計 310φ
SWR30-GPB1

ケース	鋼板 クリーム色
文字板	アルミニウム 白色
文字	黒色
指針	アルミニウム 黒色
風防	ガラス 透明 t2
機体	DC24V 有極30秒遅針



壁掛け型スピーカー
SWIH-3V0



定格入力	3W (3.3kΩ) , 2W (5kΩ) ,
出力音圧レベル	91dB (1W, 1m)
周波数特性	200Hz~18kHz
スピーカー	12cmコーン型
仕上	ケース：樹脂 オフホワイト
その他	



	教室棟(南校舎)										高等部棟								合計
	多目的室	多目的室	中3組	OO組	中2組	OO組	中5・6組	中5・6組	中12・13組	中12・13組	中1-1組	中1-1組	高5組	高5組	高8組	高8組			
C	改修前		12		12		12										36		
	改修(再使用)		6	6	6	6	6										36		
	改修(増設)																		
F	改修前							8		8		8		8			32		
	改修(再使用)							4	4	4	4	4	4	6	2		32		
	改修(増設)																		
J	改修前	12															12		
	改修(再使用)	6	6														12		
	改修(増設)																		
M	改修前														2		2		
	改修(再使用)														2		2		
	改修(増設)																		
O	改修前									2		2		2			8		
	改修(再使用)									2		2		2			8		
	改修(増設)																		
P	改修前	2															2		
	改修(再使用)	2															2		
	改修(増設)																		
R	改修前			2		2		2		2		2		2			6		
	改修(再使用)			2		2		2		2		2		2			6		
	改修(増設)																		
部屋計	改修前	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	96		
	改修(再使用)	8	6	8	6	8	6	6	4	6	4	6	4	8	4	4	98		
	改修(増設)	2		2		2		2		2		2		2			14		
+	改修前	1		1		1		1		1		1		1			8		
	改修(再使用)	1		1		1		1		1		1		1			8		
	改修(増設)																		
⊖	改修前	1		1		1		1		1		1		1			8		
	改修(再使用)	1		1		1		1		1		1		1			8		
	改修(増設)																		

※支給品（一工区撤去品再使用）
（取付前に使用可能か確認を
すること）

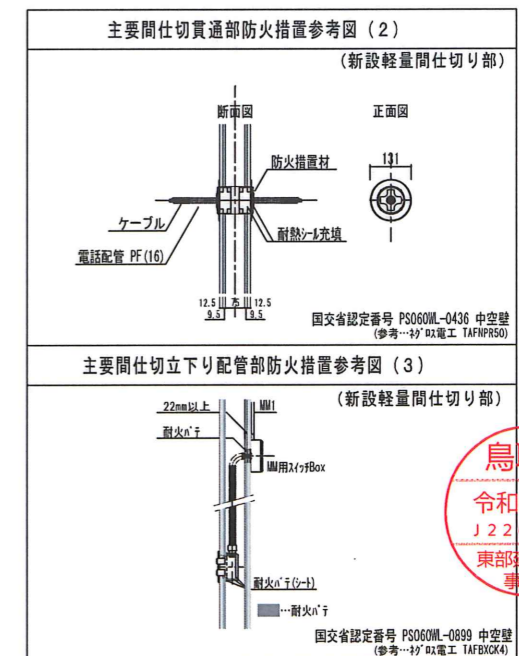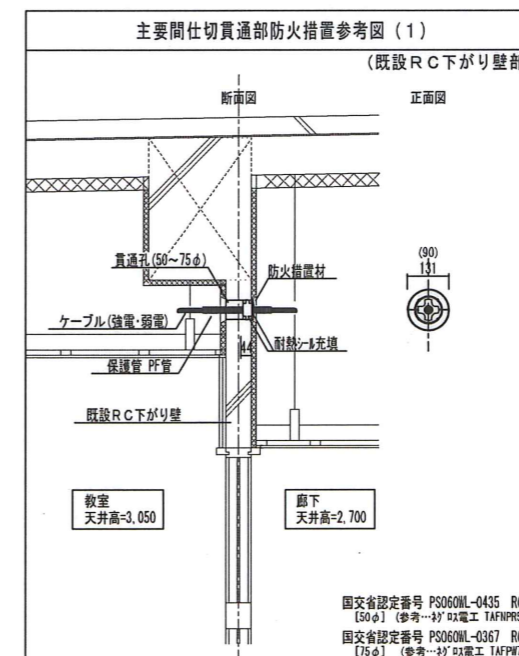

※ 新設軽量間仕切り（主要間仕切り）に設ける埋込ボックスは、
全て耐火処理（耐火パテシート等）を行うこと。

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

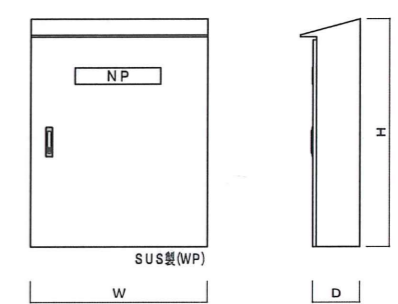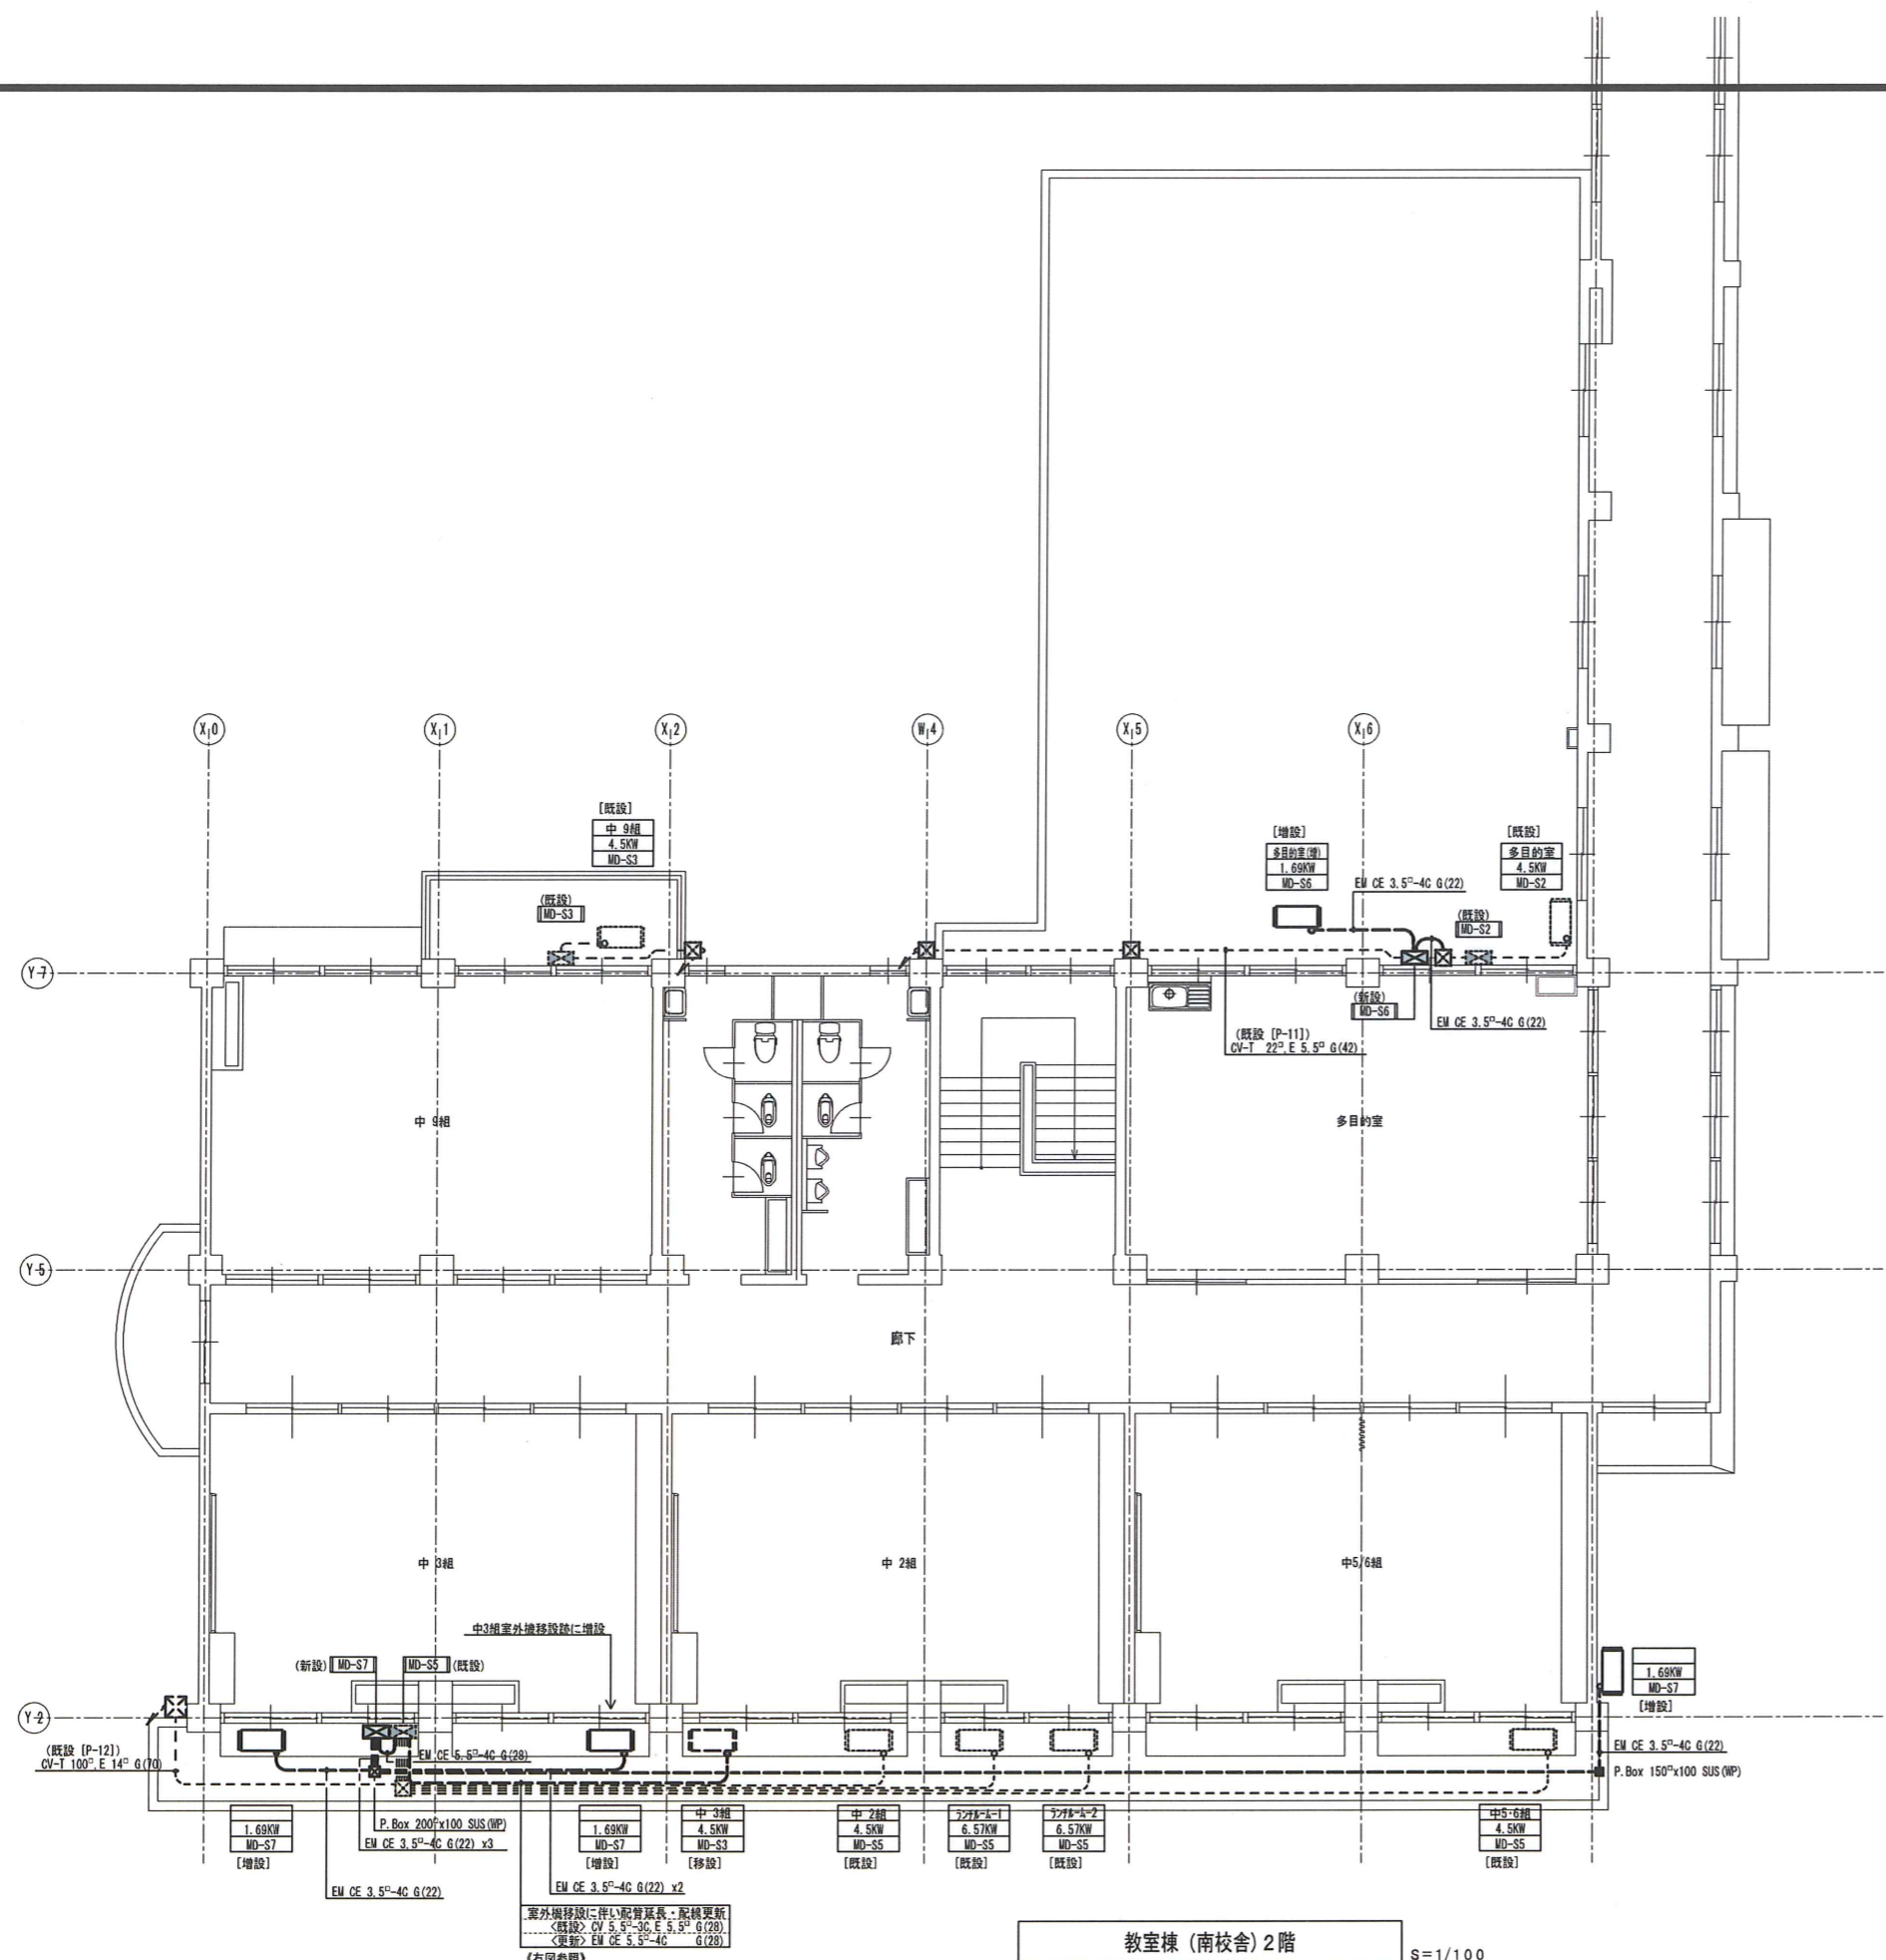

(参考寸法)


盤名称	W (mm)	H (mm)	D (mm)	備考
MD-S6	400	450	160	屋外壁掛型
MD-S7	500	450	160	屋外壁掛型

手元開閉器盤参考姿図

新設開閉器盤 幹線分岐


MD-S6 … 既設 MD-S2盤送り幹線ブルボックスより直接分岐する。
(既設幹線 [P-11] CV-T 22^o, E 5.5^o)

MD-S7 … 既設 MD-S5盤電源側から分岐する。(MD-S5は主開閉器無し)
(既設幹線 [P-12] CV-T 100^o, E 14^o)

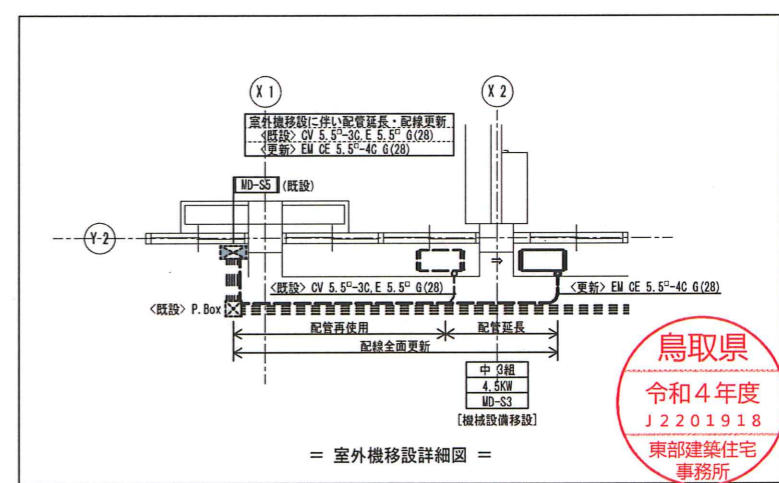


鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

教室棟 (南校舎) 2階 S=1/100

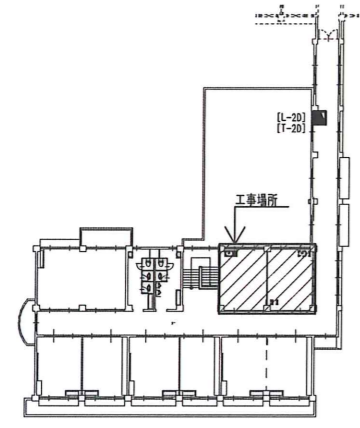

2階 平面図

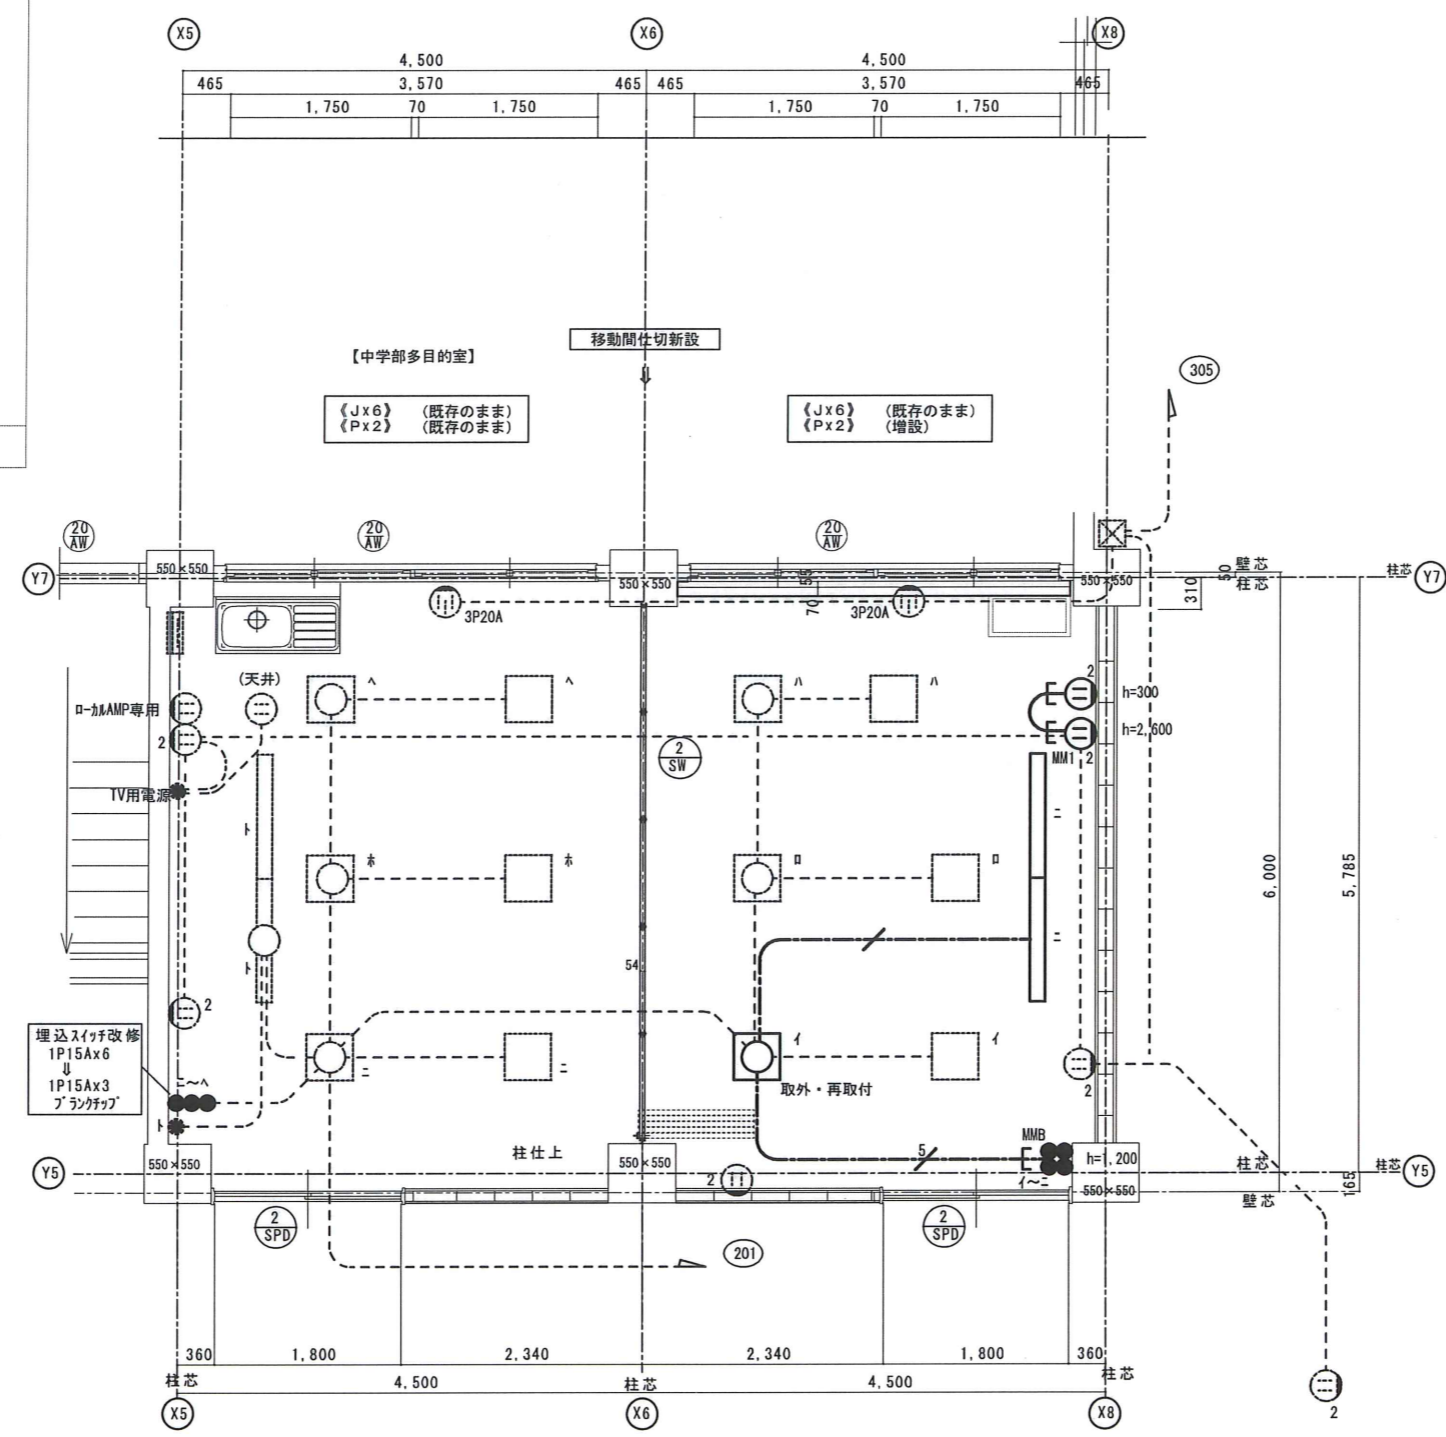

教室棟 (南校舎) 2階平面図 S=1/50


凡例 (改修図)

記号	名称・仕様	摘要
----	配管配線 (既存)	
----	配管配線 (更新)	
-E-	メタルモール (引下)	MM1 特記なきはA型
□	LED照明器具	(破線は既設器具)
●	埋込スイッチ	(")
⊖	埋込コンセント	(")
⊖x	埋込抜止コンセント	(")
⊖	埋込コンセント	(")
○	カバープレート	

※ 図中特記なき配線は、下記の通りとする。

---	EM EEF 2.0-2C	天井内隠蔽配線
---	EM EEF 2.0-3C	"
---	EM EEF 2.0-2C x2	"
---	EM EEF 2.0-2C+EEF 2.0-3C	"
---	EM EEF 2.0-3C x2	"

◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

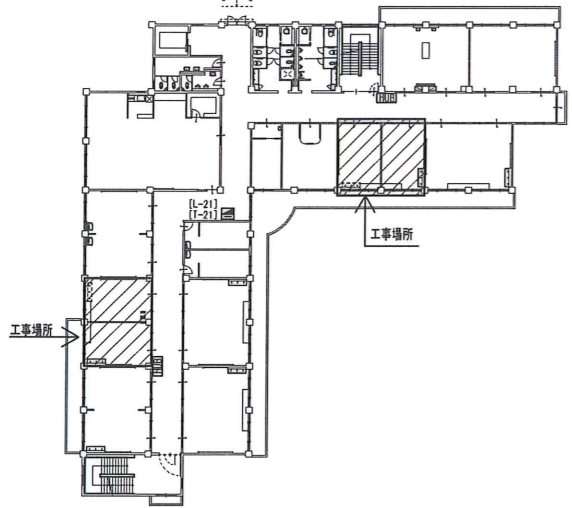

2階 平面図

凡例 (改修図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線 (既存)	
---	配管配線 (更新)	
-E-	メタルモール (引下)	MM1 特記なきはA型
○	LED照明器具	(破線は既設器具)
●	埋込スイッチ	(")
⊖	埋込コンセント	(")
⊖x	埋込抜きコンセント	(")
⊖	埋込コンセント	(")
○	カバープレート	
●24H	24h換気扇	(機械設備より支給)


※ 図中特記なき配線は、下記の通りとする。

- EM EEF 2.0-2C 天井内隠蔽配線
- EM EEF 2.0-3C " "
- EM EEF 2.0-2C x2 " "
- EM EEF 2.0-2C+EEF 2.0-3C " "
- EM EEF 2.0-3C x2 " "


天井下り壁コア抜き (鉄筋探索機) 貫通孔サイズは傍記による。貫通箇所には区画処理(1時間耐火)を行う。

新設主要間仕切り配管立上部 耐火処理


◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

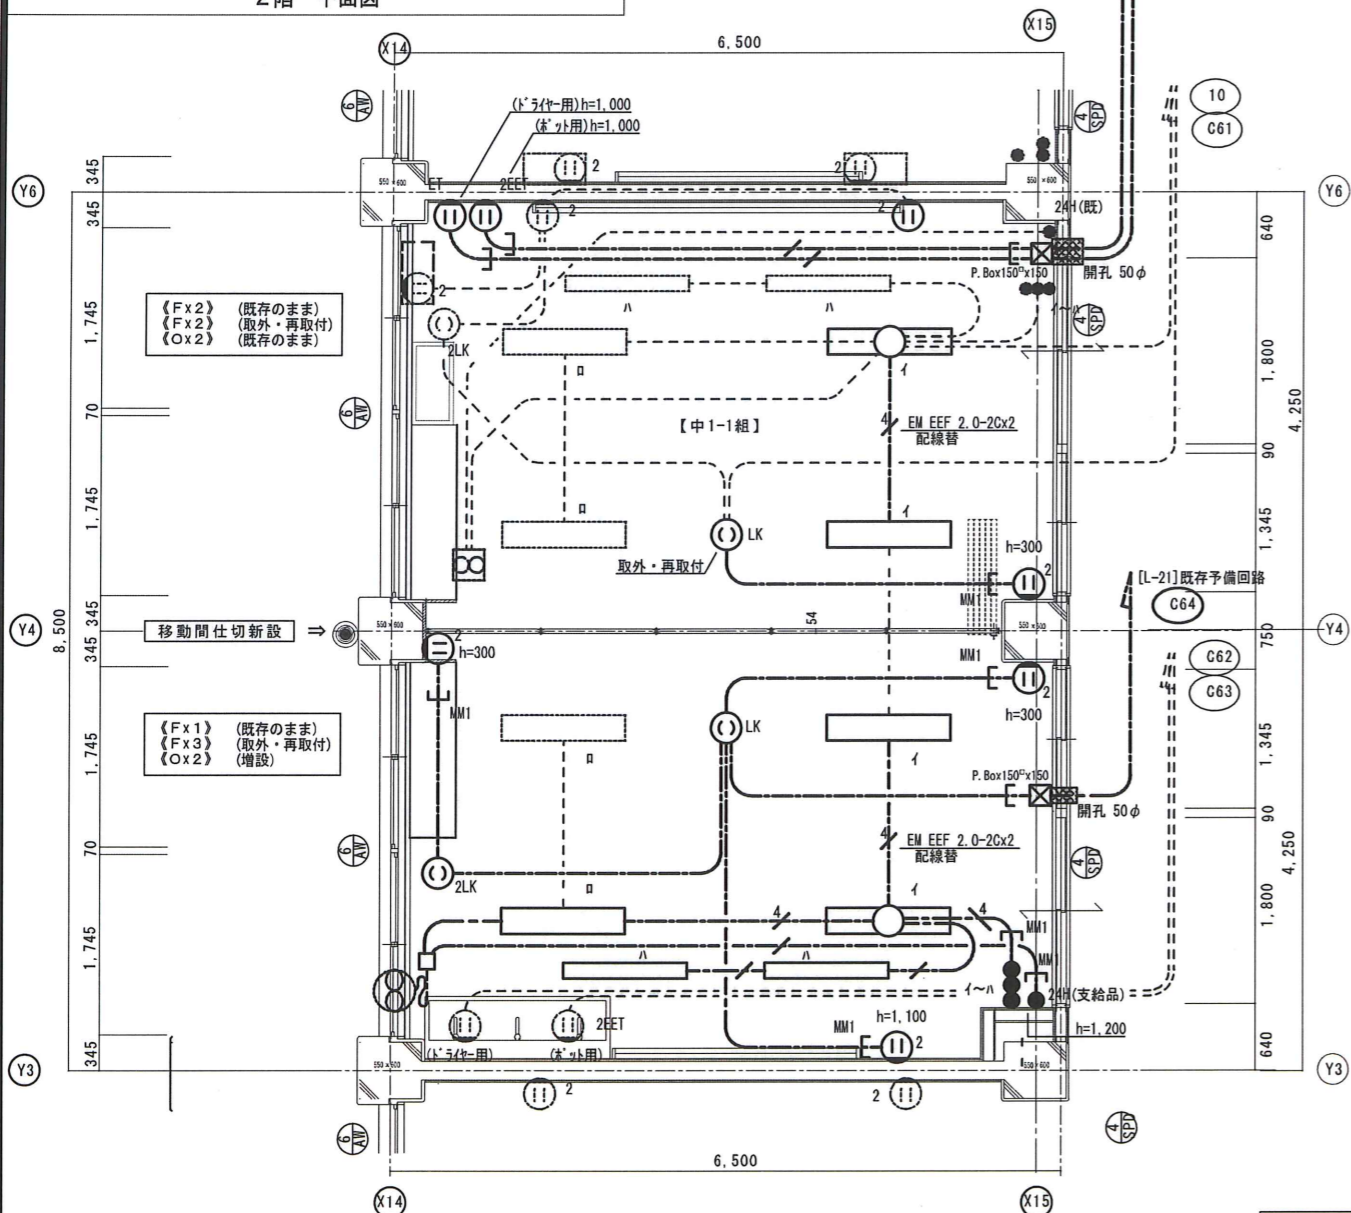

高等部棟 2階平面図 S=1/50

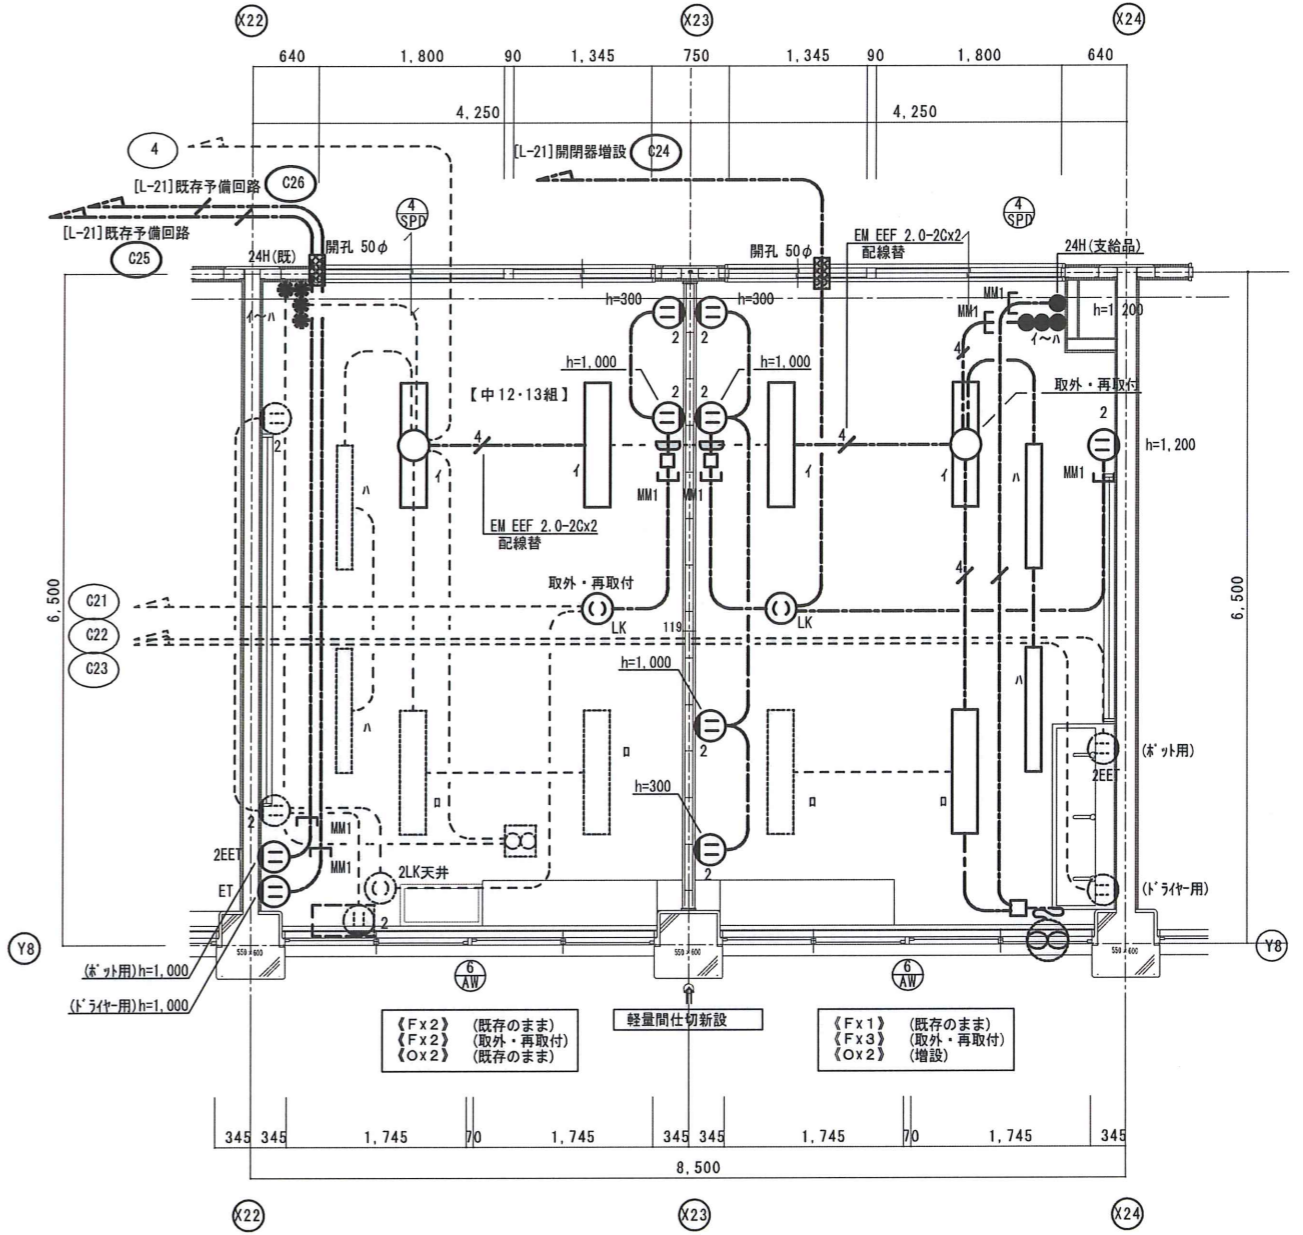

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
吉田	三原	22-15	2023.04	S=1/50	E-13

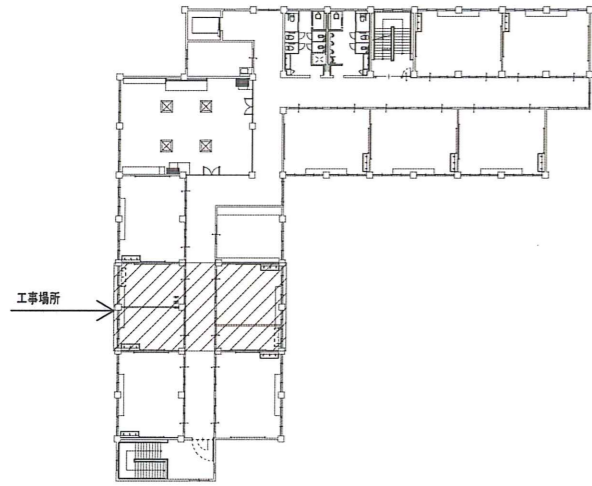

3階 平面図

凡例 (改修図)


記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線 (既存)	
---	配管配線 (更新)	
—E—	メタルモール	■ 特記なきはA型
○	LED照明器具	(破線は既設器具)
●	埋込スイッチ	(")
⊕	埋込コンセント	(")
⊖	埋込コンセント	(")
○	カバープレート	
●24H	24h換気扇1台	(機械設備より支給)

※ 図中特記なき配線は、下記の通りとする。

- EM EEF 2.0-20 天井内隠蔽配線
- EM EEF 2.0-30 " "
- EM EEF 2.0-20 x2 " "
- EM EEF 2.0-20+EEF 2.0-30 " "
- EM EEF 2.0-30 x2 " "


- ⊗ ... 天井内下り壁コア抜き (鉄筋探査共)
貫通孔サイズは傍記による。
貫通箇所には区画処理(時間耐火)を行う。
- ... 新設主要間仕切り配管立上部 耐火処理

◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

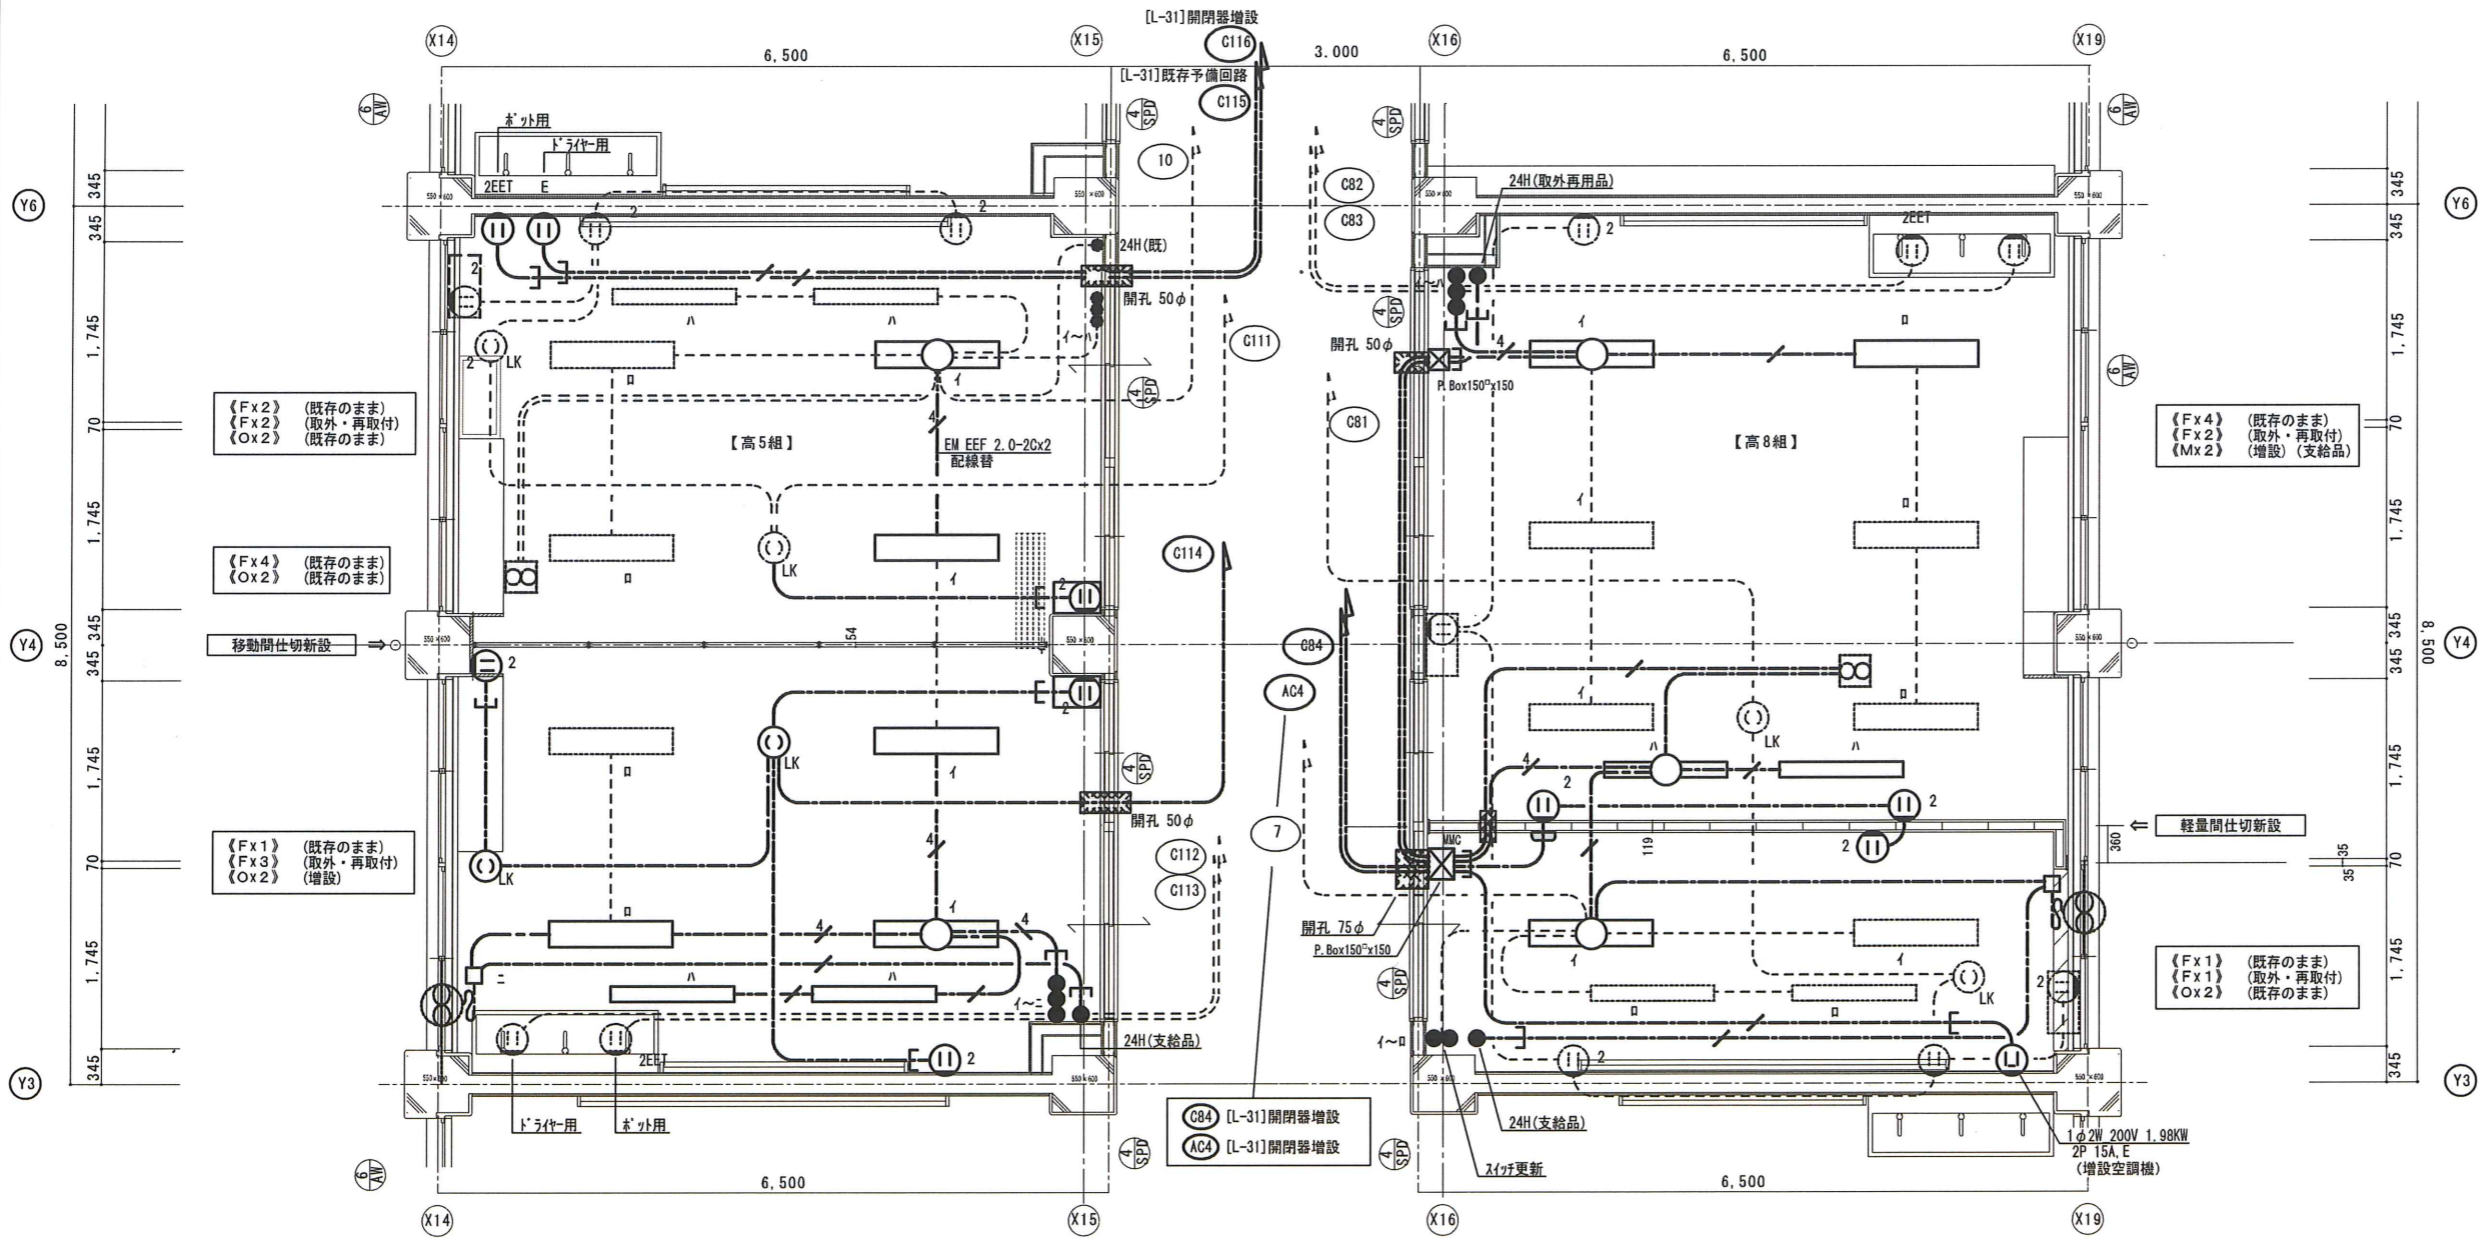


高等部棟 3階平面図

S=1/50

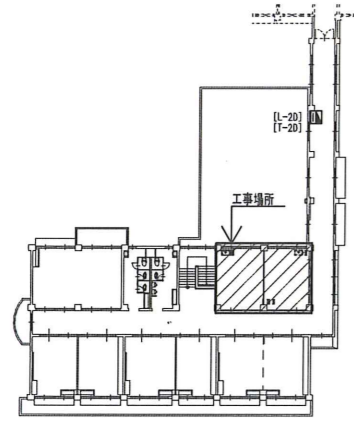

2階 平面図

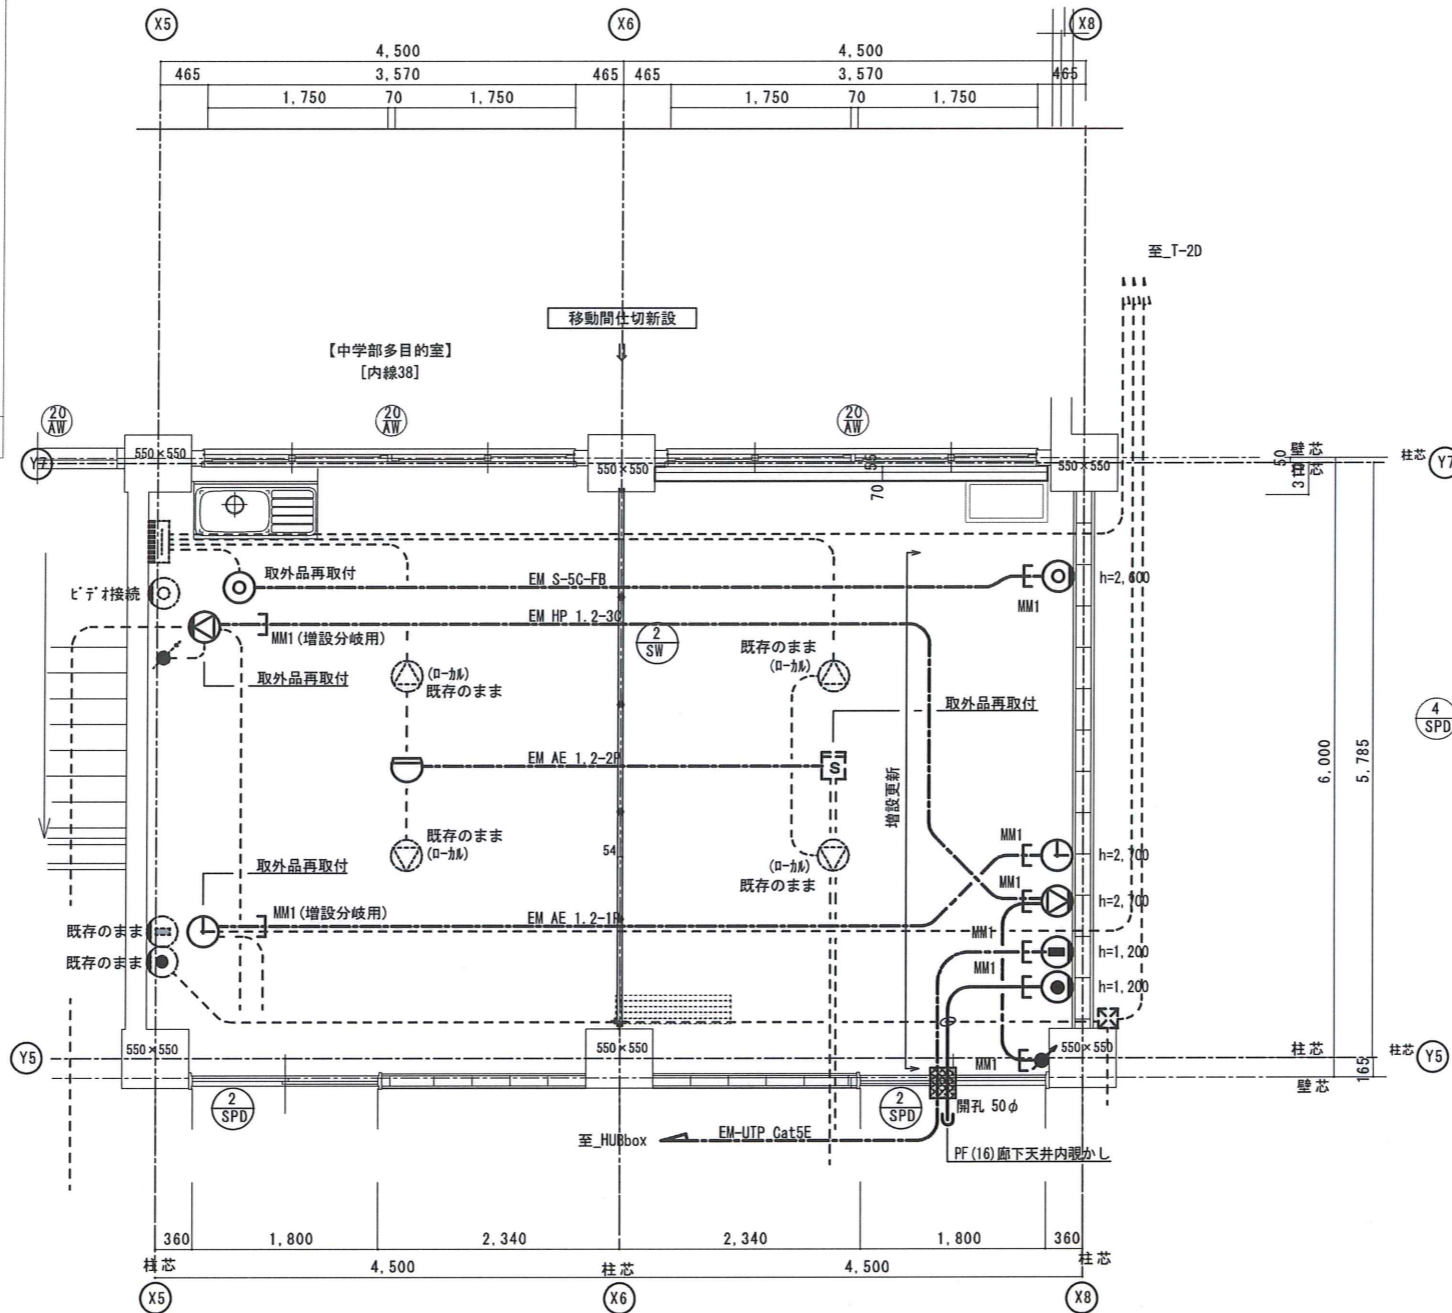

凡例 (改修図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線 (既存)	
---	配管配線 (更新)	
E	メタルモール (立下)	MM1 特記なきはA型
○	配管 (空配管)	
○	子時計	(破線は既設器具)
⊙	スピーカー	(")
⊙	情報コンセント (加'プレート)	(機器別途 破線は既設)
⊙	TV端子 (CS-7F-WE)	(破線は既設器具)
○	センサー	(")
○	カバープレート	
⊙	電話 (加'プレート)	(配線・機器別途 破線は既設)

※ 図中特記なき配管・配線は、下記の通りとする。

子時計設備	EM AE 1.2-1P	天井内隠蔽配線
放送設備	EM HP 1.2-3C	"
情報設備	EM-UTP Cat5E	"
TV共聴設備	EM S-5C-FB	"
自火報設備	EM AE 1.2-2P	"
電話設備	PF (16)	廊下天井内に覗かし (室内立下は[MM1]とする)

⊙ ... 天井内下り壁コア抜き (鉄筋探索共)
貫通孔サイズは傍記による。
貫通箇所には区画処理 (1時間耐火) を行う。

◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

- ⊙ 取外品再取付 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 取外品再取付 (MM1_スリ付BOX要)
- 既存のまま
- ⊙ 既存のまま
- ⊙ 取外品再取付
- 既存のまま
- ⊙ 増設
- ⊙ 増設 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 増設 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 増設 (配管のみ) (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 増設 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 増設 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 増設 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 増設 (MM1_スリ付BOX要)
- ⊙ 取外品再取付

教室棟 (南校舎) 2階平面図

S=1/50



凡例 (改修図)


記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線 (既存)	
---	配管配線 (更新)	
-E-	メタルモール (立下)	MM1 特記なきはA型
○	配管 (空配管)	
○	子時計	(破線は既設器具)
○	スピーカー	(")
○	情報コンセント (カバープレート)	(機器別途 破線は既設)
○	T V端子 (CS-7F-WE)	(破線は既設器具)
○	感知器	(")
○	カバープレート	
○	電話 (カバープレート)	(配機・機器別途 破線は既設)

※ 図中特記なき配管・配線は、下記の通りとする。

子時計設備	EM AE 1.2-1P	天井内隠蔽配線
放送設備	EM HP 1.2-3C	"
情報設備	EM-UTP Cat5E	"
T V共聴設備	EM S-5C-FB	"
自火報設備	EM AE 1.2-2P	"
電話設備	PF (16)	廊下天井内に覗かし (室内立下は[MM1]とする)


■■■■■ ... 天井内下り壁コア抜き (鉄筋探査共)
 貫通孔サイズは傍記による。
 貫通箇所には区画処理 (1時間耐火) を行う。
 □ ... 新設主要間仕切り配管立上部 耐火処理

◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

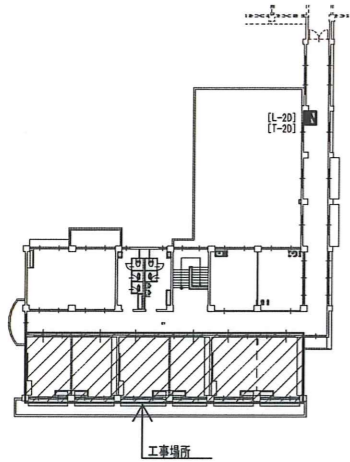

2階 平面図

配線 "B"
 EM S-5C-FB
 EM AE 1.2-1P
 EM HP 1.2-3C

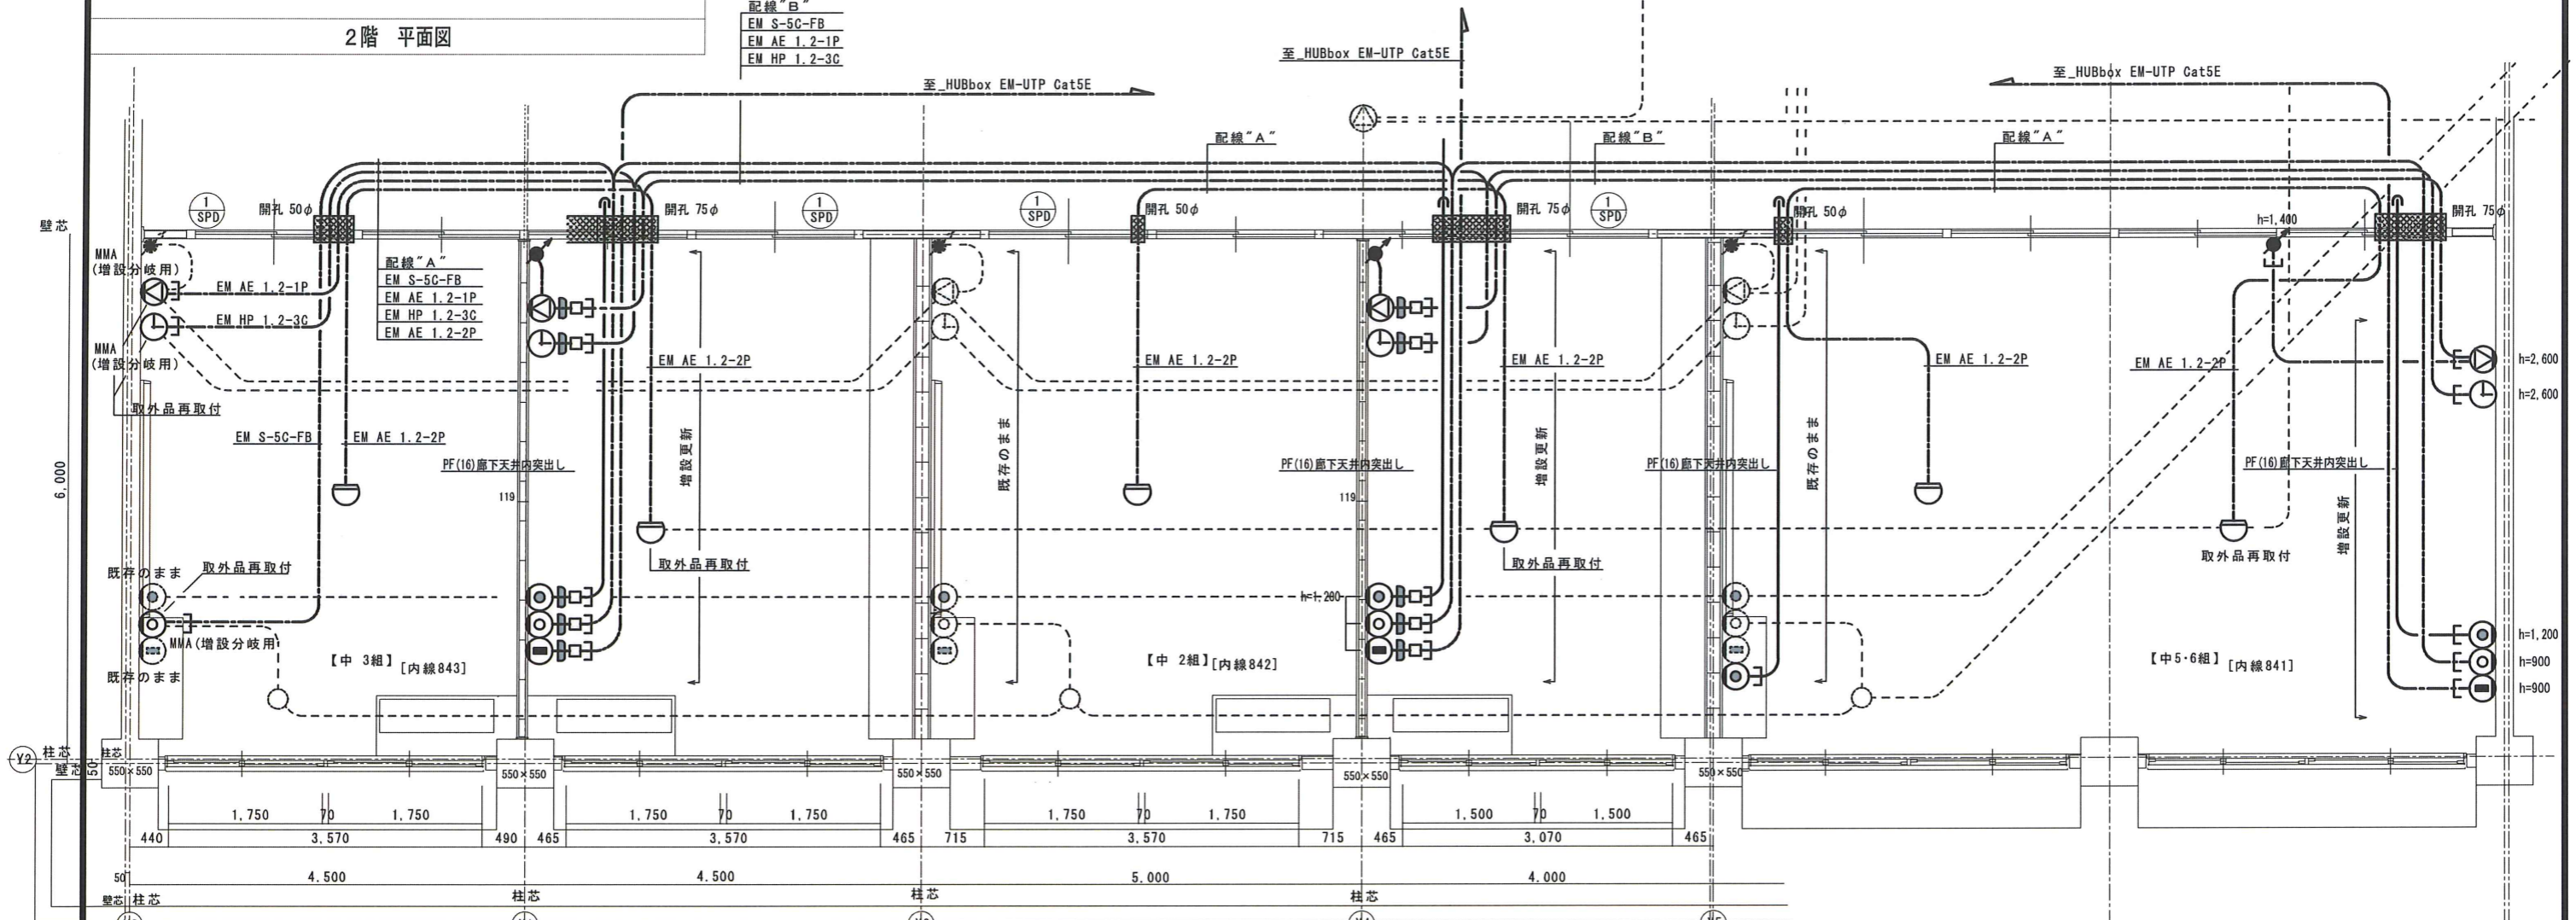


- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 取外品再取付 (MM1_スイッチBOX要) ○ 取外品再取付 (MM1_スイッチBOX要) ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 取外品再取付 (MM1_スイッチBOX要) ○ 既存のまま ○ 増設 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (配管のみ) (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 ○ 取外・再取付 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 増設 ○ 増設 ○ 取外品再取付 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (配管のみ) (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 ○ 取外品再取付 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 既存のまま ○ 増設 ○ 増設 ○ 増設 (更新) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (配管のみ) (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 増設 (MM1_スイッチBOX要) ○ 取外品再取付 |
|--|---|--|---|---|--|

教室棟 (南校舎) 2階平面図 S=1/50

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
宗	青	22-15	2023.04	S=1/50	E-16



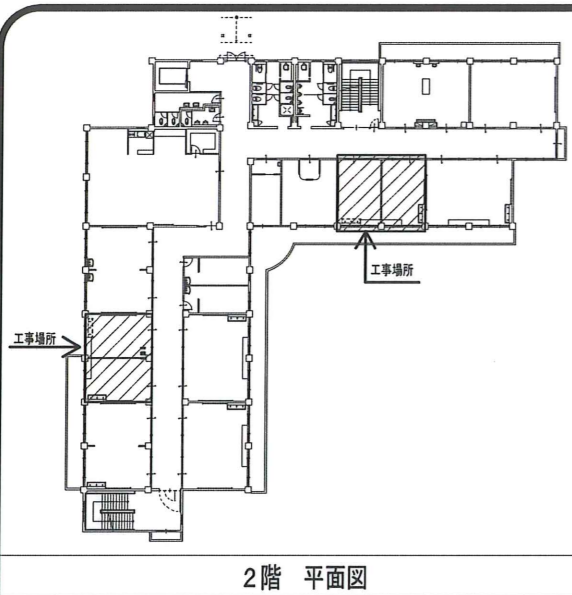

2階 平面図

凡例 (改修図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線 (既存)	
---	配管配線 (更新)	
-E-	メタルモール (立下)	MM1 特記なきはA型
○	配管 (空配管)	
⌚	子時計	(破線は既設器具)
🔊	スピーカー	(")
Ⓜ	情報コネクタ (加フプレート)	(機器別途 破線は既設)
Ⓜ	T V端子 (CS-7F-WE)	(破線は既設器具)
📡	感知器	(")
○	カバープレート	
Ⓜ	電話 (加フプレート)	(配線・機器別途 破線は既設)

※ 図中特記なき配管・配線は、下記の通りとする。



子時計設備	EM AE 1.2-1P	天井内隠蔽配線
放送設備	EM HP 1.2-3C	"
情報設備	EM-UTP Cat5E	"
T V共聴設備	EM S-5C-FB	"
自火報設備	EM AE 1.2-2P	"

電話設備 ○ PF (16) 廊下天井内に隠し (室内立下は【MM1】とする)

Ⓜ 天井内下り壁コア抜き (鉄筋探索共) 貫通孔サイズは傍記による。貫通箇所には区画処理(1時間耐火)を行う。


Ⓜ 新設主要間仕切り配管立上部 耐火処理

◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

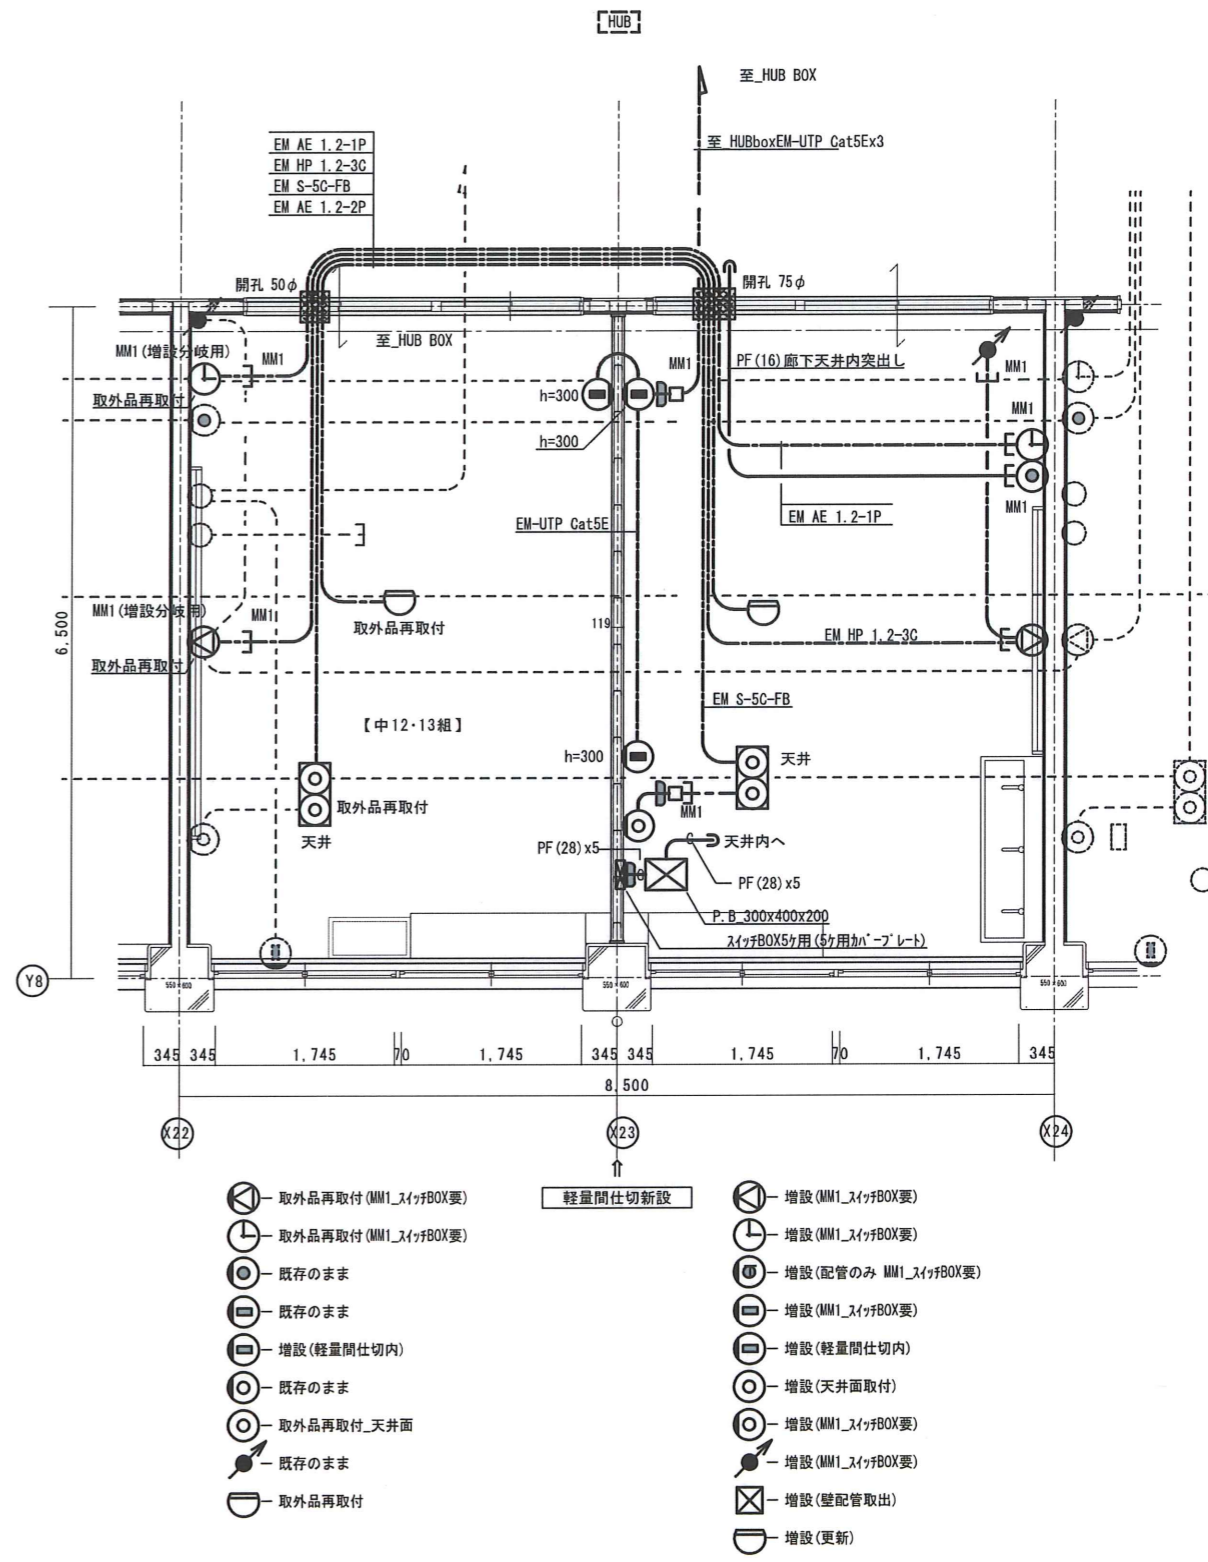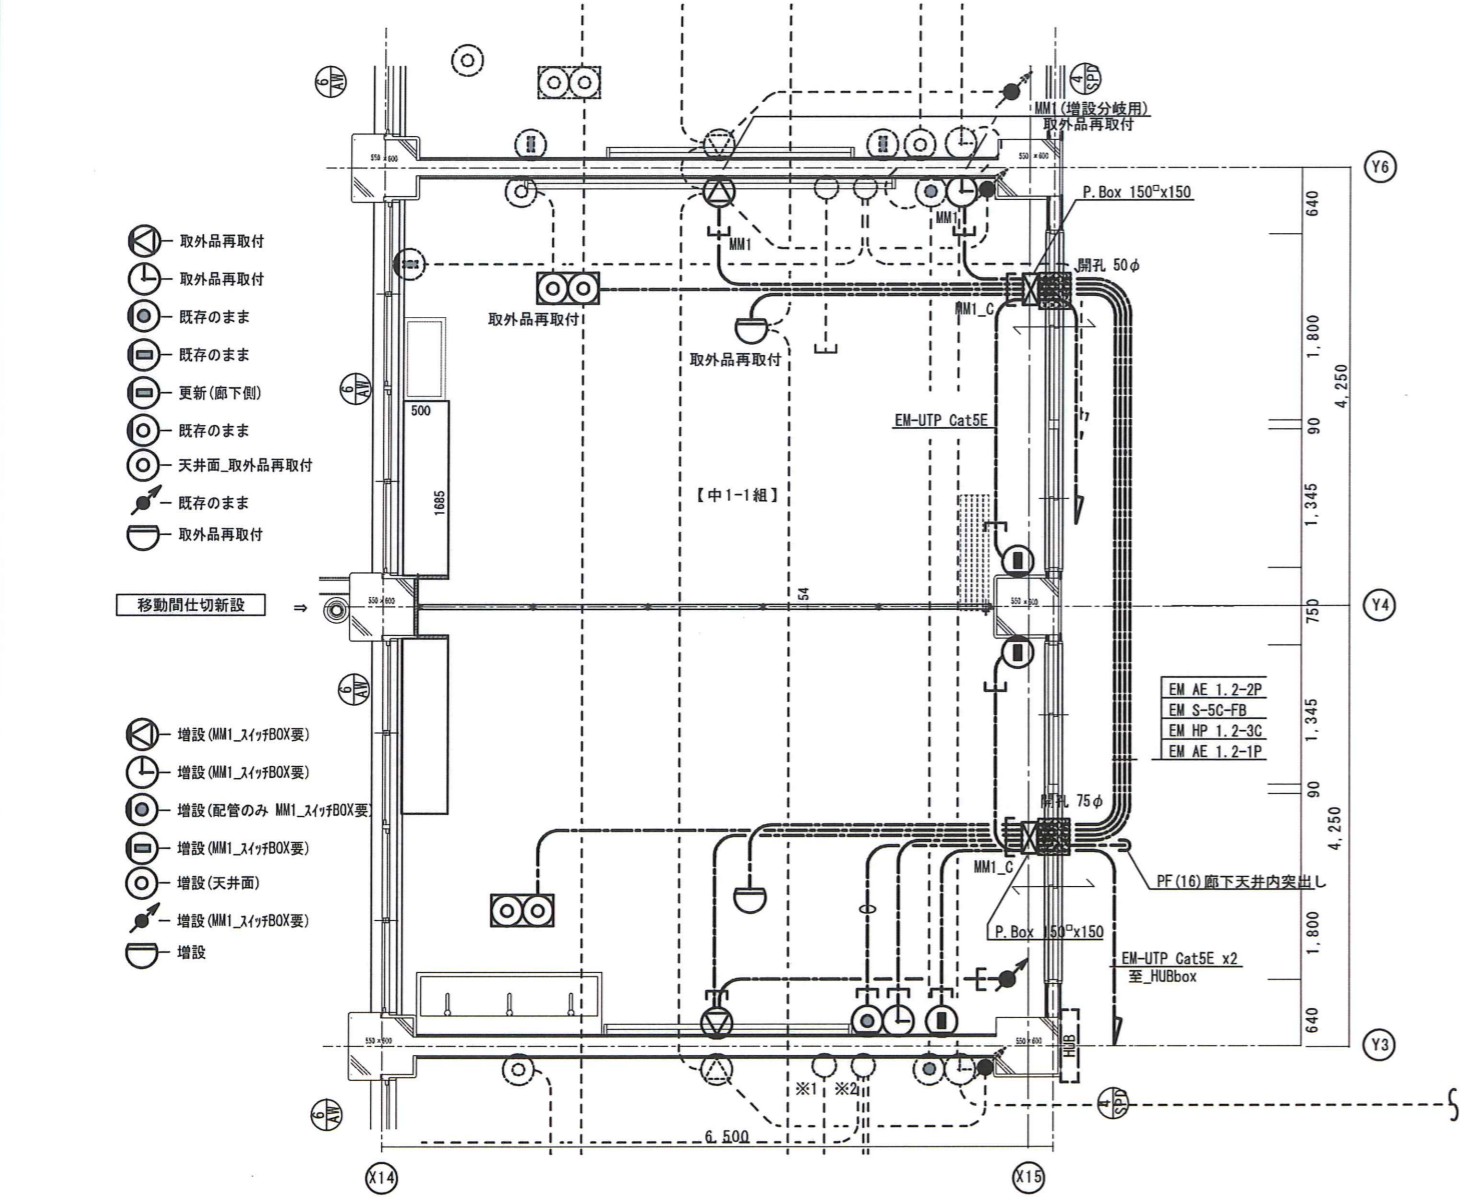

高等部棟 2階平面図 S=1/50

改修図

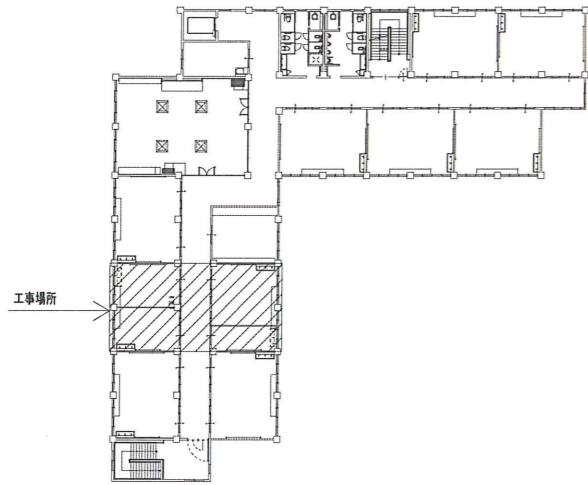

3階 平面図

凡例 (改修図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線 (既存)	
---	配管配線 (更新)	
—E—	メタルモール (立下)	MM1 特記なきはA型
○	配管 (空配管)	
⊕	子時計	(破線は既設器具)
⊙	スピーカー	(")
⊗	情報コンセント (加へプレート)	(機器別途 破線は既設)
⊖	TV端子 (CS-7F-WE)	(破線は既設器具)
⊕	感知器	(")
○	カバープレート	
⊙	電話 (加へプレート)	(配線・機器別途 破線は既設)


※ 図中特記なき配管・配線は、下記の通りとする。

子時計設備	EM AE 1.2-1P	天井内隠蔽配線
放送設備	EM HP 1.2-3C	"
情報設備	EM-UTP Cat5E	"
TV共聴設備	EM S-5C-FB	"
自火報設備	EM AE 1.2-2P	"

電話設備 ○ PF (16) 廊下天井内に隠し (室内立下は【MM1】とする)

- ⊗ ... 天井内下り壁コア抜き (鉄筋探索共) 貫通孔サイズは傍記による。貫通箇所には区画処理 (1時間耐火) を行う。
- ⊖ ... 新設主要間仕切り配管立上部 耐火処理

◎ 新設壁内、立下り箇所等は PF管にて保護をする。

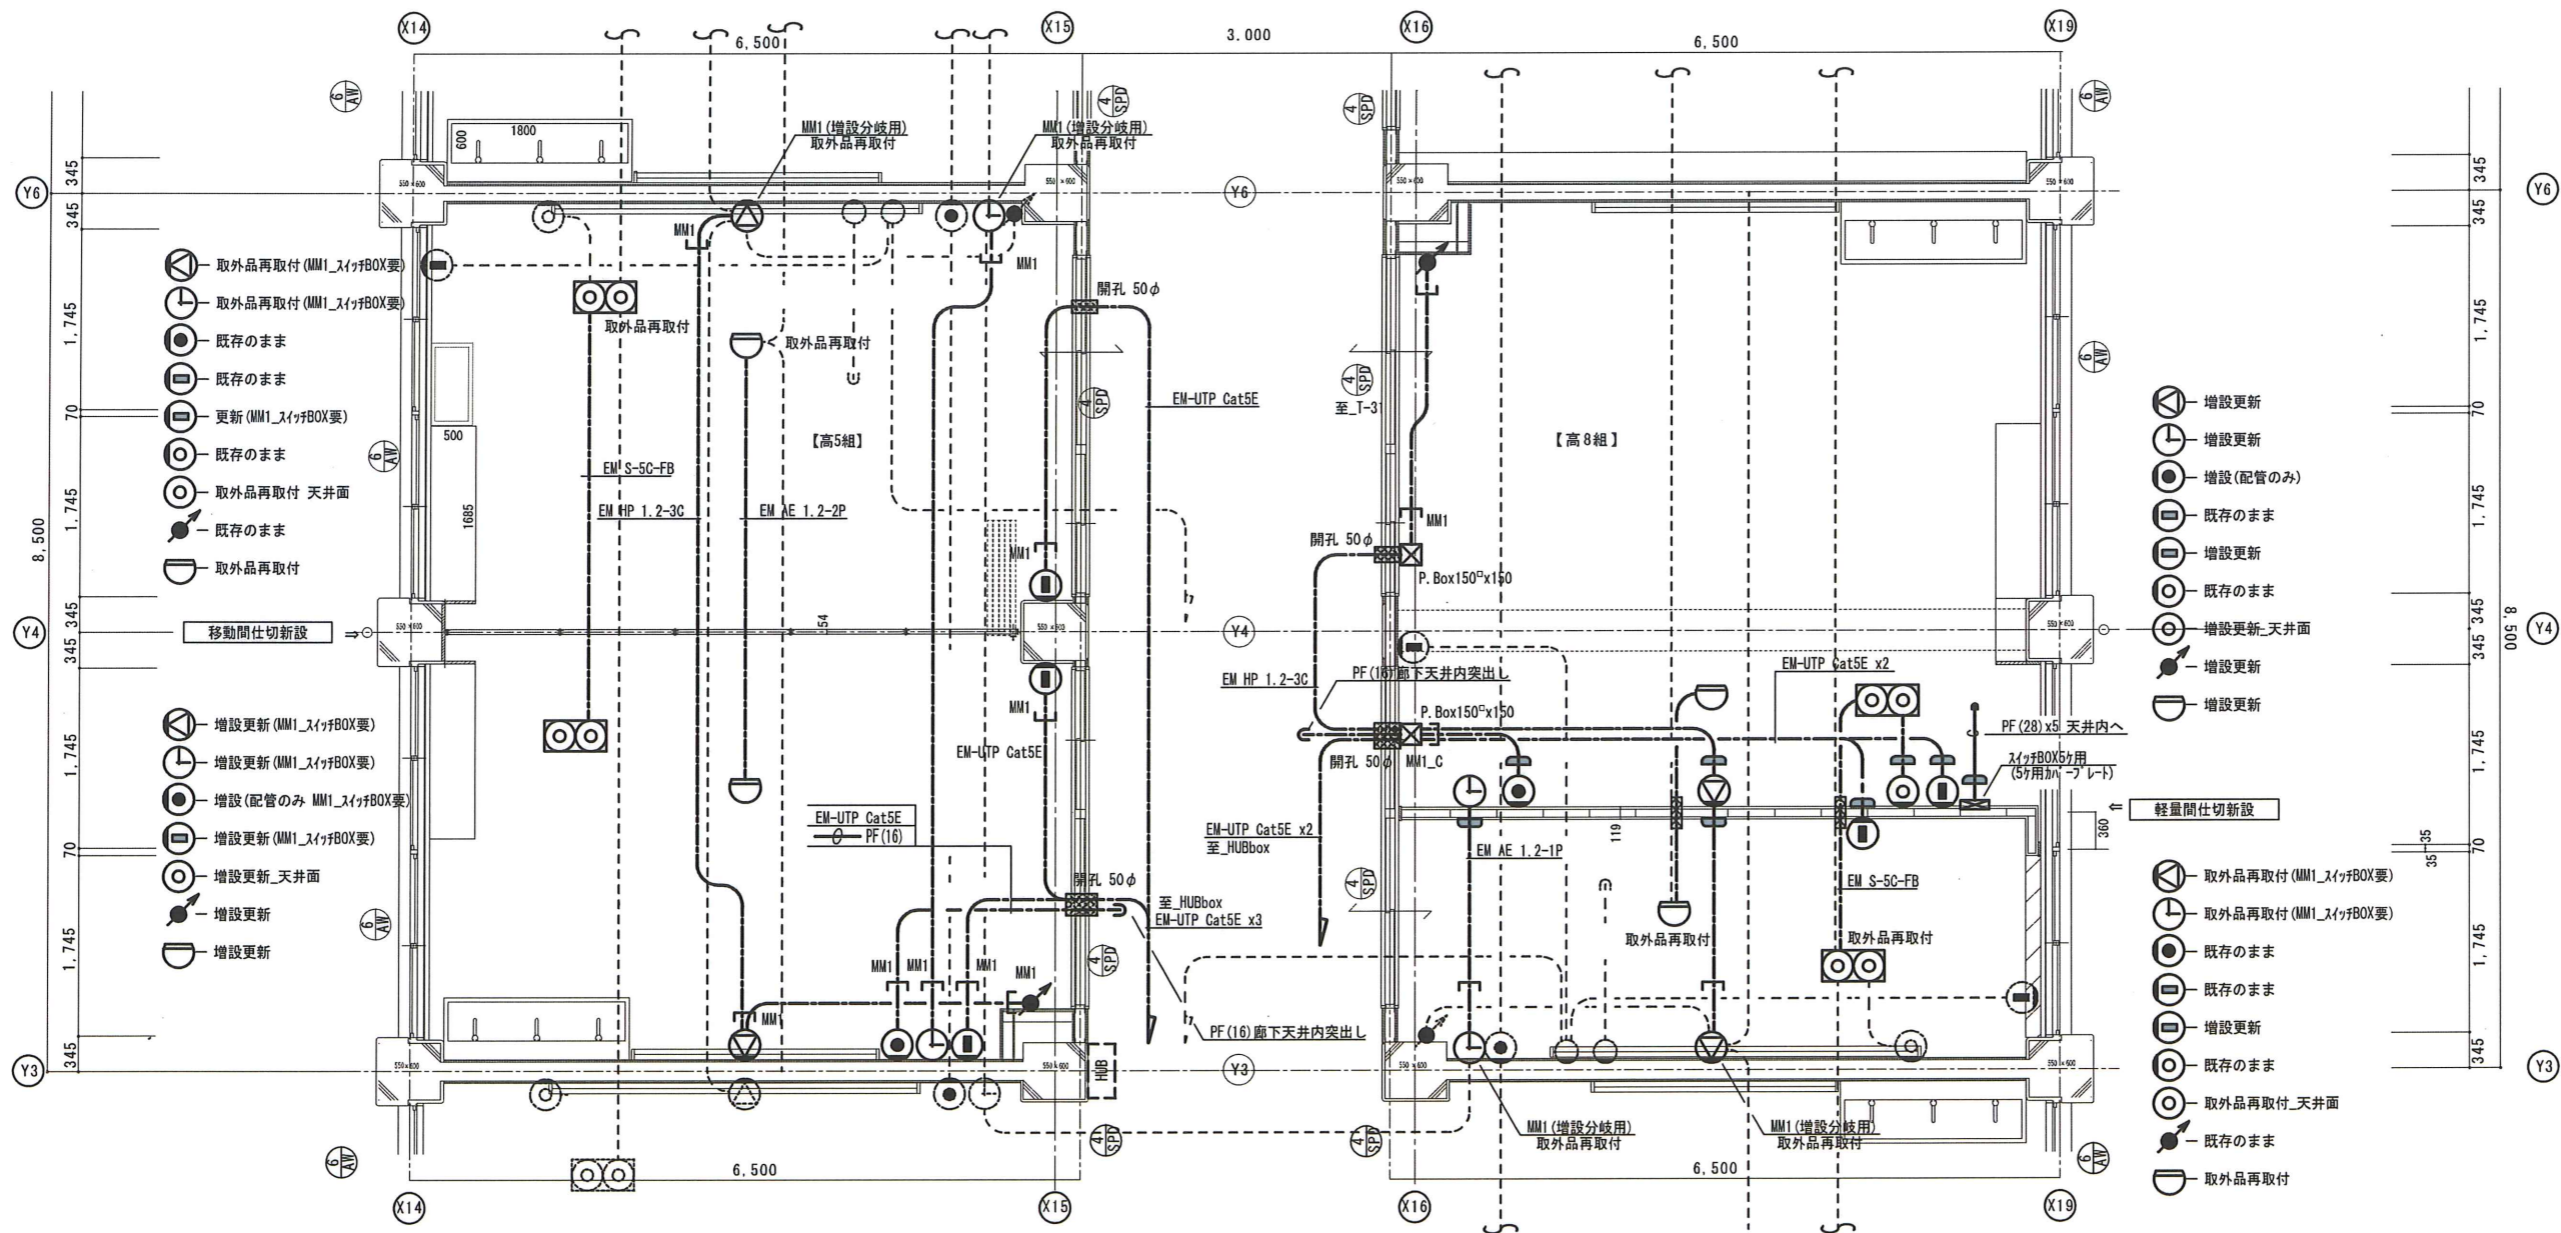

高等部教室棟 3階平面図 S=1/50

県立白兔養護学校教室整備改修工事 (二工区) (電気設備)

電気設備 弱電設備 3階配管配線図

(高等部棟) (改修図)


株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取市扇町14
二級建築士登録番号 第28110号 各本 正殿

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
茶田	三坂	22-15	2023.04	S=1/50	E-18

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

撤去図

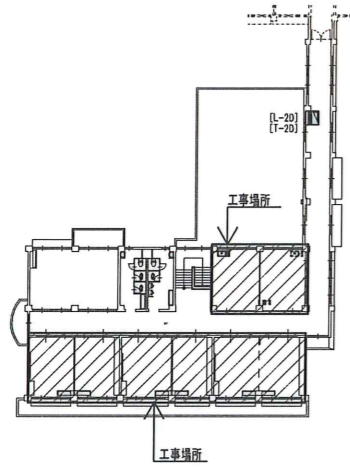


2階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
○	LED照明器具	
●	埋込スイッチ	
⊖	埋込コンセント	
⊖k	埋込抜きコンセント	
○	カバープレート	
／	機器撤去 (取外含む)	
×	配管配線撤去	

※ 特記なき撤去配線は、WF 2.0-2Cとする。

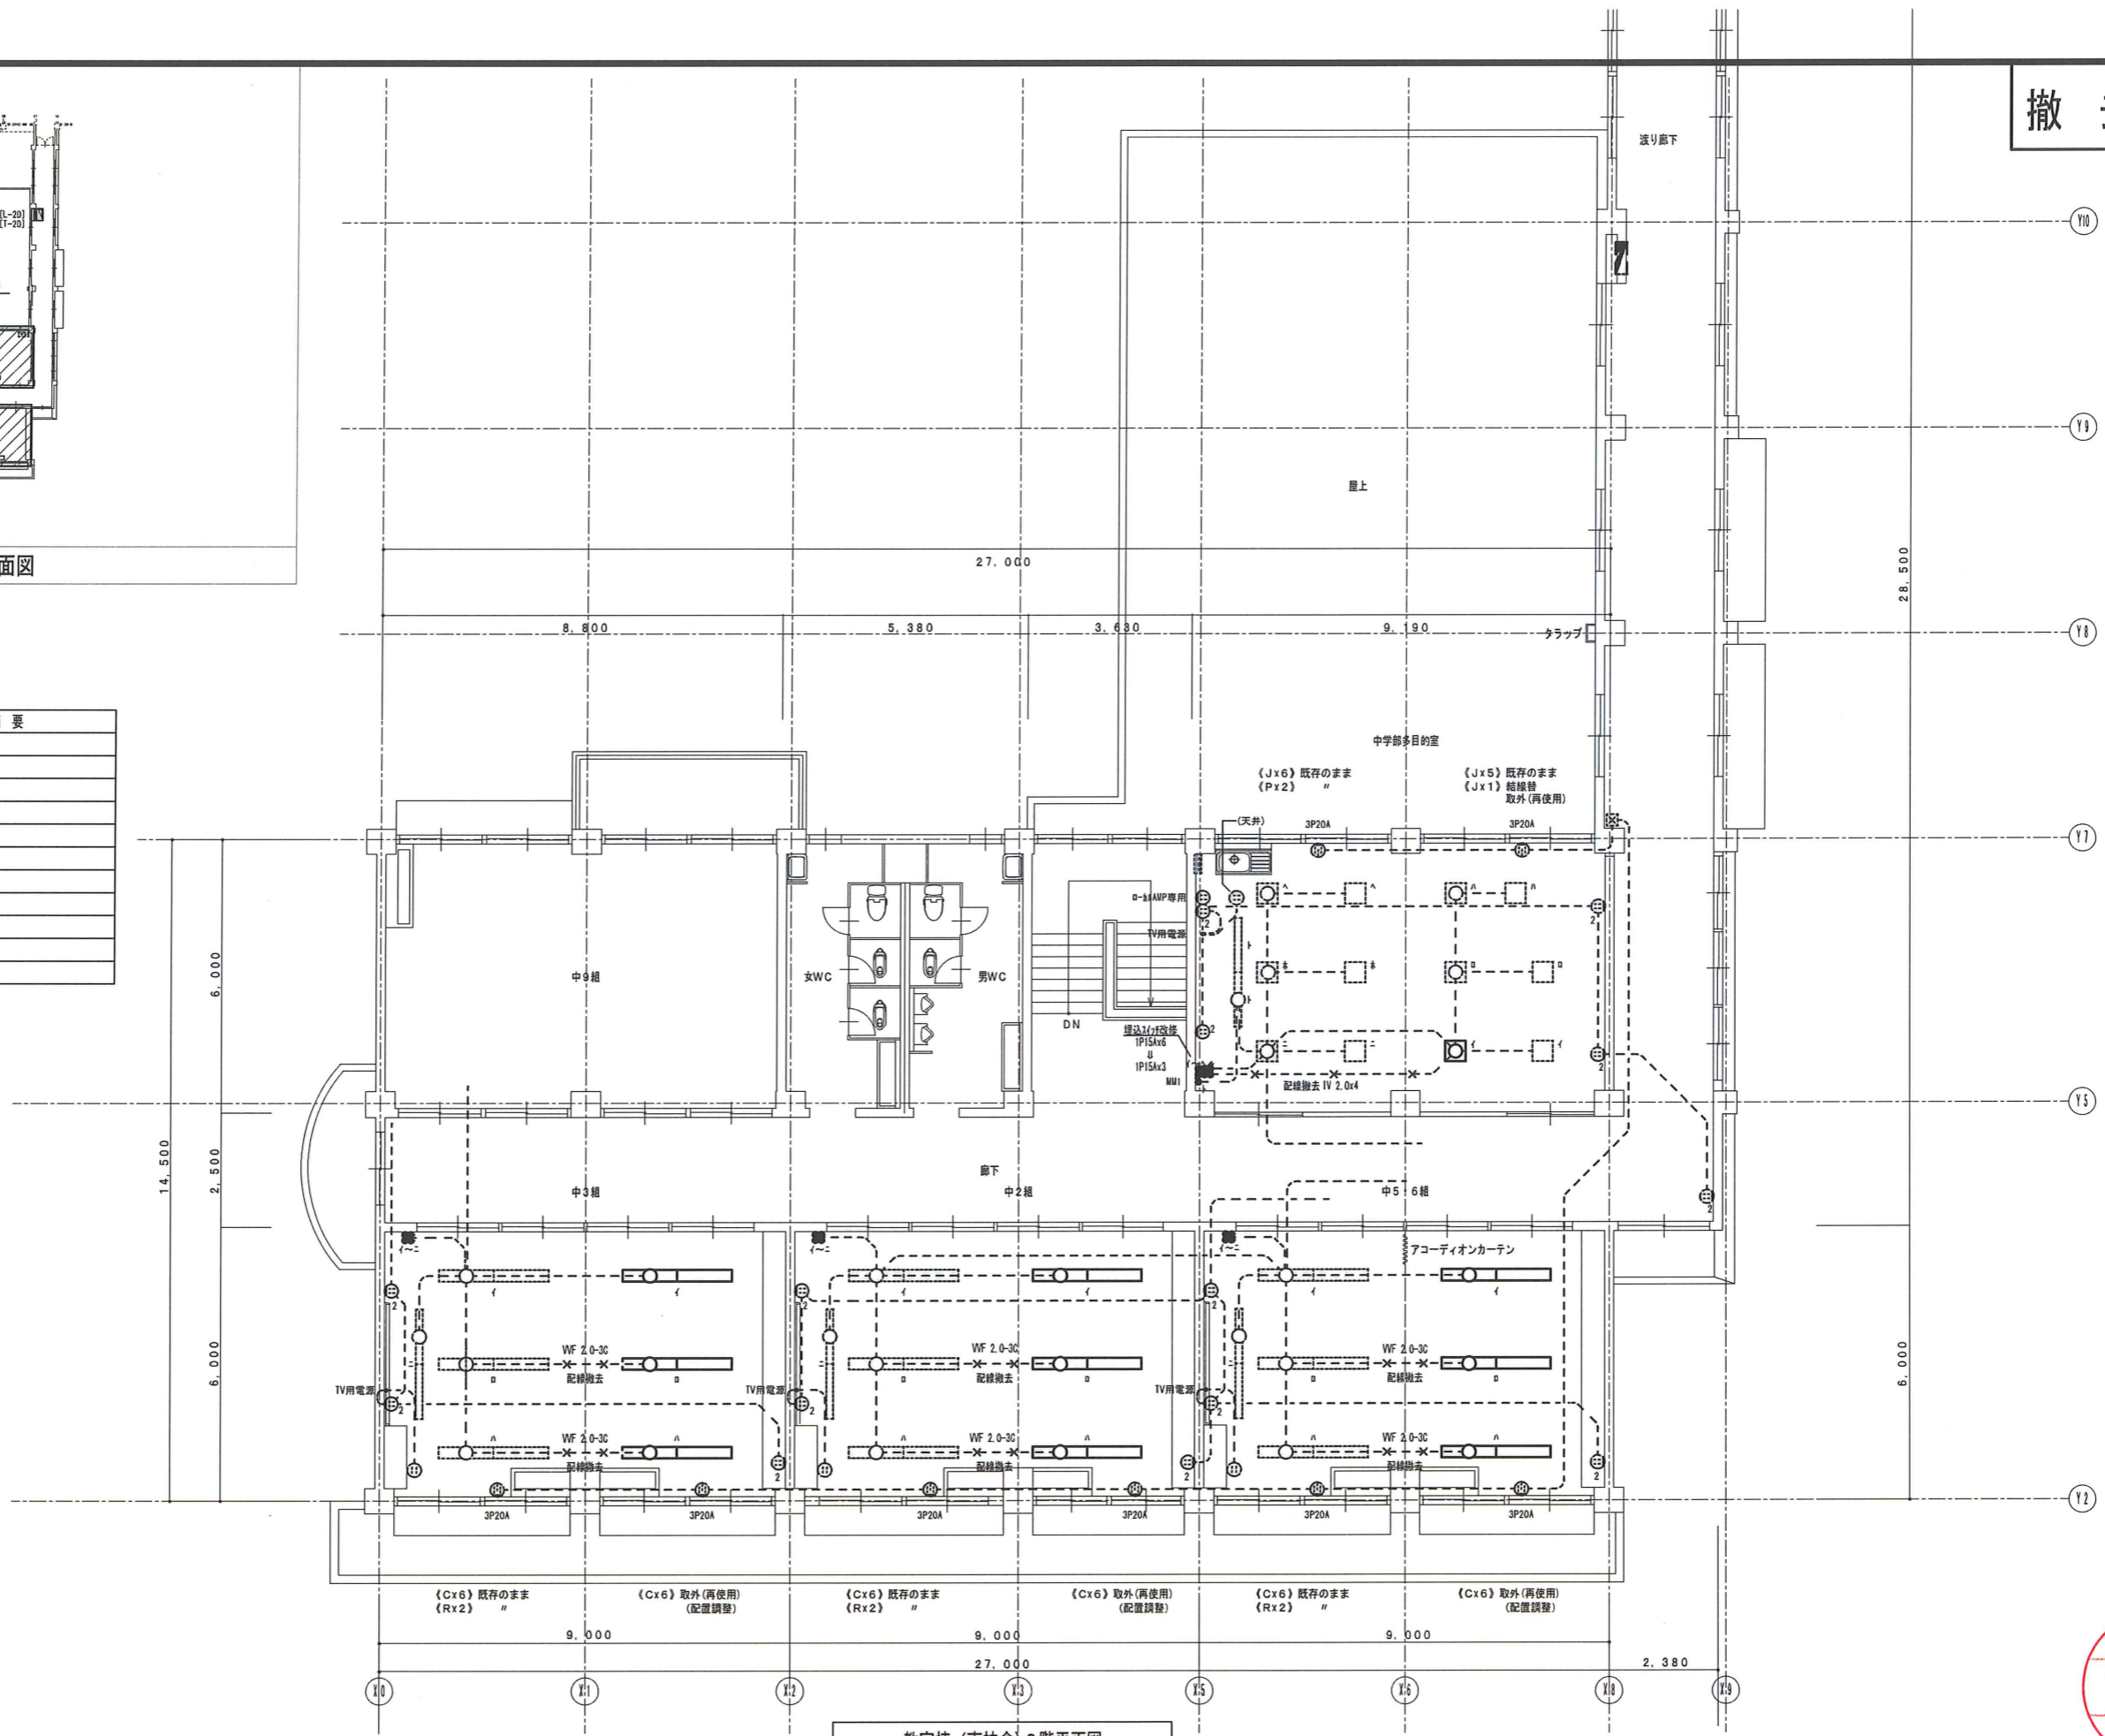

教室棟 (南校舎) 2階平面図

S=1/100



県立白兔養護学校教室整備改修工事 (二工区) (電気設備)

電気設備 電灯・コンセント設備 2階配管配線図


(教室棟) (撤去図)

株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取県鳥取市14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正哉

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
		22-15	2023.04	S=1/100	E-19

撤去図

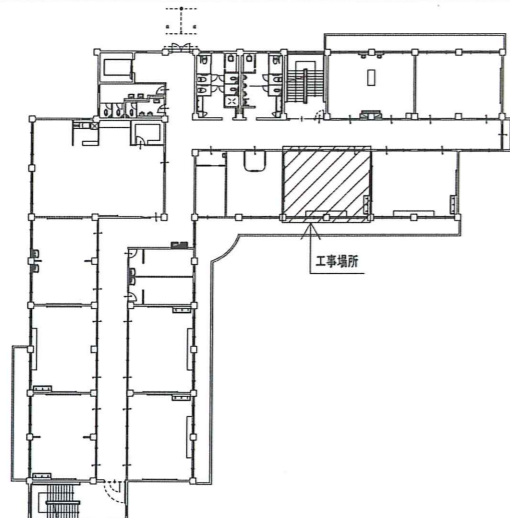


2階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
○	LED照明器具	
●	埋込スイッチ	
⊖	埋込コンセント	
⊖x	埋込抜止コンセント	
○	カバープレート	
—/—	機器撤去 (取外含む)	
x	配管配線撤去	

※ 特記なき撤去配線は、VF 2.0-20とする。

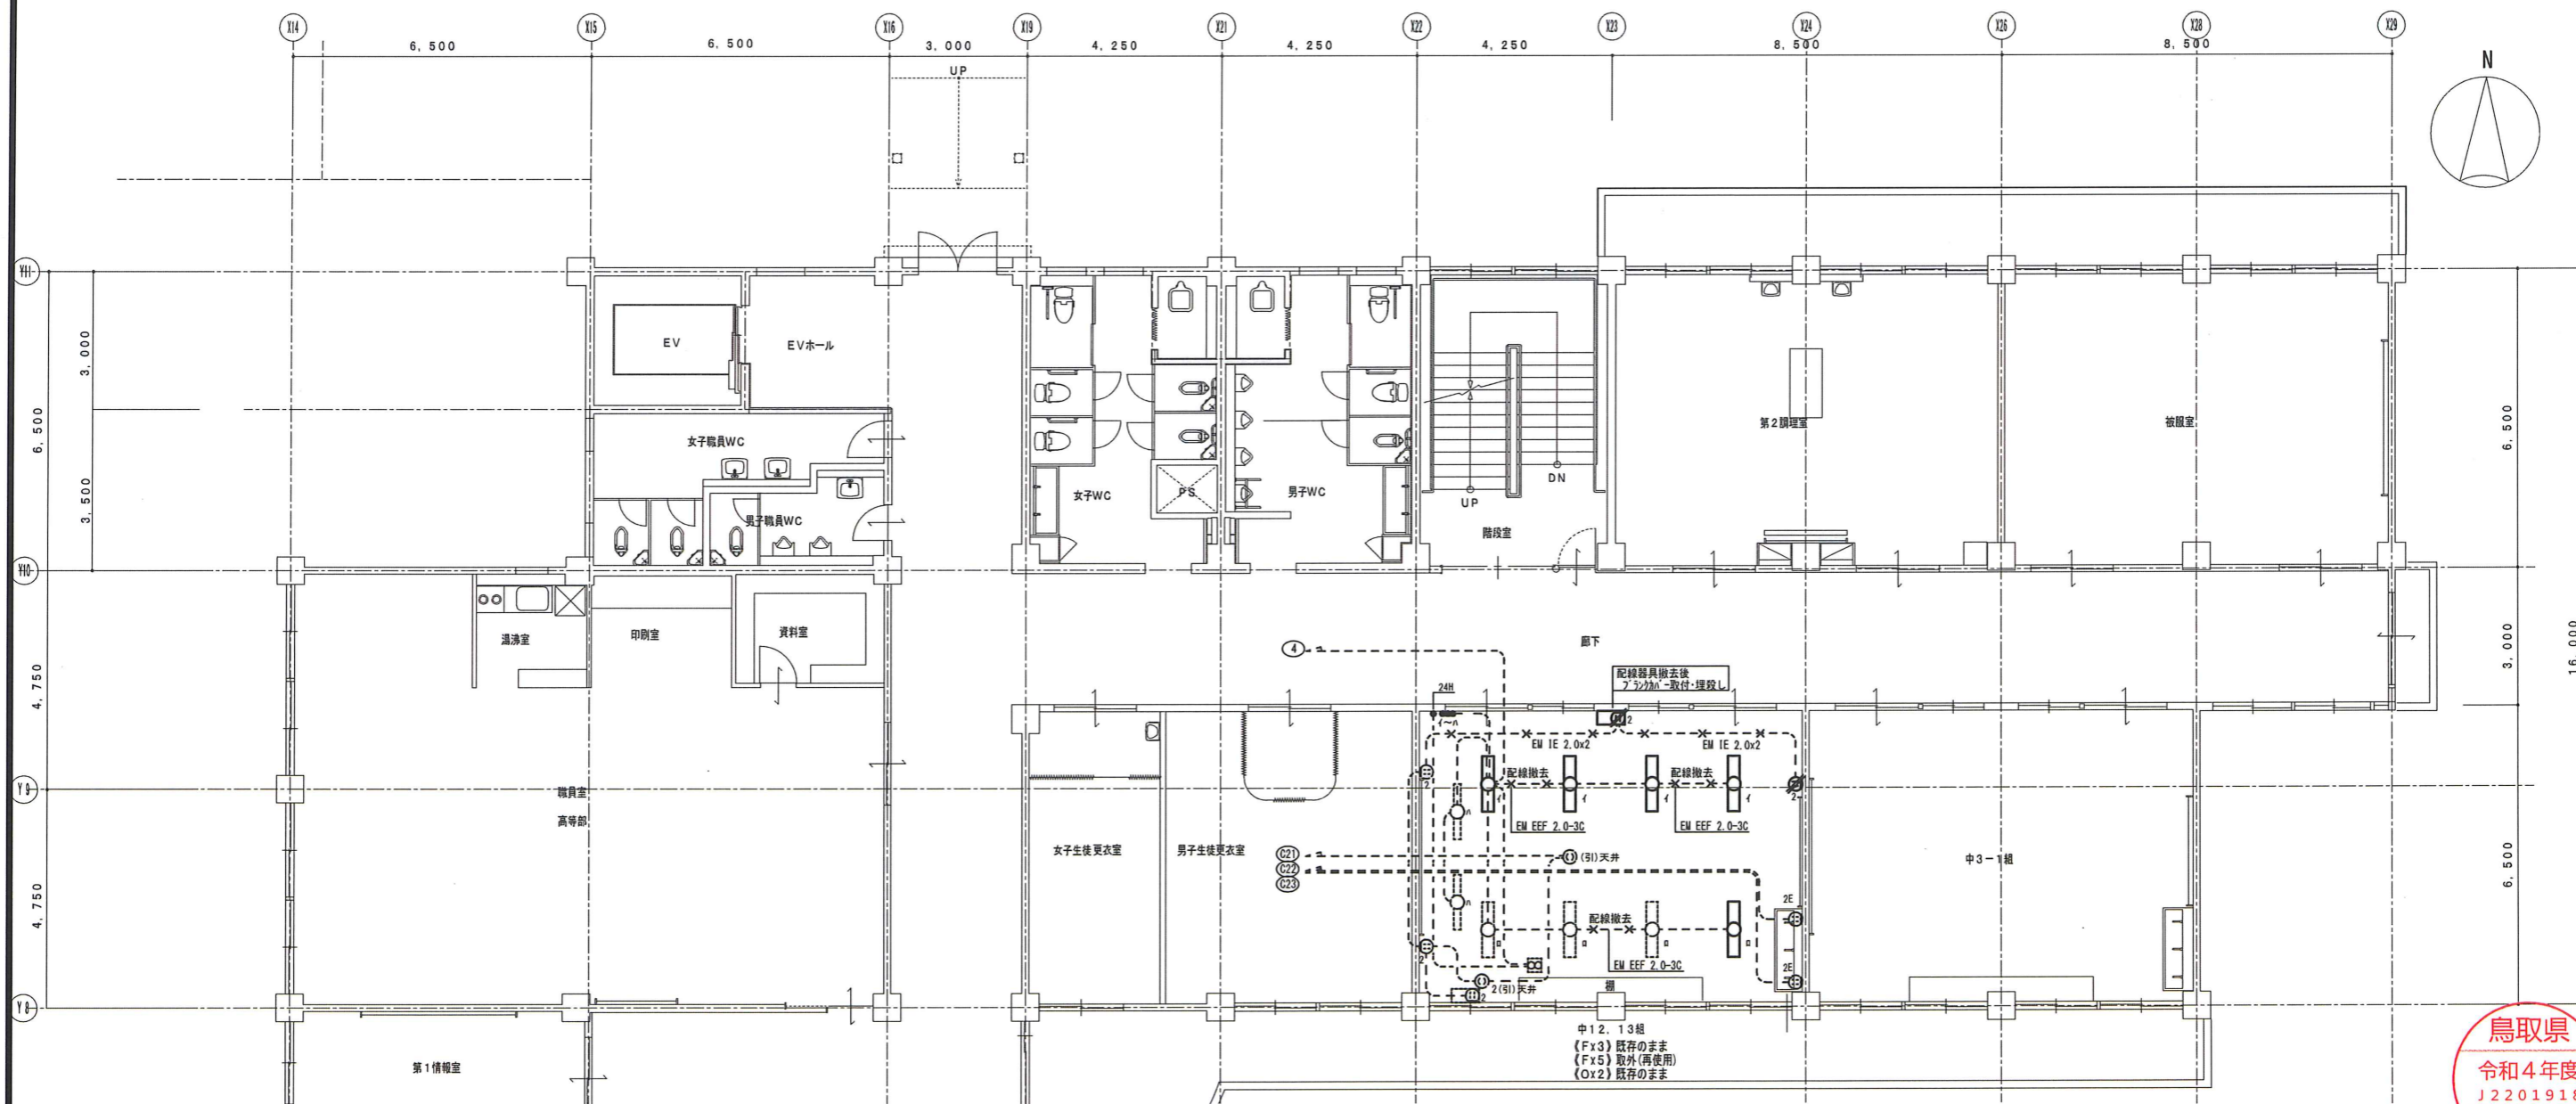

高等部棟 2階平面図

S=1/100

県立白兔養護学校教室整備改修工事 (二工区) (電気設備)

電気設備 電灯・コンセント設備 2階配管配線図 (1)

(高等部棟) (撤去図)

株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取市船泊町14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY

DRAWING BY

PROJECT NO

DATE

SCALE

DRAWING NO

22-15



2023, 04

S=1/100

E-20

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

撤去図

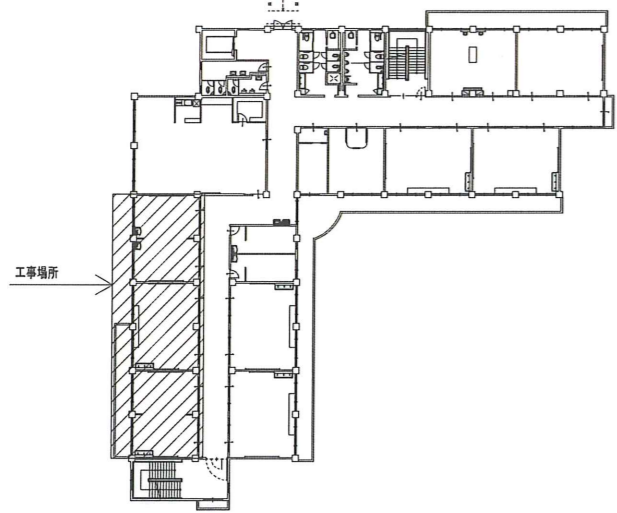


2階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
○	LED照明器具	
●	埋込スイッチ	
⊖	埋込コンセント	
⊖x	埋込抜きコンセント	
○	カバープレート	
/	機器撤去 (取外含む)	
x	配管配線撤去	

※ 特記なき撤去配線は、WF 2.0-20とする。


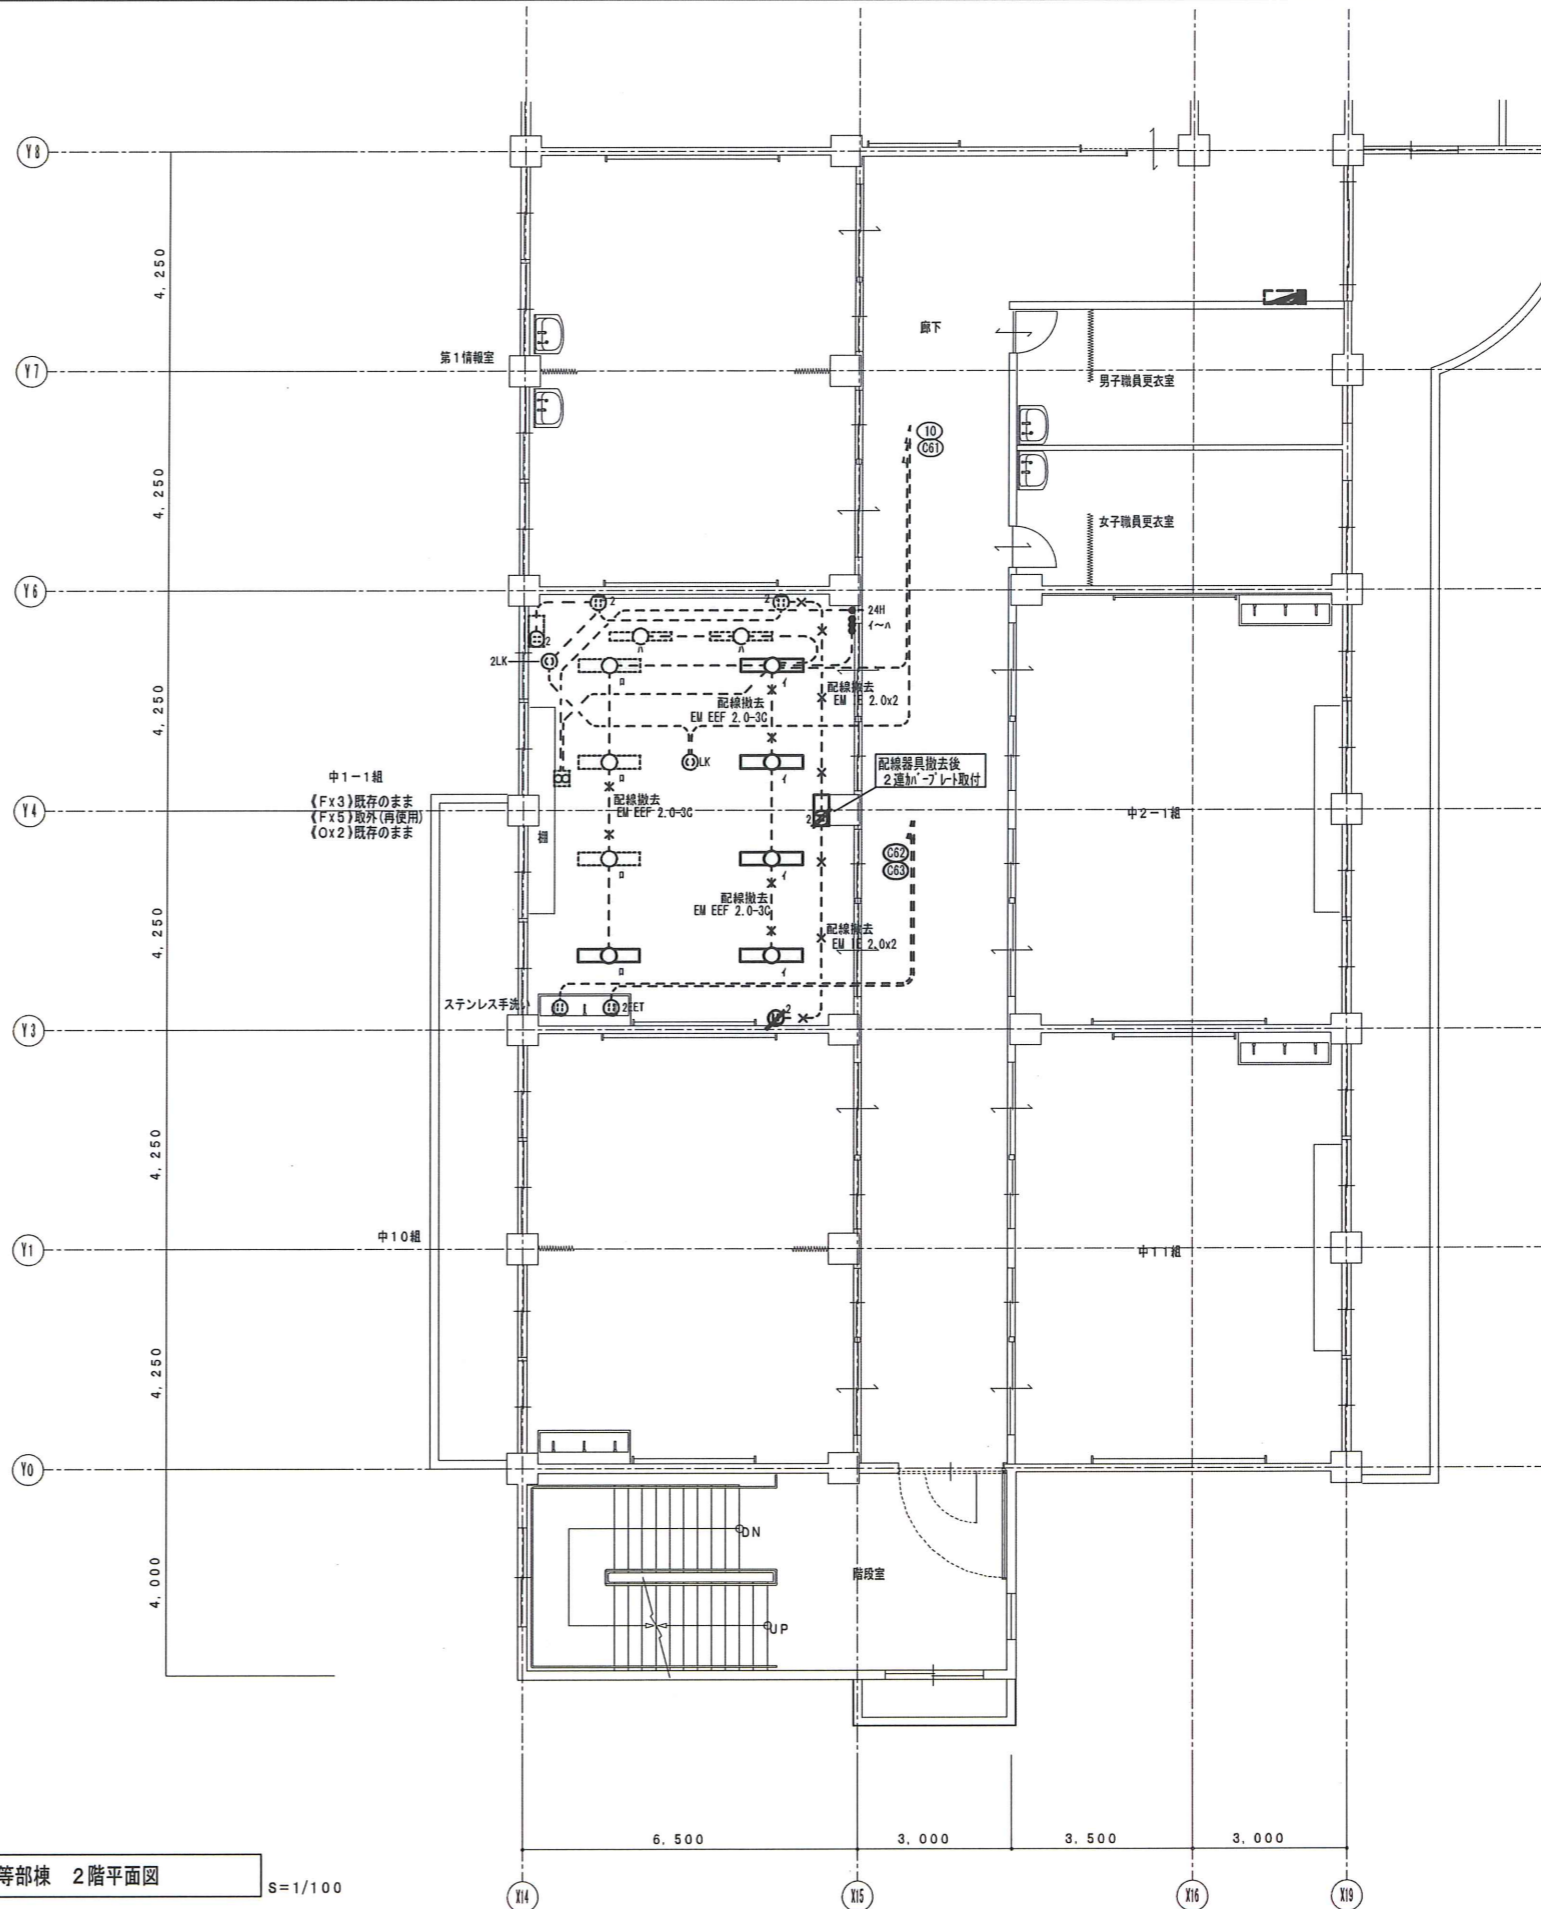


高等部棟 2階平面図

S=1/100

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

撤去図

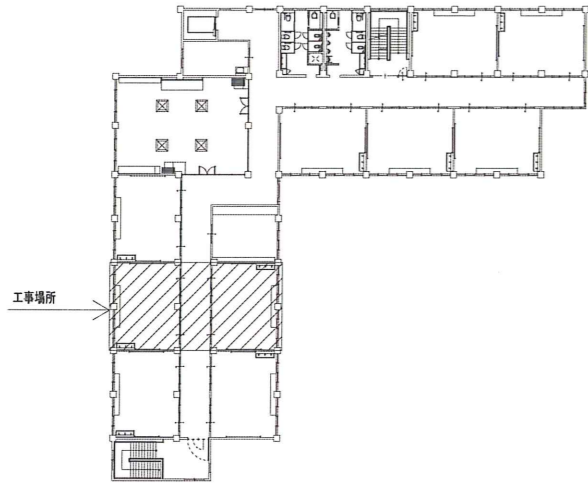


3階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
○	LED照明器具	
●	埋込スイッチ	
⊕	埋込コンセント	
⊕x	埋込抜きコンセント	
○	カバープレート	
／	機器撤去 (取外含む)	
x	配管配線撤去	

※ 特記なき撤去配線は、WF 2.0-20とする。

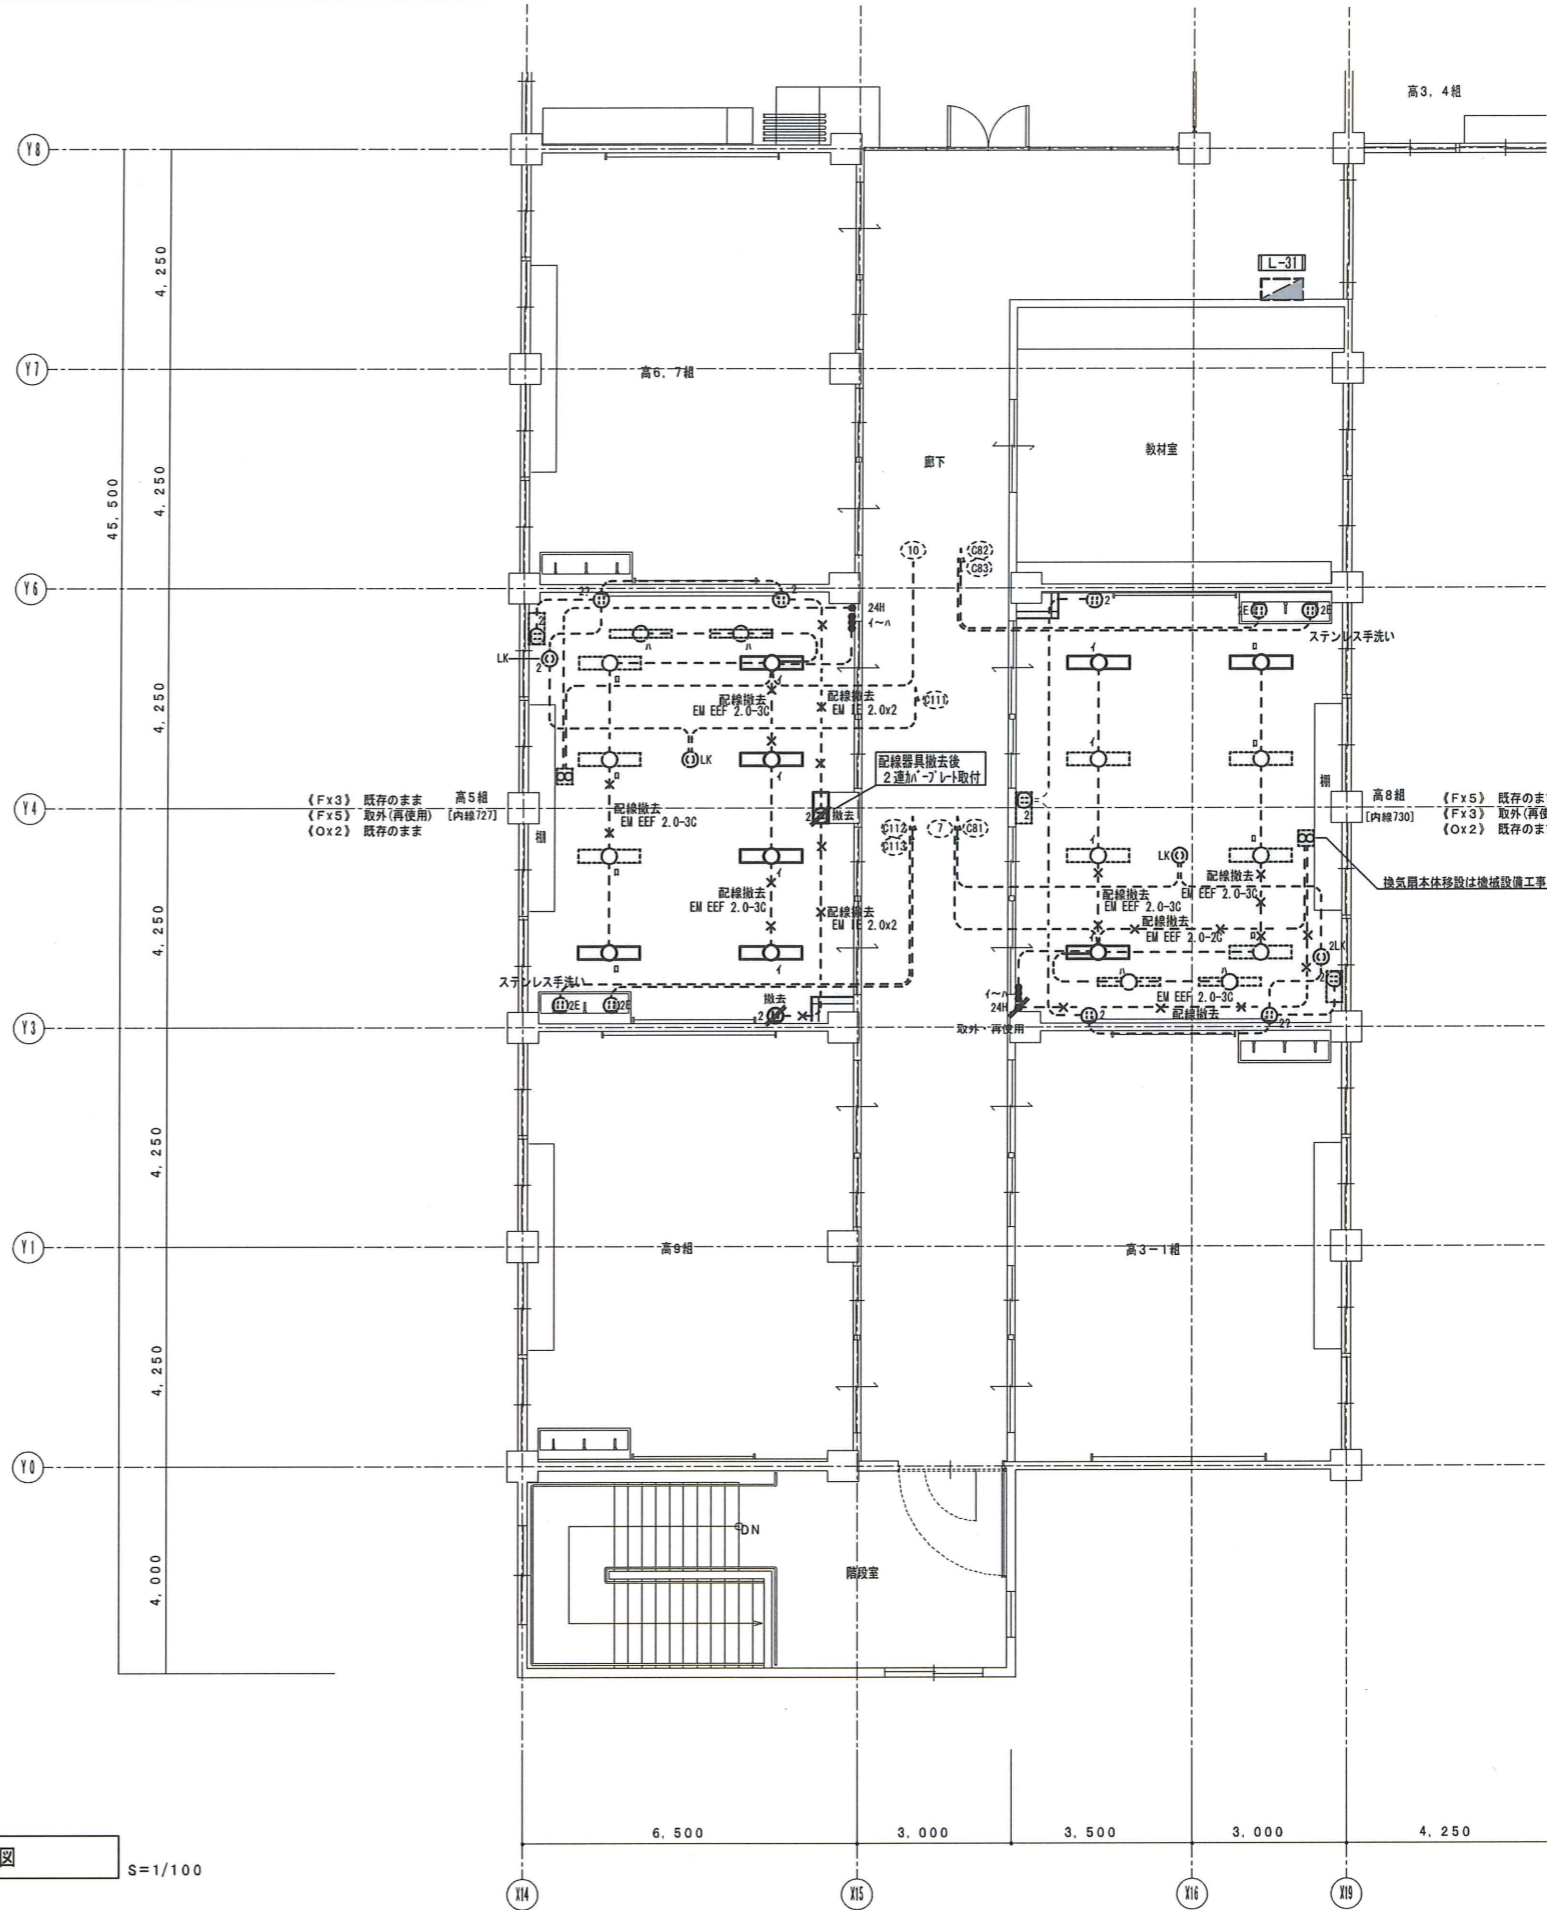

高等部棟 3階平面図 S=1/100




県立白兎養護学校教室整備改修工事 (二工区) (電気設備)
電気設備 電灯・コンセント設備 3階配管配線図

(高等部棟) (撤去図)

株式会社 樟設備設計事務所
〒680-0052 鳥取市扇治町14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
宗	高	22-15	2023, 04	S=1/100	E-22


撤去図

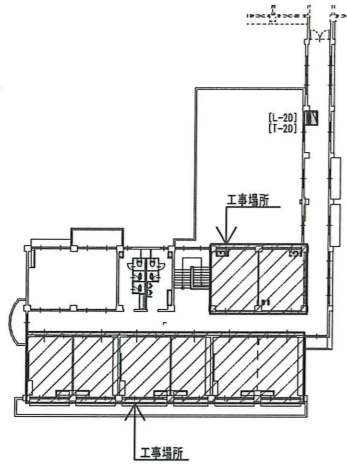

2階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
ⓐ	子時計	
ⓑ	スピーカー	
ⓒ	電話	配線・機器撤去別途工事
ⓓ	情報コンセント	
ⓔ	TV端子	
ⓕ	感知器	
ⓖ	カバープレート	
ⓗ	機器撤去 (取外含む)	
✕	配管配線撤去	

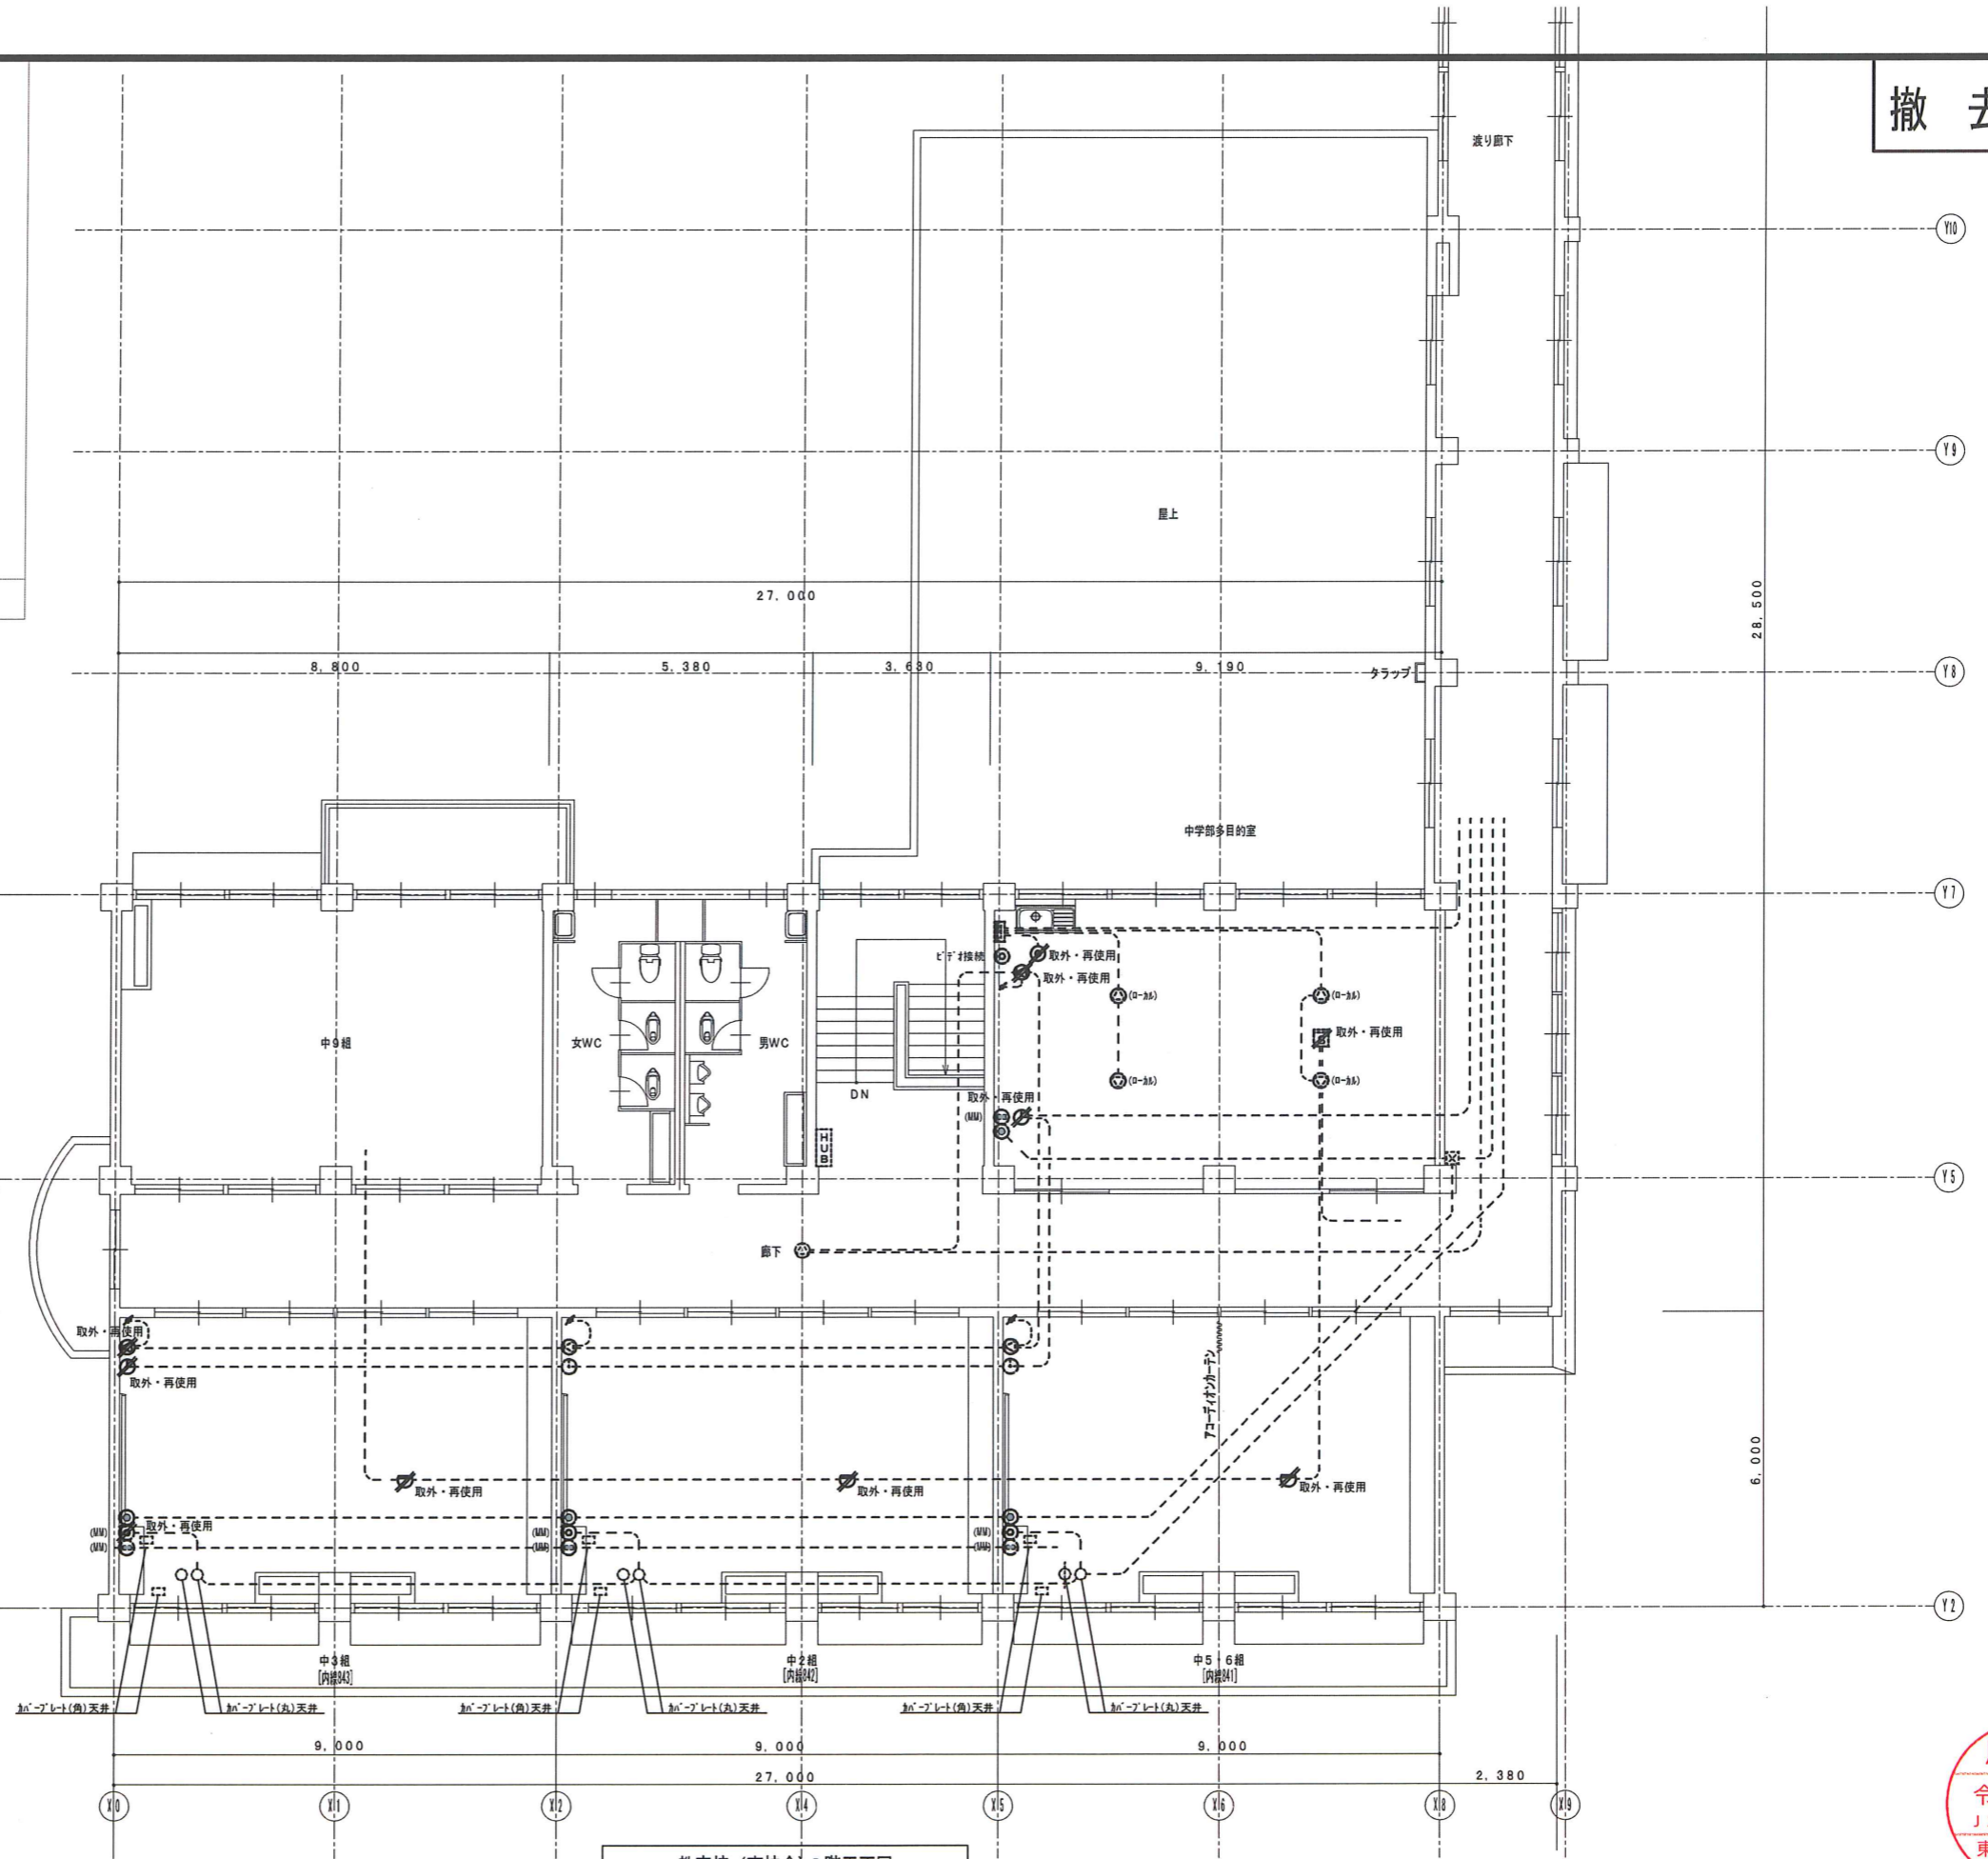

教室棟 (南校舎) 2階平面図

S=1/100



県立白兔養護学校教室整備改修工事 (二工区) (電気設備)

電気設備 弱電設備 2階配管配線図

(教室棟) (撤去図)

株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取市鍛冶町14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY

DRAWING BY

PROJECT NO
22-15

DATE
2023, 04


SCALE
S=1/100

DRAWING NO
E-23


撤去図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
----	配管配線	
Ⓢ	子時計	
Ⓜ	スピーカー	
Ⓣ	電話	配線・機器撤去別途工事
Ⓜ	情報コンセント	
Ⓣ	TV端子	
Ⓜ	感知器	
○	カバープレート	
⚡	機器撤去(取外含む)	
×	配管配線撤去	

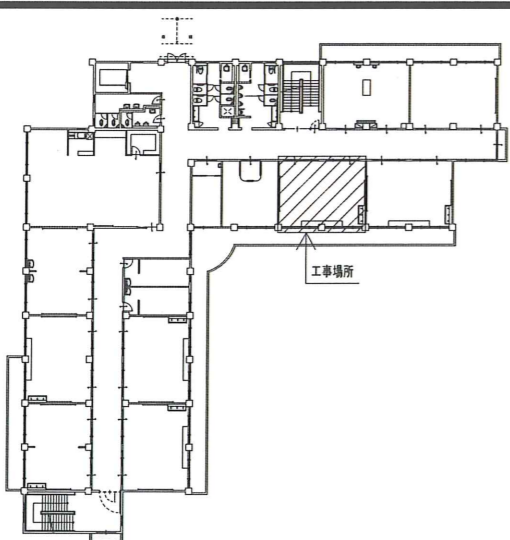

2階 平面図

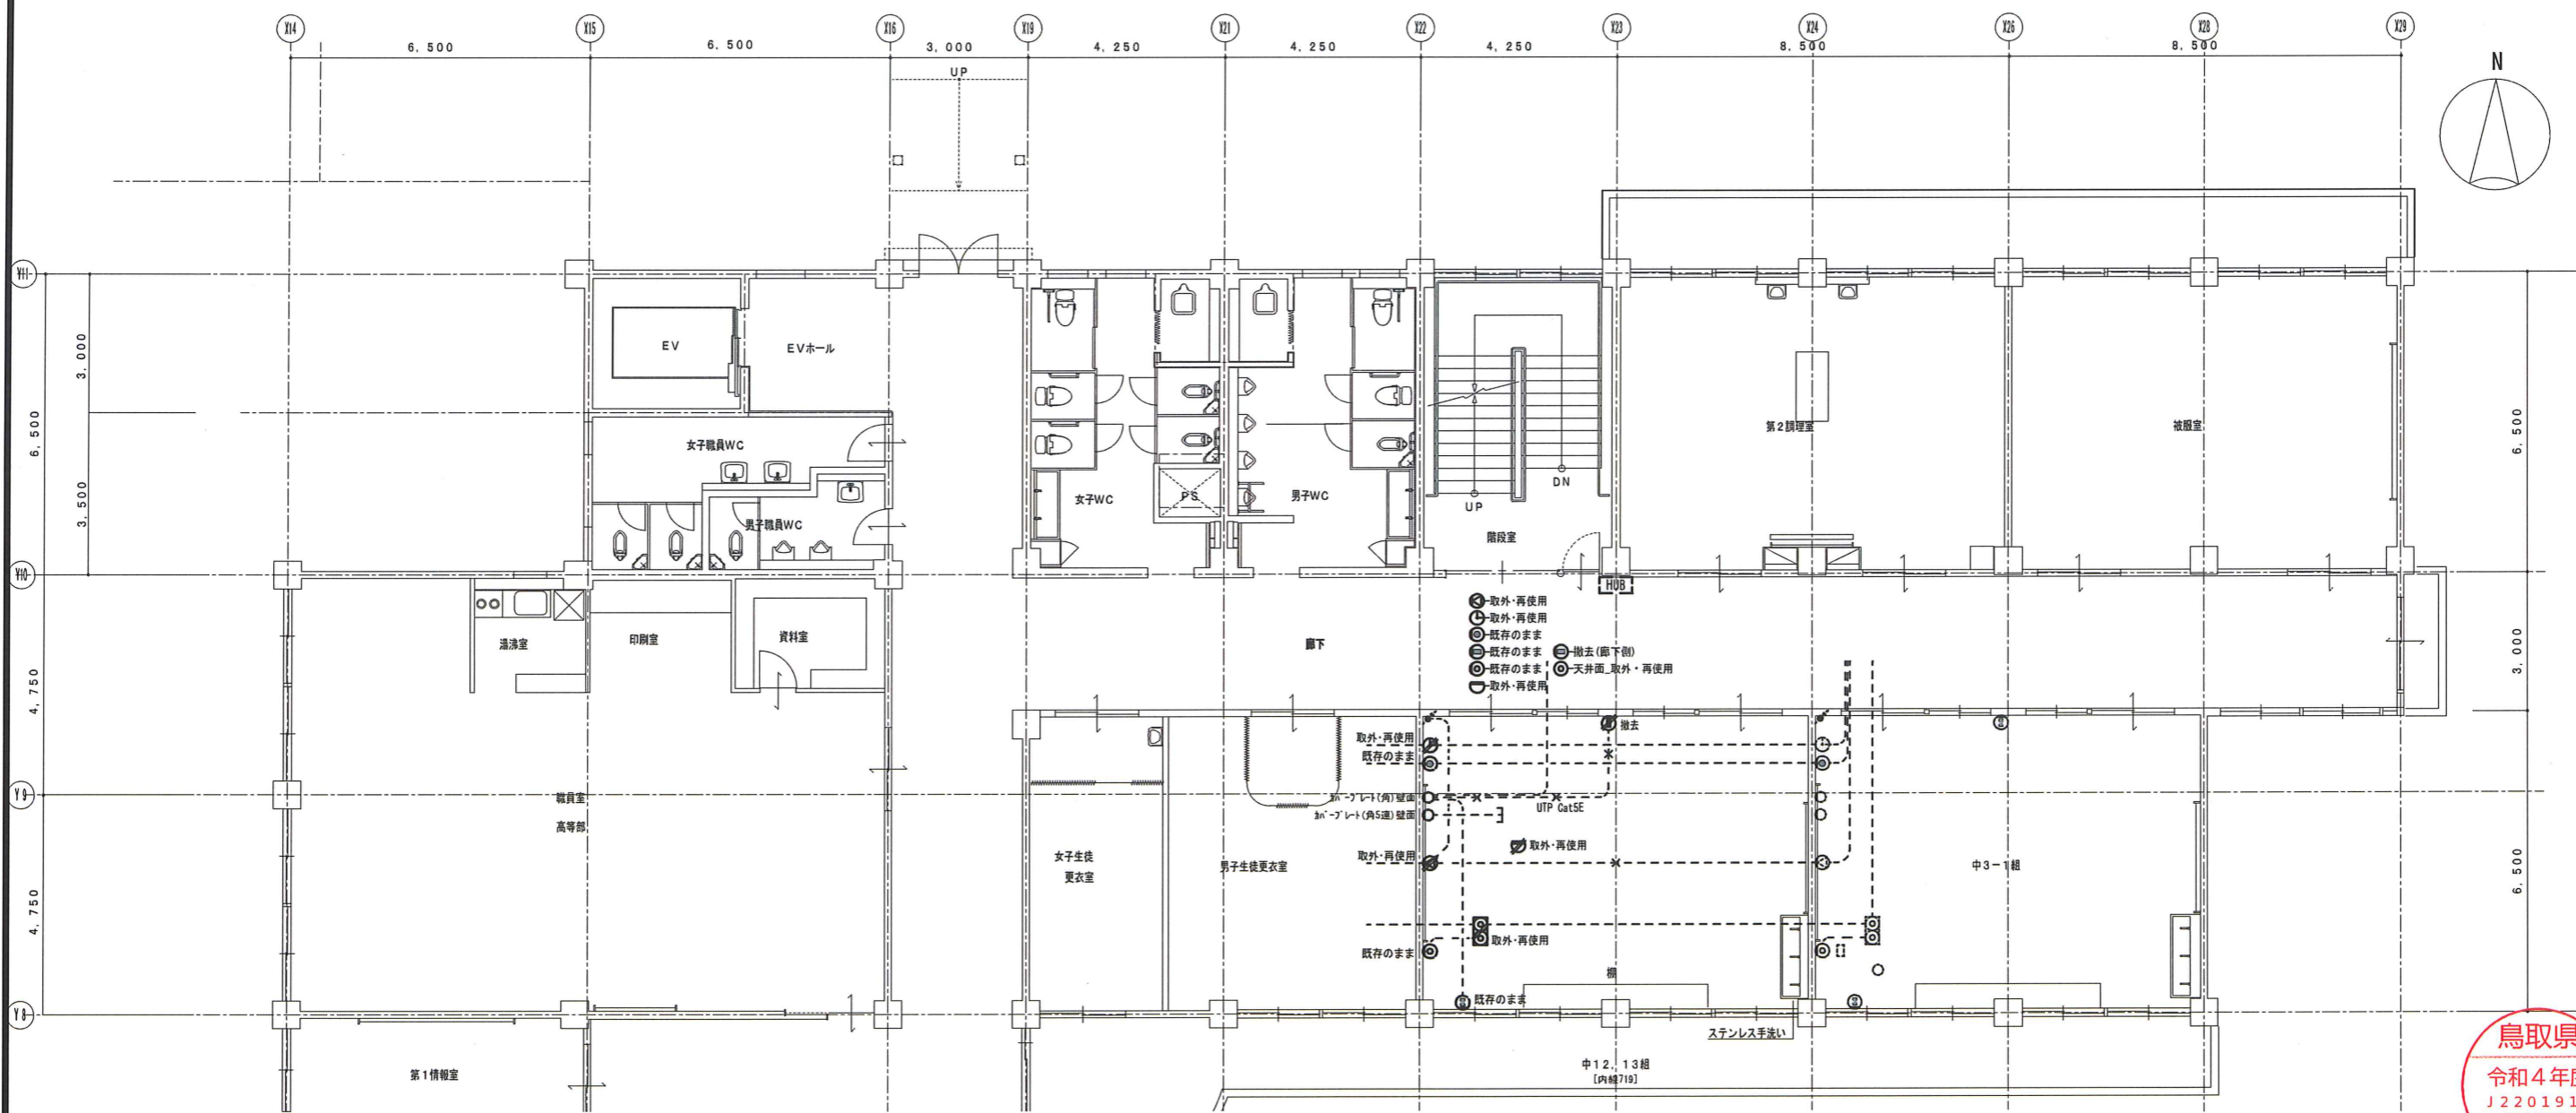

高等部棟 2階平面図

S=1/100

県立白兔養護学校教室整備改修工事(二工区)(電気設備)

電気設備 弱電設備 2階配管配線図(1)

(高等部棟)(撤去図)


株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取市鍛冶町14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
宗	樟	22-15	2023.04	S=1/100	E-24

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所


撤去図

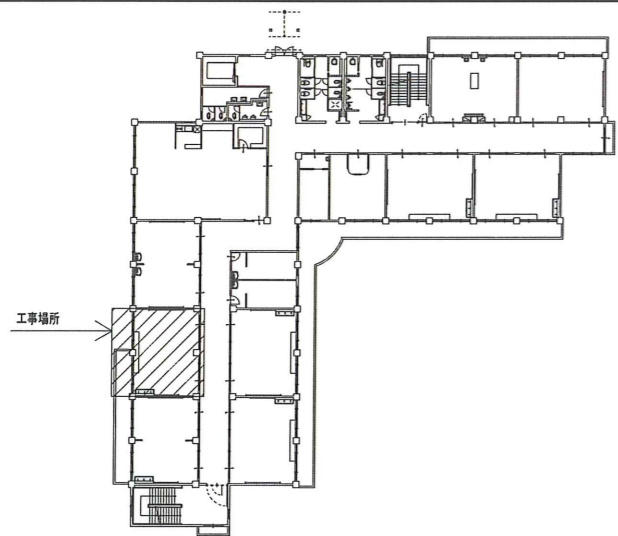

2階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)


記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
⌚	子時計	
🔊	スピーカー	
☎	電話	配線・機器撤去別途工事
📶	情報コンセント	
📺	TV端子	
📡	感知器	
○	カバープレート	
🔧	機器撤去(取外含む)	
×	配管配線撤去	

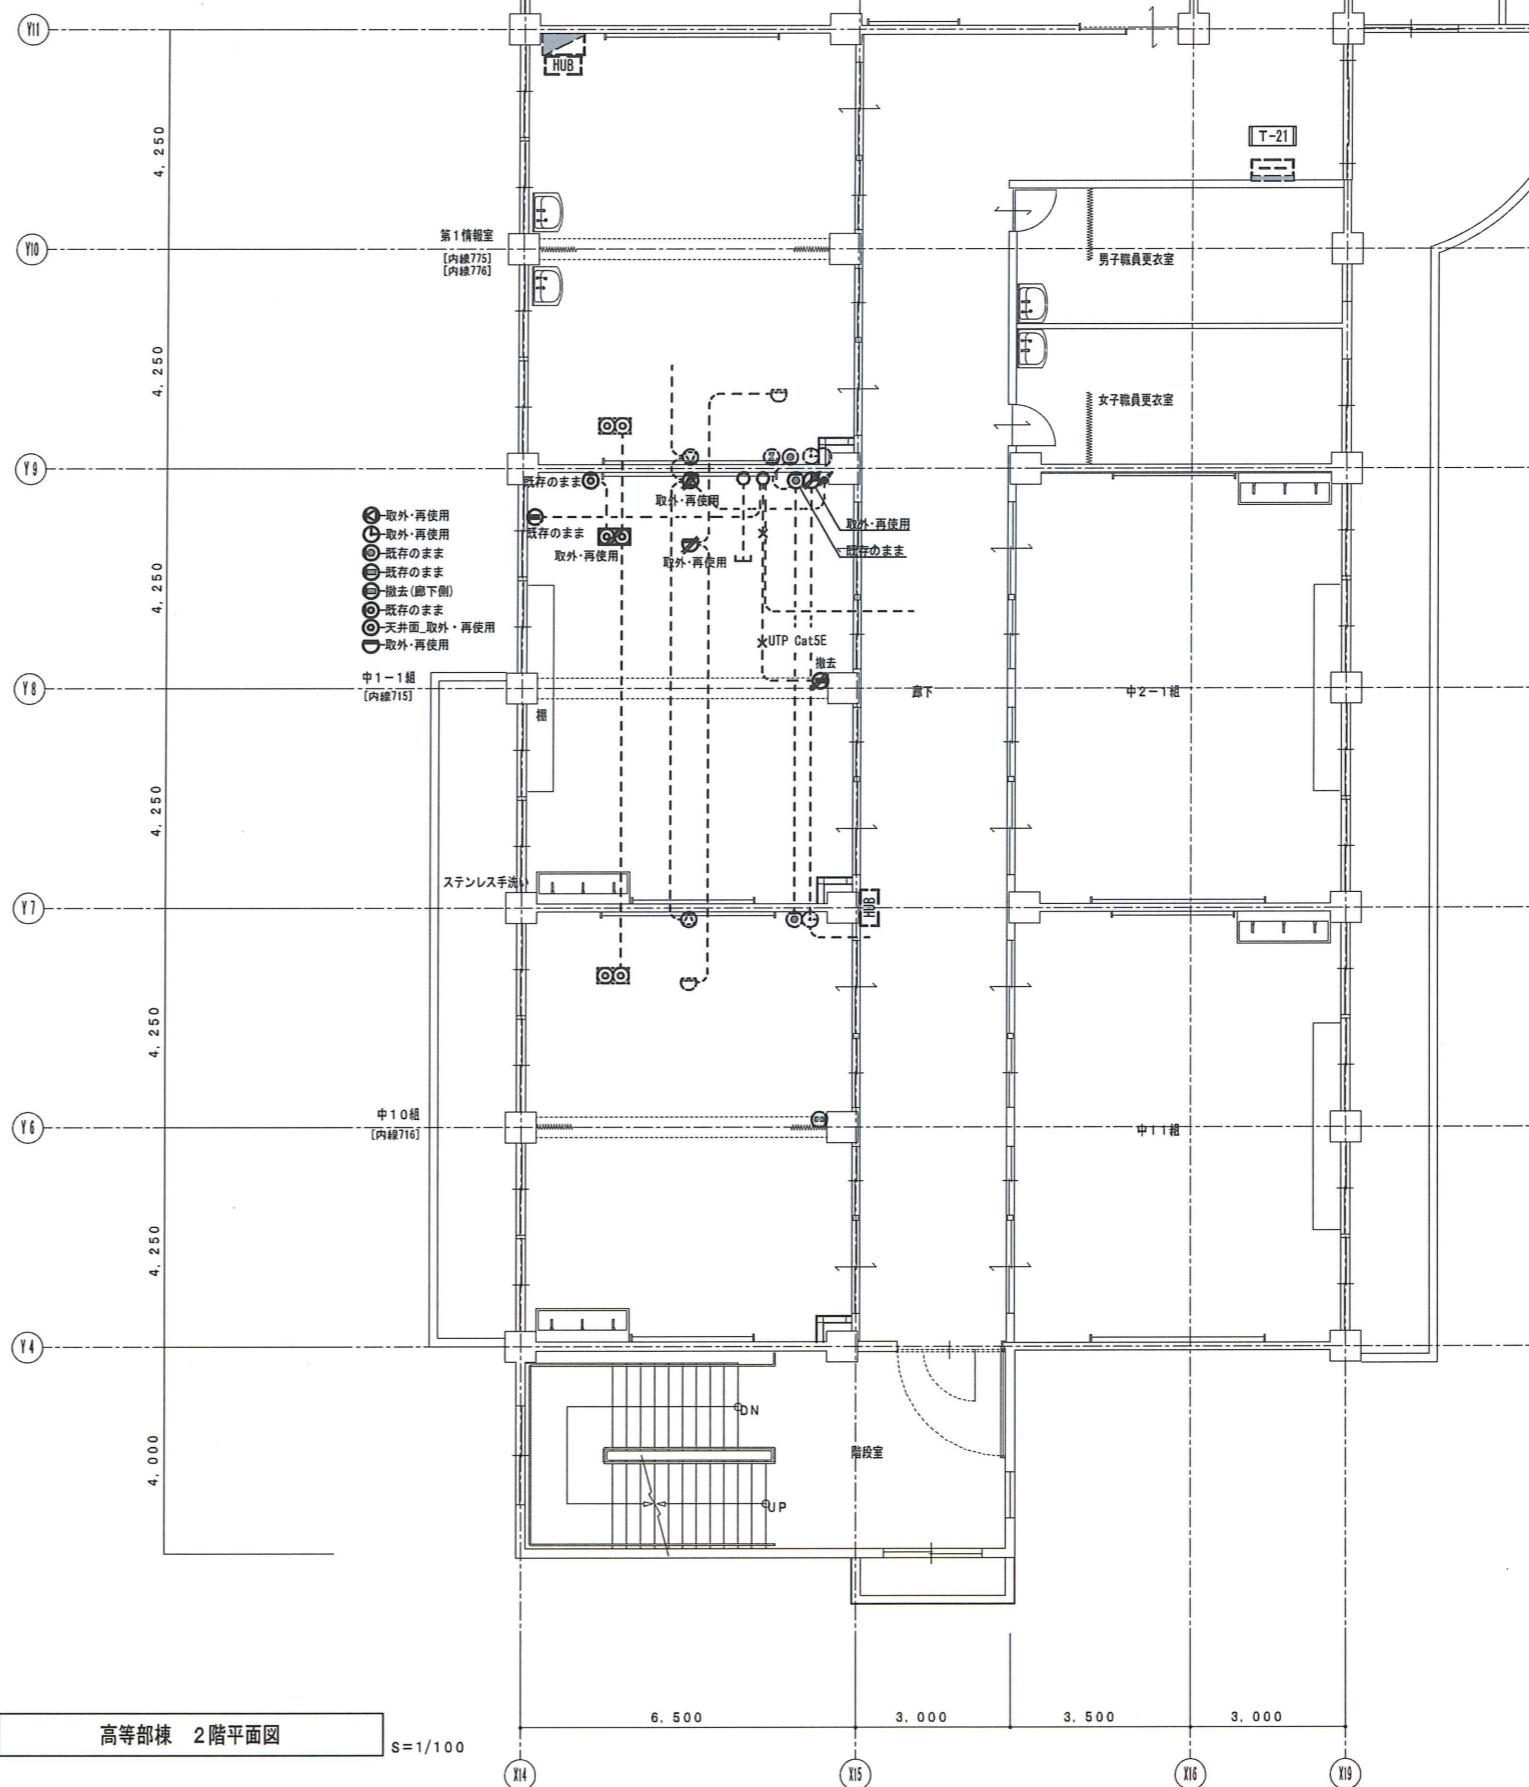

高等部棟 2階平面図

S=1/100


撤去図

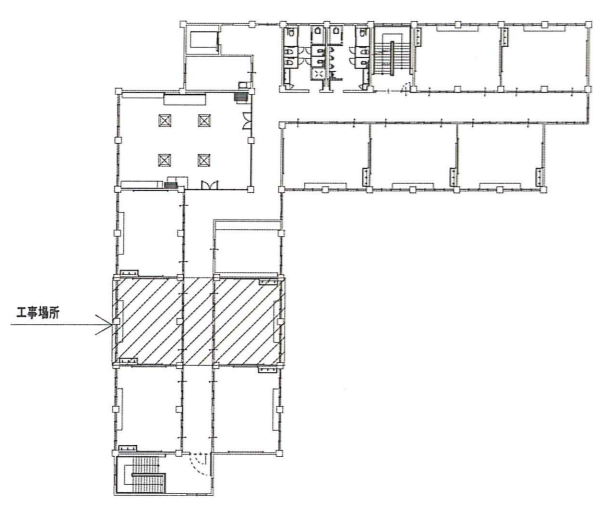



3階 平面図

凡例 (既存設備撤去図)

記号	名称・仕様	摘要
---	配管配線	
⊕	子時計	
⊙	スピーカー	
⊗	電話	配線・機器撤去別置工事
⊖	情報コンセント	
⊚	TV端子	
⊕	感知器	
○	カバープレート	
⊘	機器撤去 (取外含む)	
x	配管配線撤去	

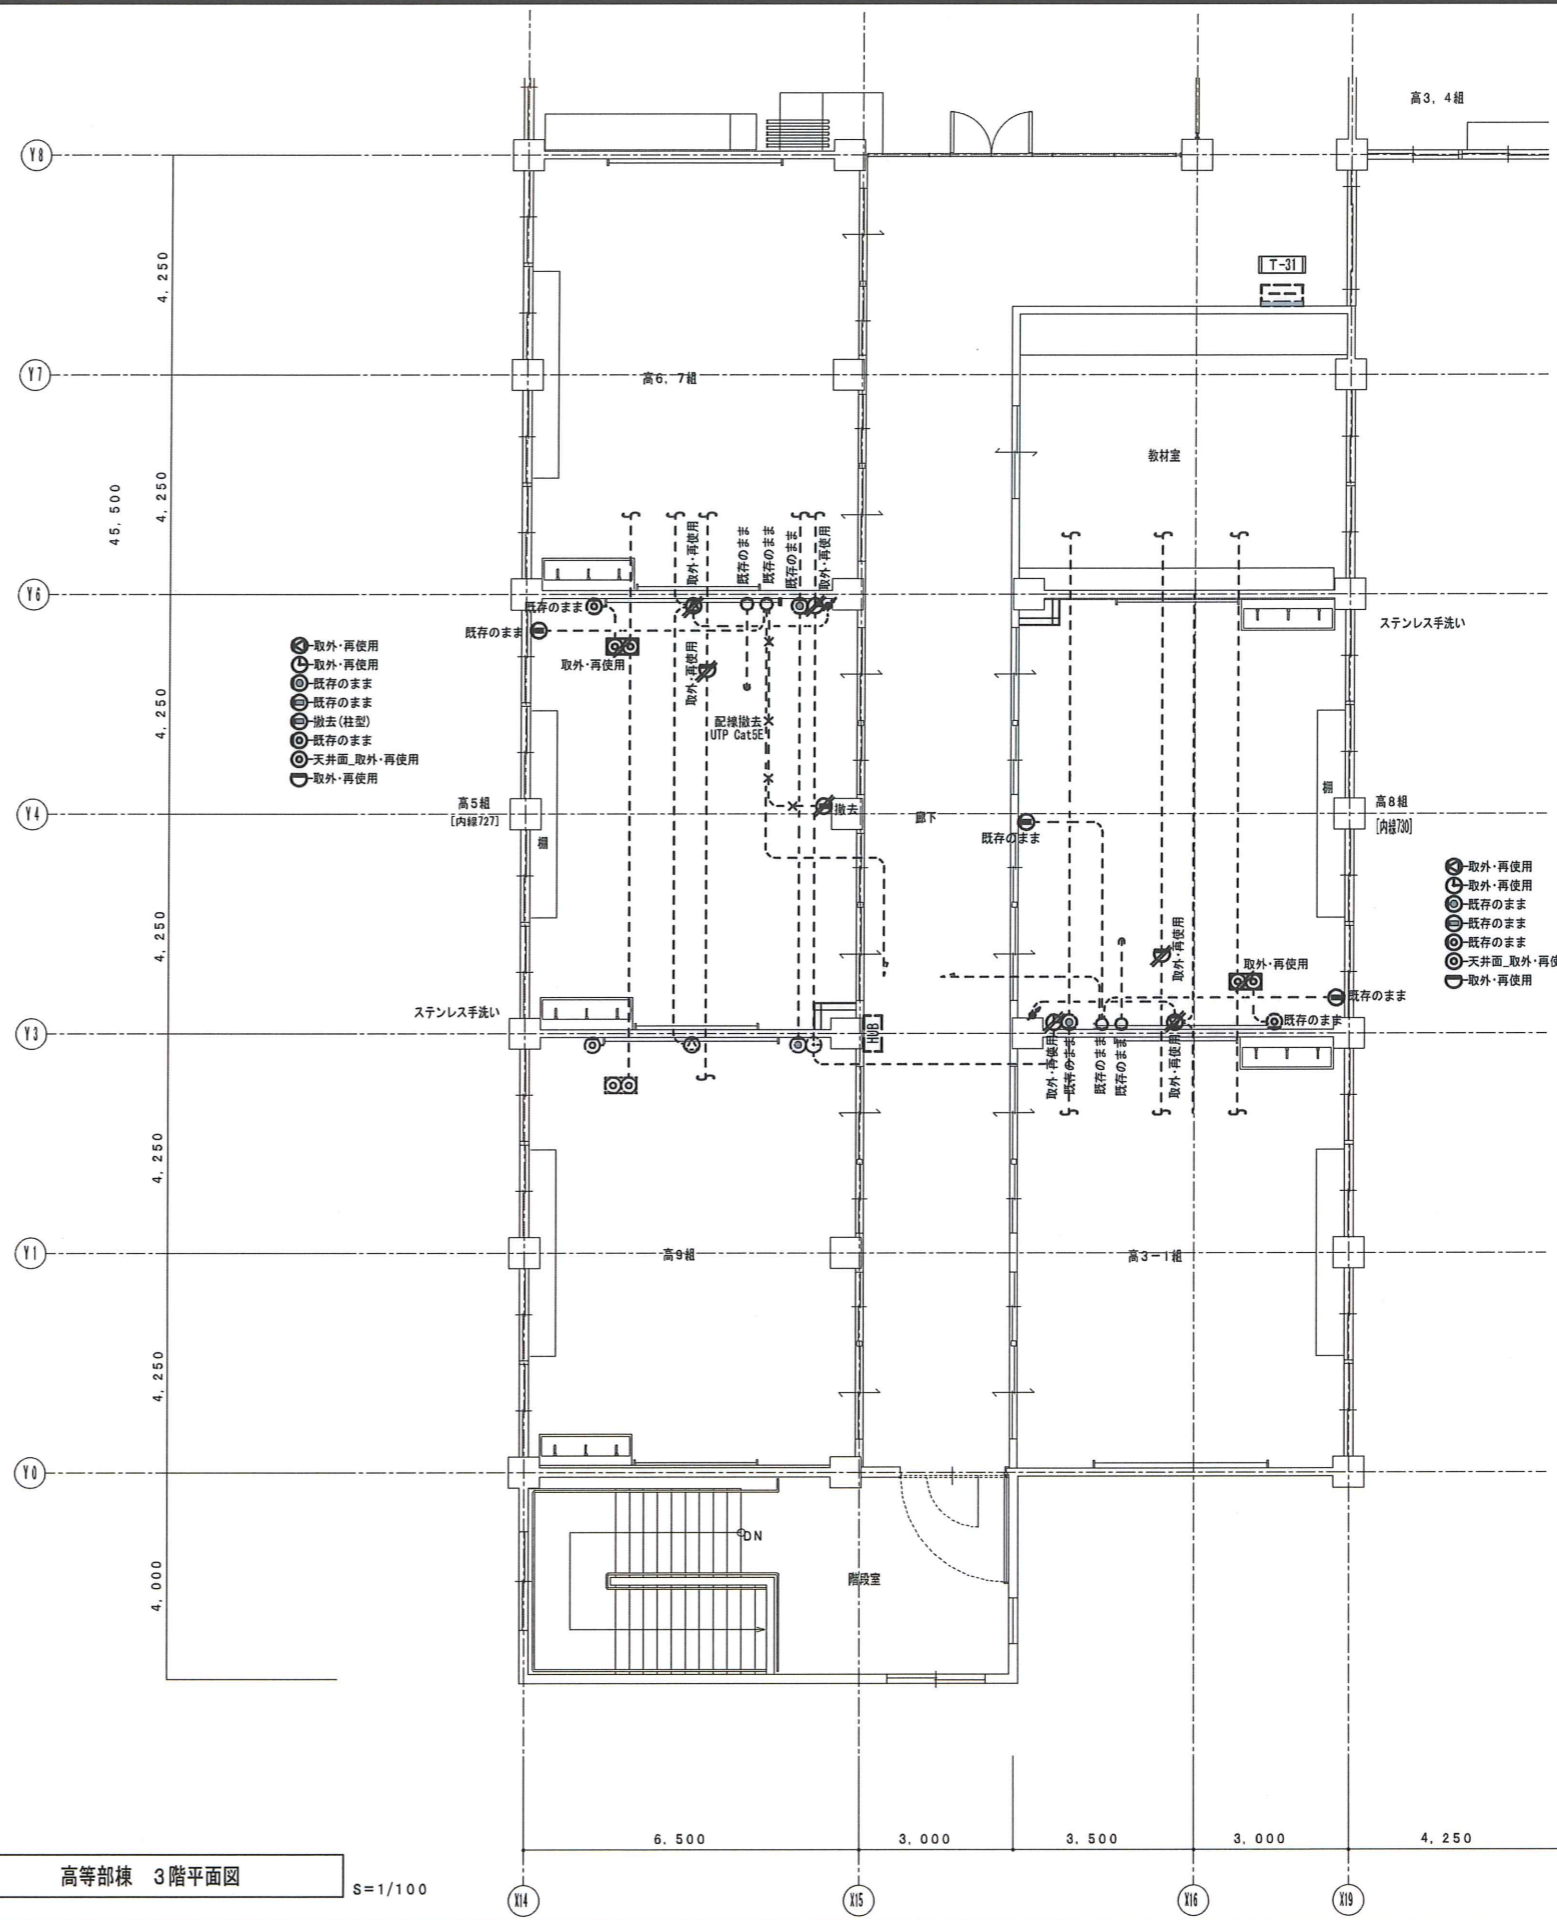


高等部棟 3階平面図 S=1/100

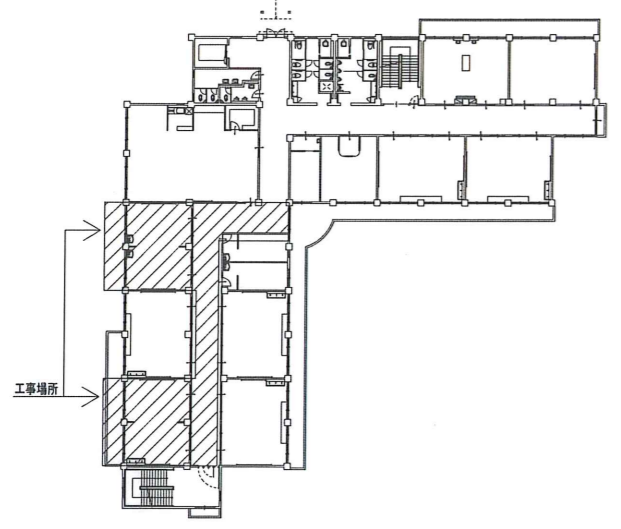


2階 平面図

天井内下り壁コア抜き (鉄筋探索共)
貫通孔サイズは傍記による。
貫通箇所には区画処理(1時間耐火)を行う。

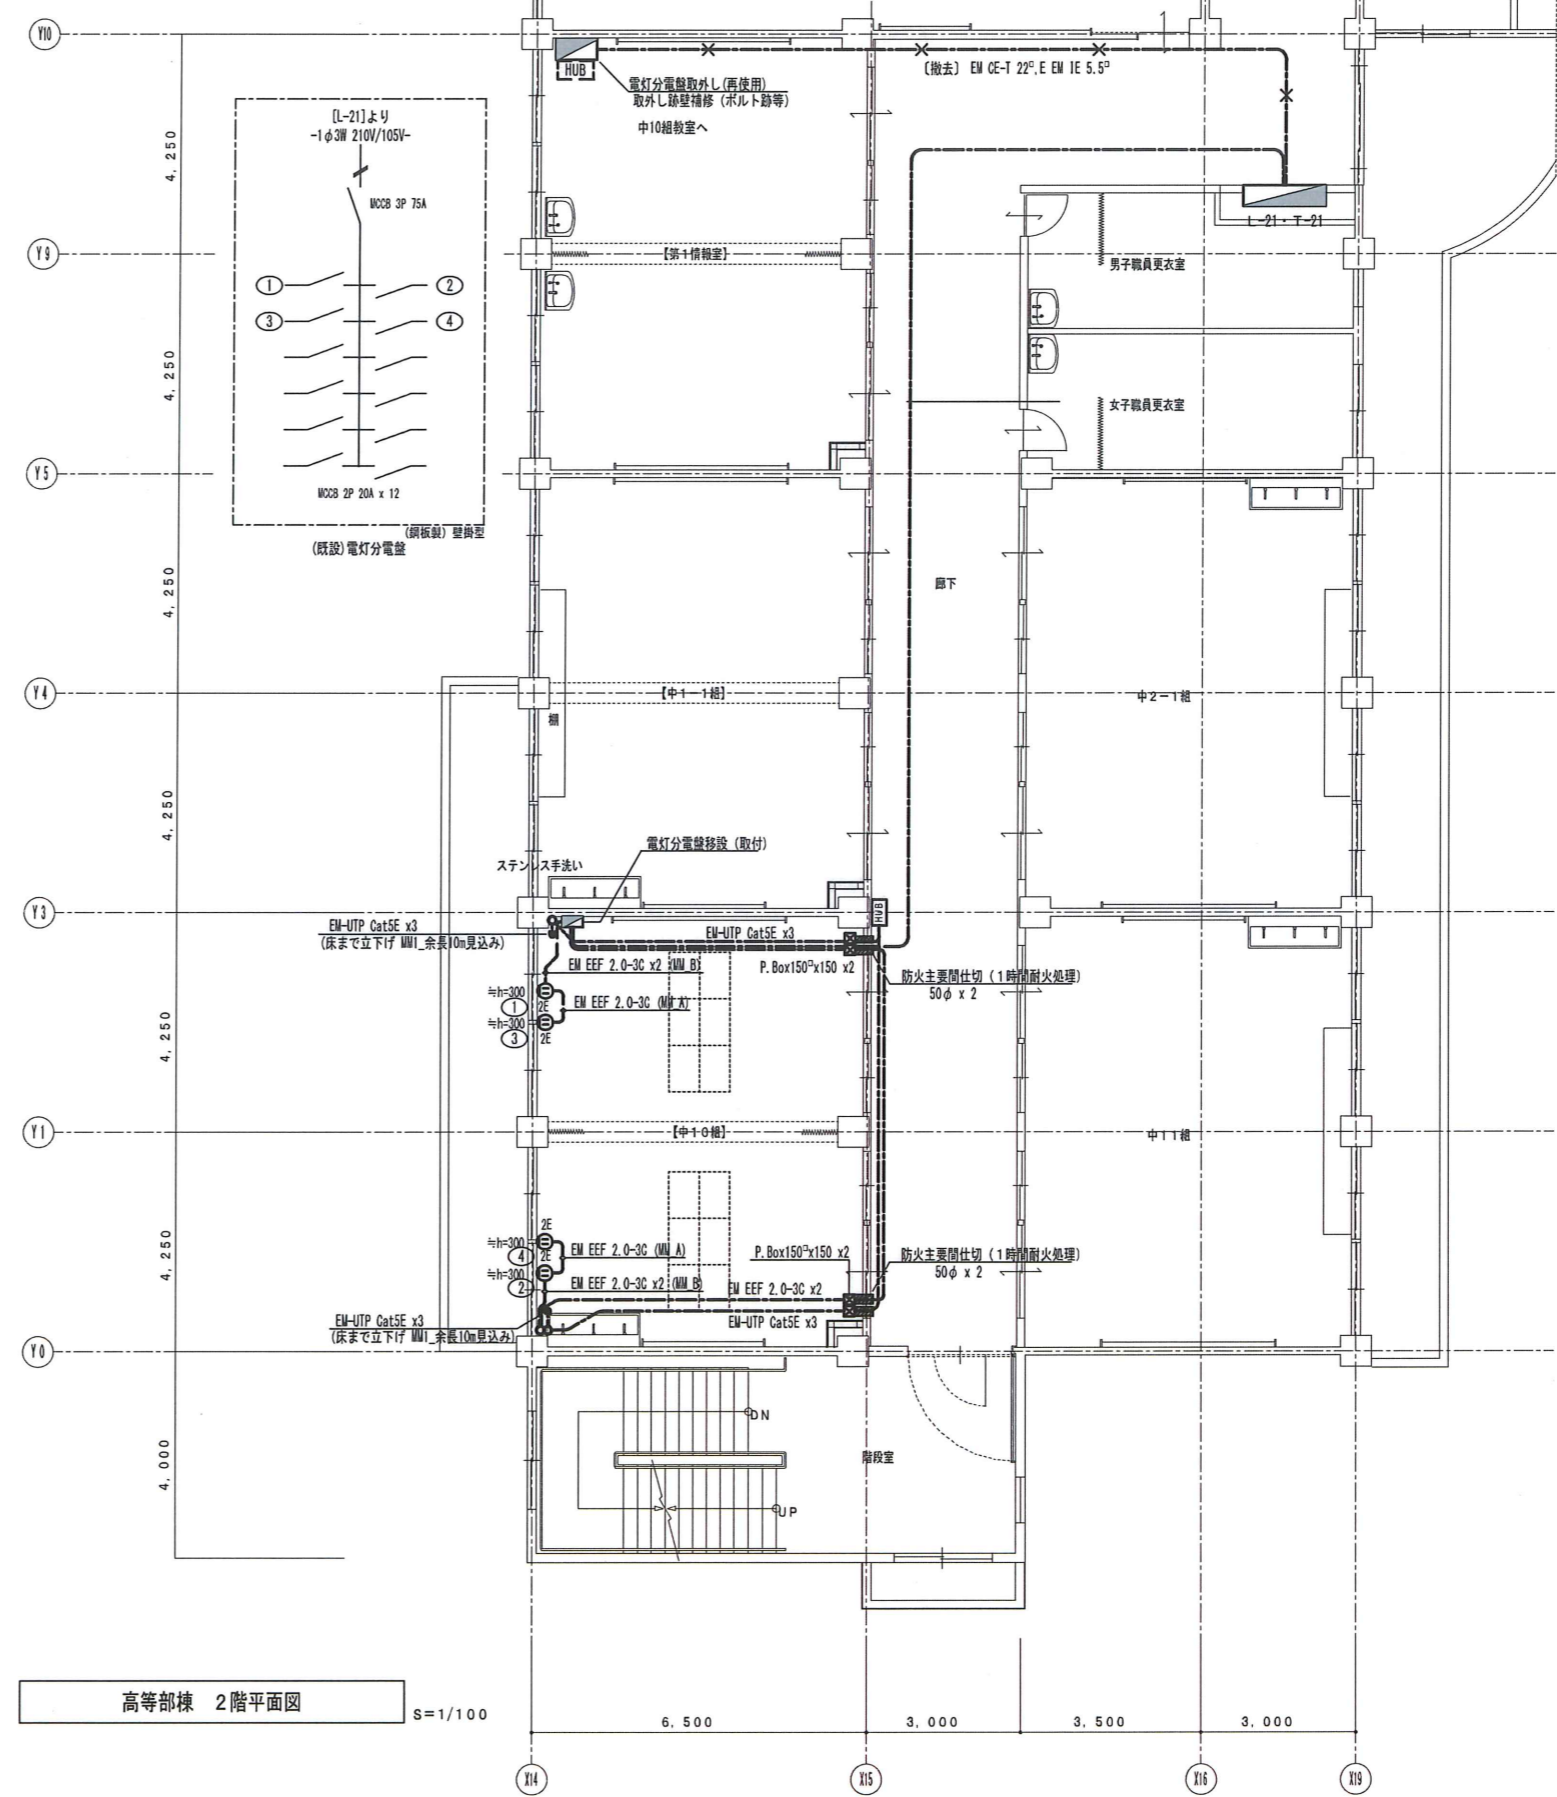

高等部棟 2階平面図 S=1/100

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
		22-15	2023.04	S=1/100	E-27

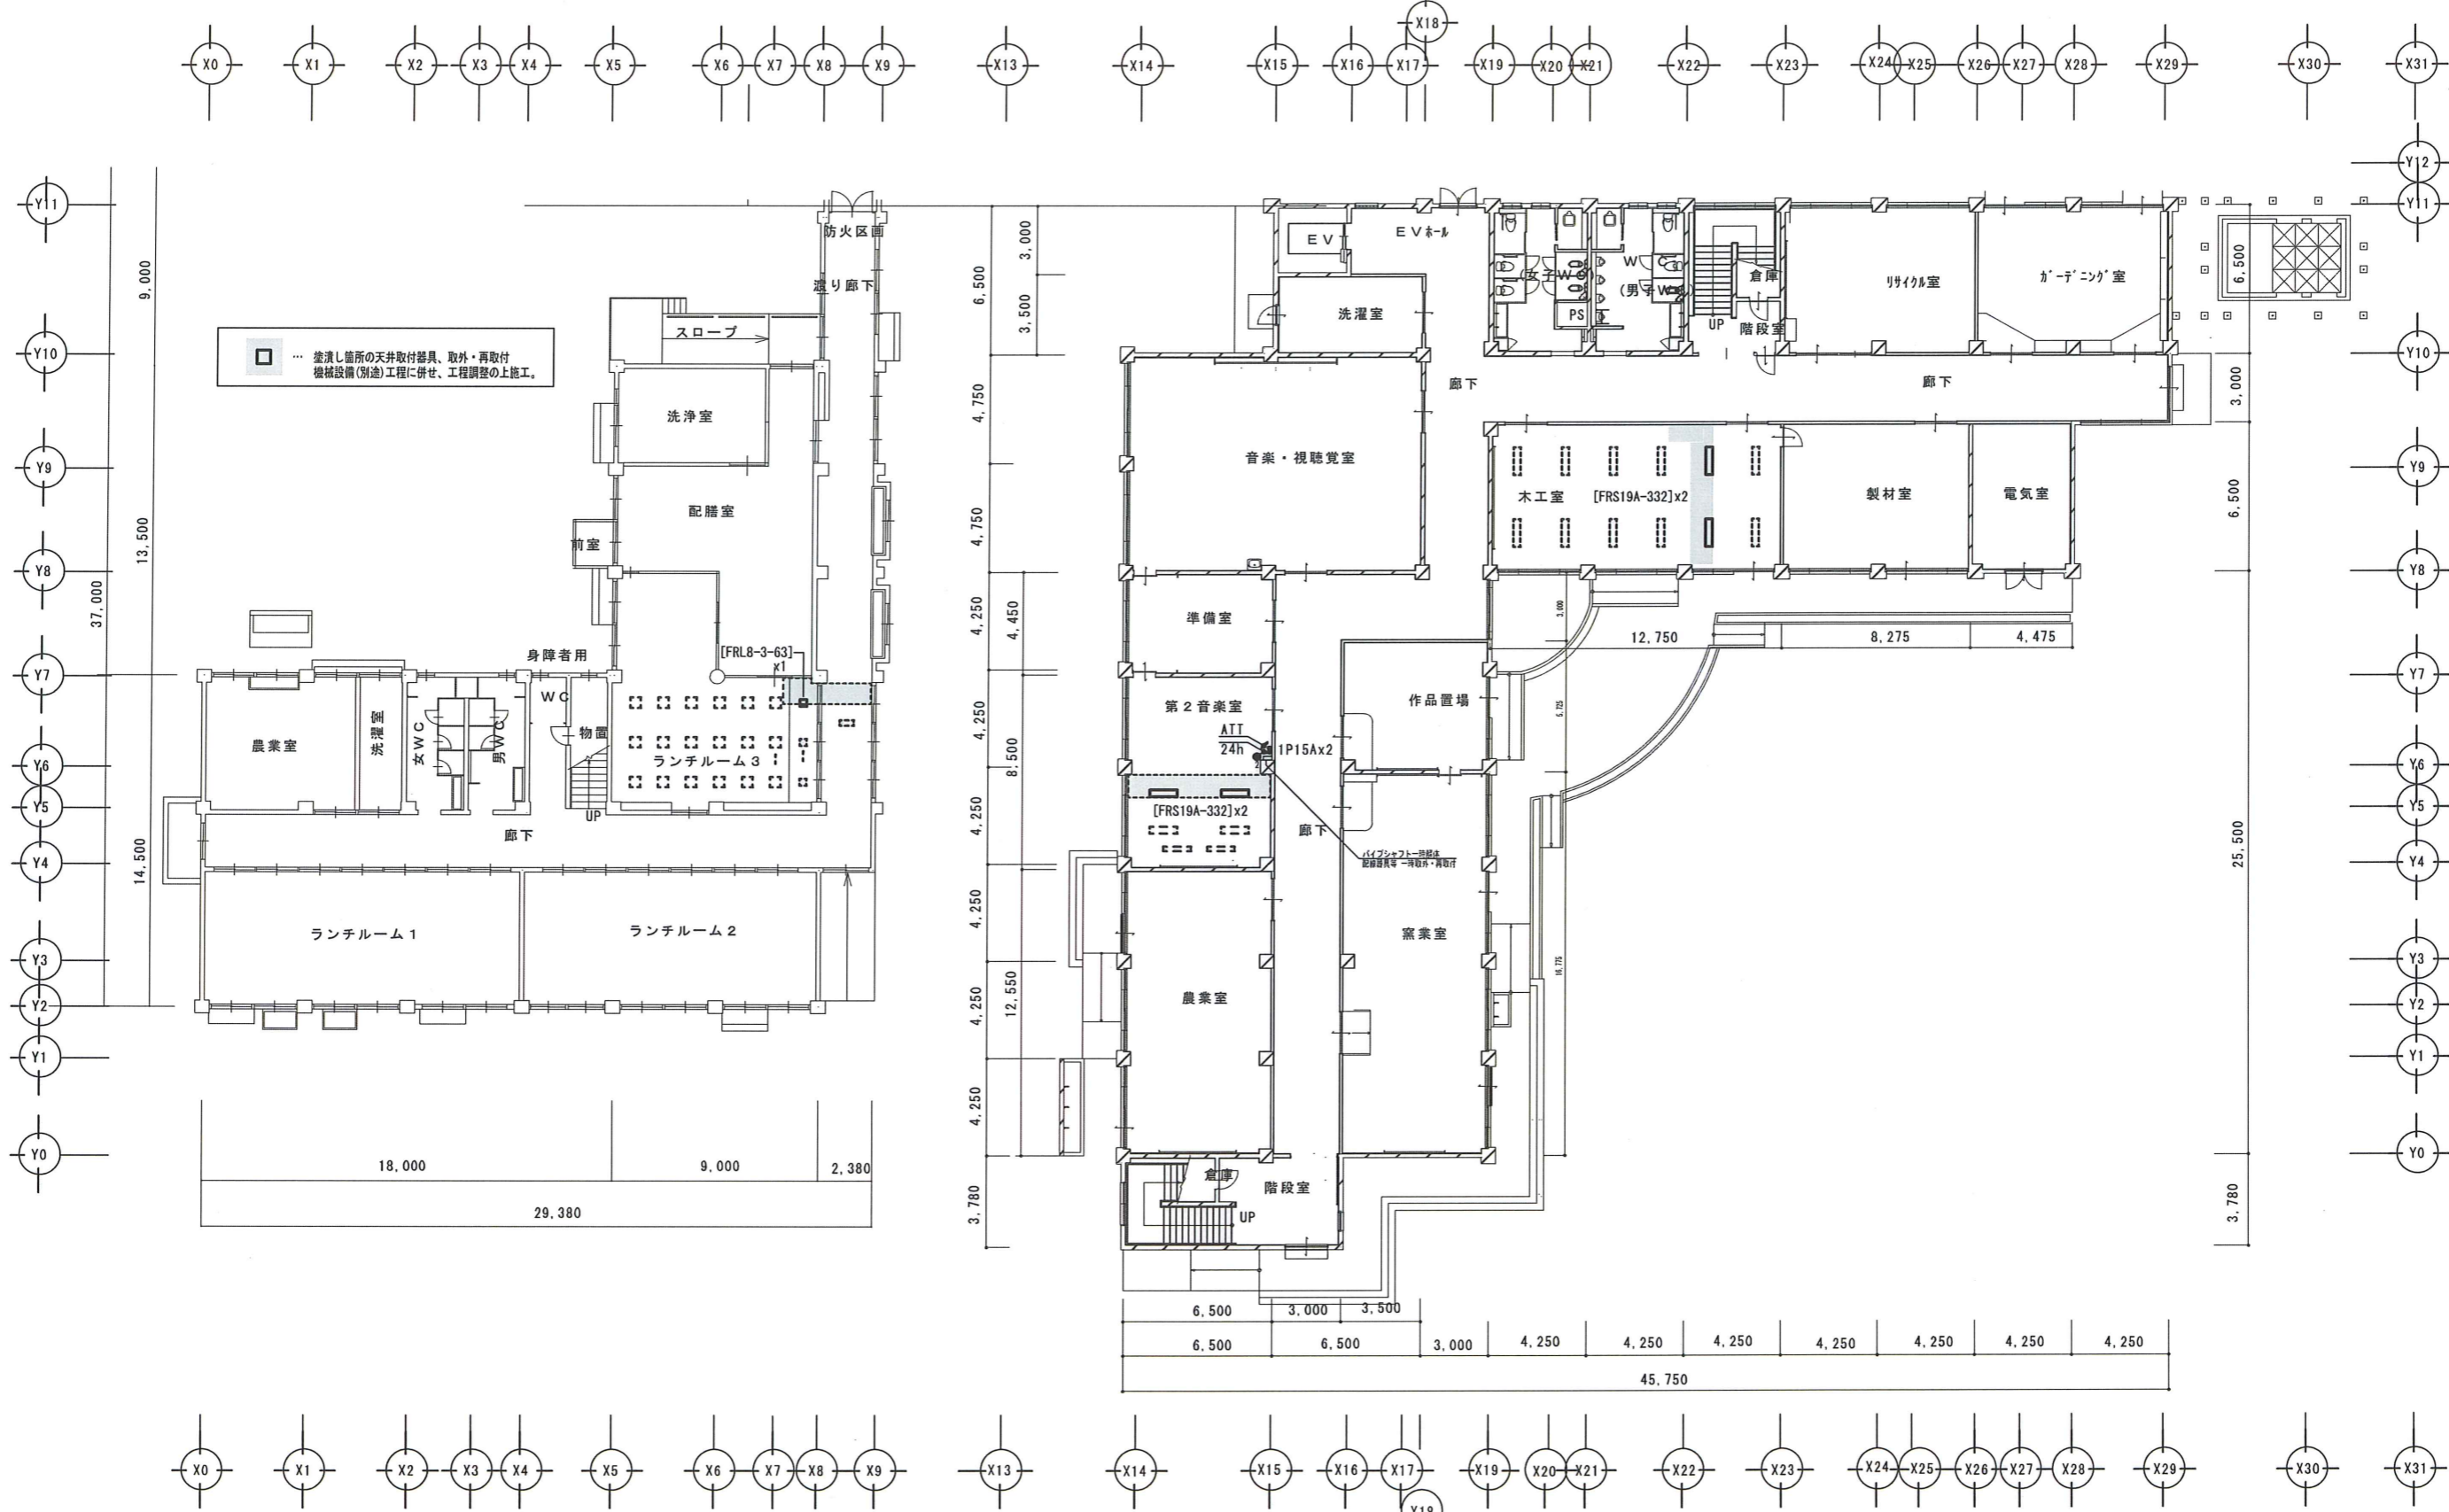

□ ... 差渡し箇所の天井取付器具、取外・再取付
機械設備(別途)工程に併せ、工程調整の上施工。

教室棟 (南校舎) 1階平面図 S=1/200

高等部棟 1階平面図 S=1/200




県立白兔養護学校教室整備改修工事 (二工区) (電気設備)
電気設備 一部解体支障先行工事 (1) (教室棟) (高等部棟) (改修図)

株式会社 樟設備設計事務所 〒680-0052 鳥取市殿治町14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
奈	吉	22-15	2023, 04	S=1/200	E-28

□ ... 塗装し箇所天井取付器具、取外・再取付
機械設備(別途)工程に併せ、工程調整の上施工。

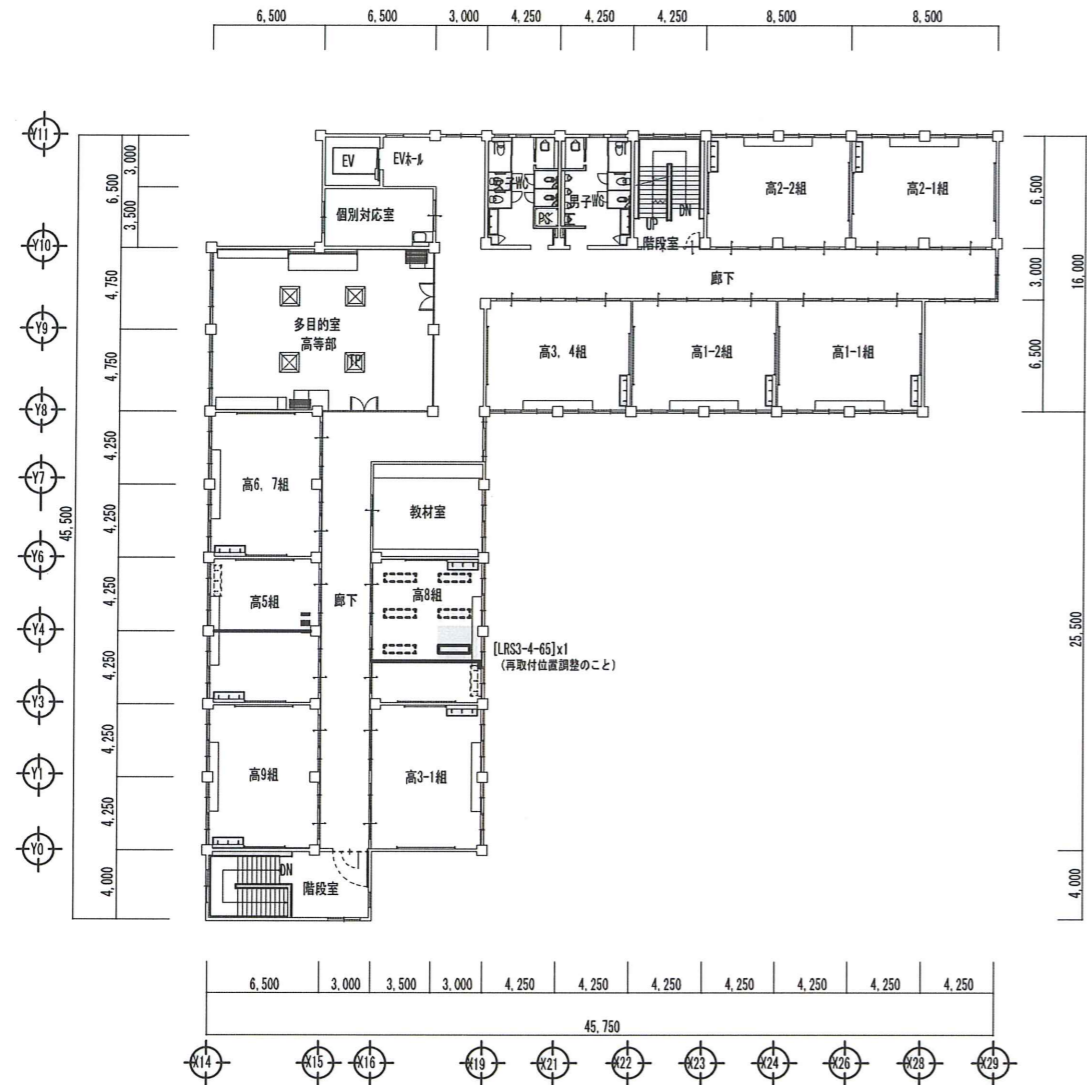

(高等部棟)
3階平面図 S=1/200

鳥取県
令和4年度
J2201918
東部建築住宅
事務所

県立白兔養護学校教室整備改修工事(二工区)(電気設備)

電気設備 一部解体支障先行工事(3)

(高等部棟)(改修用)

株式会社 樟設備設計事務所

〒680-0052 鳥取市扇浜町14
二級建築士登録番号 第2810号 谷本 正敏

CHECKED BY	DRAWING BY	PROJECT NO	DATE	SCALE	DRAWING NO
栗田	三坂	22-15	2023, 04	S=1/200	E-30
